

与良川通信

～ 第25号～

令和4年3月17日発行



2年ぶりの遊水地ヨシ焼き 3/5(土)

工事名：栃木南部農業水利事業
与良川統合排水機場建設工事

発注者：農林水産省 関東農政局

受注者：前田建設工業株式会社

「安全」「環境」「品質」を最優先して作業を行ってまいります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、何卒宜しくお願いします。
ご意見、ご感想がありましたら、お気軽にお声掛けください。

令和3年2月末現在
工事進捗率：72.4%

【文責】
功刀 直人



はじめに



2月は接続水路、東西サイホン(プレキャスト)の施工を行い、無事に完成することができました。3月は東部自然排水樋門、本体部周辺の擁壁および護岸を施工します。

接続水路【完了】



小山市長 現場視察




今期施工で最も苦労した「川の中で構造物を造る」箇所です。川の切回しが大変でしたが、川を汚すことなくコンクリートの品質を確保し、このように出来上がりました。



浅野市長が現場視察に来られ、工事の状況や現場の様子をご覧になられました。この施設工事が順調に進んでおり、この地域の浸水被害が低減できると、たいそう感心しておりました。

3月15日現在、接続水路、東西サイホン(プレキャスト)の施工が完了しました。今後は、東部自然排水樋門、底張コンクリート、擁壁、連節ブロックの施工を行う予定です。(図面赤字の箇所⇒施工完了、図面青字の箇所⇒施工予定)

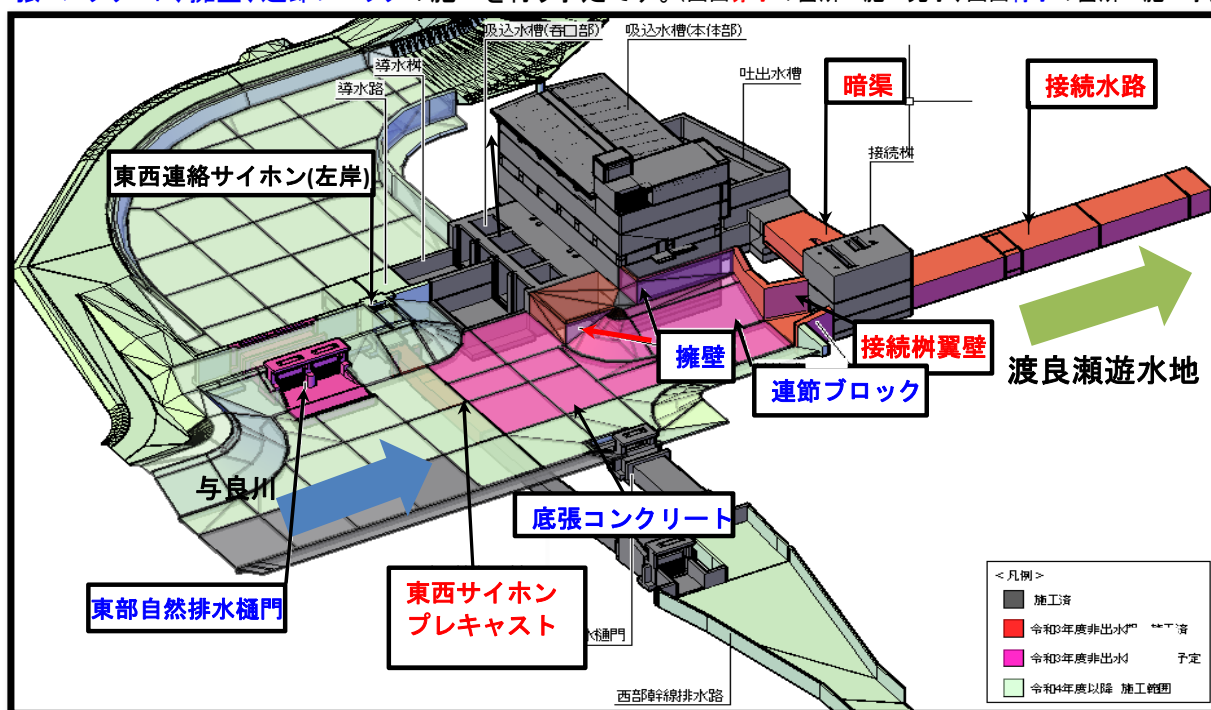

コンクリート打設


下記日程でコンクリート打設を行います。打設日は通行止め(通り抜け不可)となります。現場手前までは通行可能ですので、通行される方はガードマンにお声かけください。
大変ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【通行止め予定】

3/19 (土) 8:00～12:00	生コン車：約18台	(底張、法留め、東部自然排水樋門)	→右岸側
3/25 (金) 8:00～15:00	生コン車：約26台	(擁壁A、法止め、底張)	→右岸側
3/30 (水) 8:00～15:00	生コン車：約40台	(東部自然排水樋門、底張)	→左岸側
4/2 (土) 8:00～10:00	生コン車：約8台	(底張、法止め)	→右岸側



ご挨拶

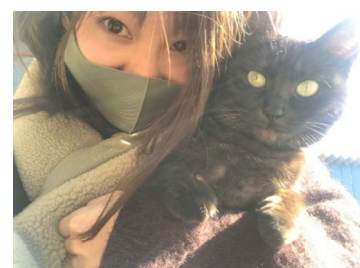

約2年間、こちらの現場の事務担当をしていた上口有帆です。
4月からは新たな仕事へチャレンジするために、3月末で退職します。
これまで、与良川通信の配布を通して、皆様と交流することが楽しみでした！
ありがとうございました。こちらの現場で学んだことを次の会社でも生かして、頑張っていきたいです。また、小山に遊びに来たいと思います。
PS.この度、お家に猫を迎え入れることになりました！！
