

事業名	国営農地再編整備事業		地区名	妹背牛 ^{もきうし}
都道府県名	北海道	関係市町村名	雨竜郡妹背牛町 ^{うりゅうぐんもきうしちやう}	
概要	<p>本地区は、北海道雨竜郡妹背牛町に位置し、石狩川支流の雨竜川左岸に拓けた水田地帯である。</p> <p>本地域の農業は、水稻を中心として、小麦、豆類等の土地利用型作物に加えて、収益性の高い花きや野菜を導入した複合経営を展開している。</p> <p>しかしながら、本地区の農地は、ほ場が小区画であり泥炭が広く分布し、排水不良等が生じていることから、効率的な機械作業が行えず生産性も低く、農業経営は不安定なものとなっている。</p> <p>このため、本事業により、既耕地を再編整備する区画整理997haと畑作振興のための農地造成5haを一体的に施行し、生産性の高い基盤の形成等を通じ、農業の振興を基幹とした本地域の活性化に資するものである。</p> <p>【事業内容等】</p> <p>受益面積 1,002ha</p> <p>主要工事計画 区画整理 997ha (田 926ha、畑 71ha) 農地造成 5ha (畑 5ha)</p> <p>国営総事業費 17,000百万円 (平成30年度時点 22,080百万円)</p> <p>工期 平成20年度～平成31年度 (予定)</p>			
評価	【事業の進捗状況】 平成29年度までの進捗率 (事業費ベース) は、95%となっている。			
	【関連事業の進捗状況】 該当なし			
	<p>【農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化】</p> <p>本地区を受益地とする妹背牛町の平成17年と平成27年の農業等の情勢の変化を見ると、以下のとおりである。</p> <p>1 産業別就業人口の割合</p> <p>妹背牛町の実業人口は、平成17年の1,997人から平成27年の1,470人に減少 (△26.4%) している。</p> <p>このうち、農業就業人口は、平成17年の652人から平成27年の527人に減少 (△19.2%) しているが、産業別就業割合は、32.6%から35.9%に増加している。</p> <p>2 農業・農村の動向</p> <p>(1) 地域農業の概要</p> <p>妹背牛町の農業は、水稻を中心として、小麦、豆類等の土地利用型作物に加えて、収益性の高い花きや野菜を導入した複合経営を展開している。</p> <p>妹背牛町の農業産出額は、平成17年の2,977百万円から平成27年の3,581百万円に増加 (20.3%) している。</p> <p>このうち、米の産出額は、平成17年の2,405百万円から平成27年の2,912百万円に増加 (21.1%) し、農業産出額に占める割合は、平成17年の82.7%から平成27年の83.9%に増加している。</p>			

評	<p>(2) 農家戸数・認定農業者数・農業生産法人数 妹背牛町の農家戸数は、平成17年の278戸から平成27年の207戸に減少(△25.5%)している。このうち、主業農家の割合は、平成17年の86.7%から平成27年の76.3%に減少している。 認定農業者数は、平成17年の171人から平成27年の203人に増加(18.7%)している。 農業生産法人数は、平成17年の3法人から平成27年の5法人に増加(66.7%)している。</p> <p>(3) 経営耕地面積 妹背牛町の経営耕地面積は、平成17年の3,323haから平成27年の3,223haに減少(△3.0%)している。1戸当たり平均経営耕地面積は、平成17年の12.0ha/戸から平成27年の15.6ha/戸に増加(30.0%)している。また、経営耕地面積20ha以上の農家割合は、平成17年の11.5%から平成27年の28.5%に増加している。</p>												
価	<p>【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】 現時点において事業計画の重要な部分の変更はなく、事業計画を変更する必要は生じていない。</p> <p>1 事業の施行に係る地域 現時点で受益地域を変更する必要はない。</p> <p>2 主要工事計画 現時点で主要工事計画を変更する必要はない。</p> <p>3 事業費 平成30年度時点における国営総事業費は、22,080百万円であり、現計画の17,000百万円から工法変更等の要因により増加している。このうち、物価変動を除く事業費の変動は、1,570百万円(9.2%)の増加となっている。</p>												
項	<p>【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】 本地区では、作物生産量が増加する効果、営農経費・維持管理費が節減される効果及び従来の施設機能が維持される効果等を主な効果として見込んでいる。 費用対効果分析の基礎となる受益面積及び土地利用などの要因に変動はない。 なお、費用対効果分析の結果は、以下のとおりである。</p> <table border="0" data-bbox="311 1411 1276 1512"> <tr> <td>総便益</td> <td>(B)</td> <td>30,279 百万円</td> <td>(現行計画 16,046百万円)</td> </tr> <tr> <td>総費用</td> <td>(C)</td> <td>29,573 百万円</td> <td>(現行計画 15,388百万円)</td> </tr> <tr> <td>総費用総便益比</td> <td>(B/C)</td> <td>1.02</td> <td>(現行計画 1.04)</td> </tr> </table>	総便益	(B)	30,279 百万円	(現行計画 16,046百万円)	総費用	(C)	29,573 百万円	(現行計画 15,388百万円)	総費用総便益比	(B/C)	1.02	(現行計画 1.04)
総便益	(B)	30,279 百万円	(現行計画 16,046百万円)										
総費用	(C)	29,573 百万円	(現行計画 15,388百万円)										
総費用総便益比	(B/C)	1.02	(現行計画 1.04)										
目	<p>【環境との調和への配慮】 本事業の施行に際しては、新千代北排水路の改修に当たって、現況利用が可能で生物多様性の高い区間の施工を回避するほか、工事中の濁水流出防止に配慮した施工を行い、魚類や植物の生息環境の保全に努めており、今年度、モニタリング調査を予定している。</p>												
	<p>【事業コスト縮減等の可能性】 本事業で行う道路工の盛土材について、購入材から建設発生土に変更すること、及び排水路工において、既設フリュームを再利用することで、事業コストの縮減を図っている。</p>												

【関係団体の意向】

北海道、関係町及び土地改良区は、完了予定年度に向けて、事業を確実に推進することを要望している。

【評価項目のまとめ】

本地域は、農家戸数や経営耕地面積は減少しているが、1戸当たり平均経営耕地面積は増加しており、認定農業者数や農業生産法人数は増加傾向にある。

事業の進捗状況は、平成29年度までに95%となっており、既に事業効果が発現している。

妹背牛町では、大区画化による効率的な営農がなされ、水稻を主体に、小麦・大豆を組み合わせた経営を展開するとともに、花きの生産拡大による農業経営の安定化を図っている。

現時点において、事業計画の重要な部分の変更の必要はなく、環境との調和への配慮及びコスト縮減に努めつつ事業を推進している。

関係団体からは、完了予定年度に向けて、事業を確実に推進することを求められている。

以上から、農業情勢、農村の状況等の変化、地域農業の営農方針、関係団体の意向などから、事業の必要性については変わっていない。

【技術検討委員会の意見】

本事業は、農業生産性の向上、農業経営安定化を図るためのものであり、区画整理などによる生産性の高い基盤形成が必要不可欠であると認められる。

泥炭地を含む本地区の大区画化ほ場においては、地下かんがいによる泥炭の保全や効率的な営農がなされていることに鑑み、完了に向けた事業推進に努められたい。

また、環境に配慮された事業も行われており、今後のモニタリング調査による効果の検証が望まれる。

【事業の実施方針】

事業の完了に向けて、計画的な事業推進に努めるとともに、環境に配慮した事業による効果の検証を図る。

<評価に使用した資料>


- ・国勢調査（2005～2015年）
- ・農林業センサス（2005～2015年）
- ・農林水産省統計情報（<http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html>）
- ・経済産業省/商業統計（<http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/>）
- ・経済産業省/工業統計調査（<http://www.meti.go.jp/statistics/kougyo/>）
- ・総務省統計局/経済センサス（<http://www.stat.go.jp/data/e-census>）
- ・北海道農政部/各種統計（<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi>）
- ・「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」（平成19年3月28日農林水産省農村振興局企画部長通知 一部改正：平成30年3月28日農林水産省農村振興局整備部長通知）
- ・国営妹背牛土地改良事業計画書（区画整理）、国営妹背牛土地改良事業計画書（農地造成）
- ・一般公表されていないものについては、北海道開発局札幌開発建設部深川農業事務所調べ

妹背牛地区概要図

位置図



区画整理（整備前）

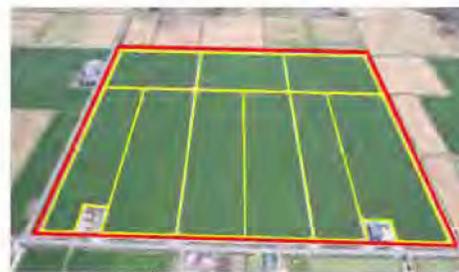

区画整理（整備後）



花きの栽培状況



凡	例
	区画整理
	農地造成
	用水路
	排水路
	支線道路
	国道
	道道
	市町村境
	市街地
