

工事進捗状況

実施中、実施予定工事
について紹介します。
(令和2年9月時点)


1 名草排水機場 (和歌山市)

名草排水機場では、排水機場の排水能力を毎秒7トンから10トンに増強するために、平成30年度から既設機場の隣に新たな排水機場を建設しています。
現在は新たな排水機場から和歌山川へ直接排水するための樋門、樋管の工事に取りかかっており、堤防道路を開削して基礎地盤を改良しています。引き続き、令和4年度の完成に向けて工事を実施してまいります。



2 米田排水路 (和歌山市)

改修により排水能力が向上した米田排水機場を効果的に活用するため、排水機場に接続する米田排水路を拡幅する工事を実施しています。
水路本体の工事は、水路内の水位が低下する10月以降を予定しており、現在は仮廻し道路の造成等の準備工事を行っています。水路本体の工事実施中は、隣接市道を終日通行止めとさせていただきます。(令和3年3月末までを予定)

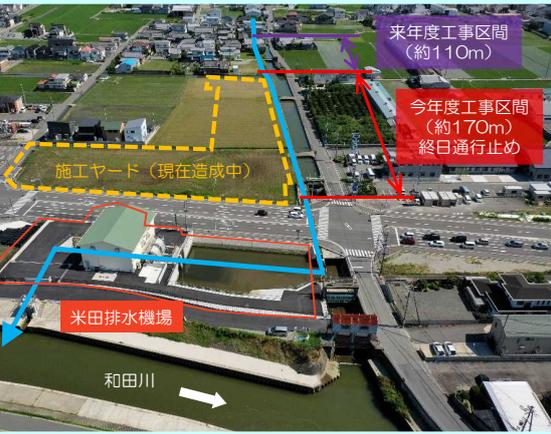

3

藤崎井水路(山田排水路) (和歌山市、岩出市)

豪雨時に藤崎井水路の水をスムーズに排水するため、岩出市中迫に排水用のバイパス水路を建設します。
バイパス水路は道路下に埋設することとしておりますが、通行の妨げにならないよう推進工により、地中を掘り進めながら、管を設置していきます。
工事は令和2年10月～令和4年までの予定です。



推進機が到達しました!

六箇井水路(畑毛工区) (和歌山市)

令和元年6月から岩出市(金屋、畑毛)にて豪雨時の六箇井水路に流れ込む水をスムーズに排水するためにバイパス水路を建設しています。
バイパス水路は推進工法により、地中に直径1.65mのコンクリート管を約600m、令和2年2月25日から埋設していましたが、8月3日に無事貫通しました。



推進機到達



新たな コロナ対策

全国で再び感染者数が増加し、コロナウイルスは未だ猛威を振るっています。
事業所ではWEB会議の活用、マスクの着用、テレワーク等のコロナ対策を引き続き行っています。
さらに、新たなコロナ対策として、所内全員が検温を毎日実施・記録することで体調管理を行うとともに、各デスクを飛沫防止ビニールカーテンで仕切ることで、感染防止に努めています。



この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。
(承認番号 H25-複製、第790号)

令和2年9月時点

国営土地改良事業 和歌山平野地区 令和2年度実施計画 平面図

和歌山平野地区

六箇井水路(畑毛工区)

発進立坑

到達立坑



3 藤崎井水路(山田排水路)



1

1 名草排水機場

2 米田排水路





2



近景

凡例	
受益面積(田)	
受益面積(樹園地)	
排水路(新設・改修)	
排水水門(改修)	
排水機場(新設・改修)	
洪水調整池	
排水機場(開通事業)	
既設排水機場	
既設用水路	

凡例	
実施済	
令和2年度実施	
令和3年度以降	



紀の川市

県道と歌山橋本線
