

農業農村整備事業等再評価地区別資料（案）等資料

農村地域防災減災事業（用排水施設等整備事業）

ま え の
「前野地区」

（愛知県西尾市）

農村地域防災減災事業

事業目的


自然及び社会経済的環境の変化に対処して、農用地、農業用施設に係る自然災害の発生を未然に防止し、又は農業用排水の汚濁や農用地の土壤汚染を防止し、若しくは地盤沈下等により低下した農用地・農業用施設の機能回復を図ること等により、農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、もって国土及び環境の保全に資する

事業内容

1. 防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業）
 - ・地域の防災減災対策に必要な諸条件に関する調査・農村地域防災減災総合計画の策定等
2. 農業用施設等の整備（整備事業）
 - ・自然的・社会的要因で生じた農業用施設等の機能低下の回復や災害の未然防止を図るための整備、防災機能を維持するための長寿命化対策の実施、切迫する南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝地震等の発生を見据えた防災インフラの整備等



農村地域防災減災事業「前野地区」概要図

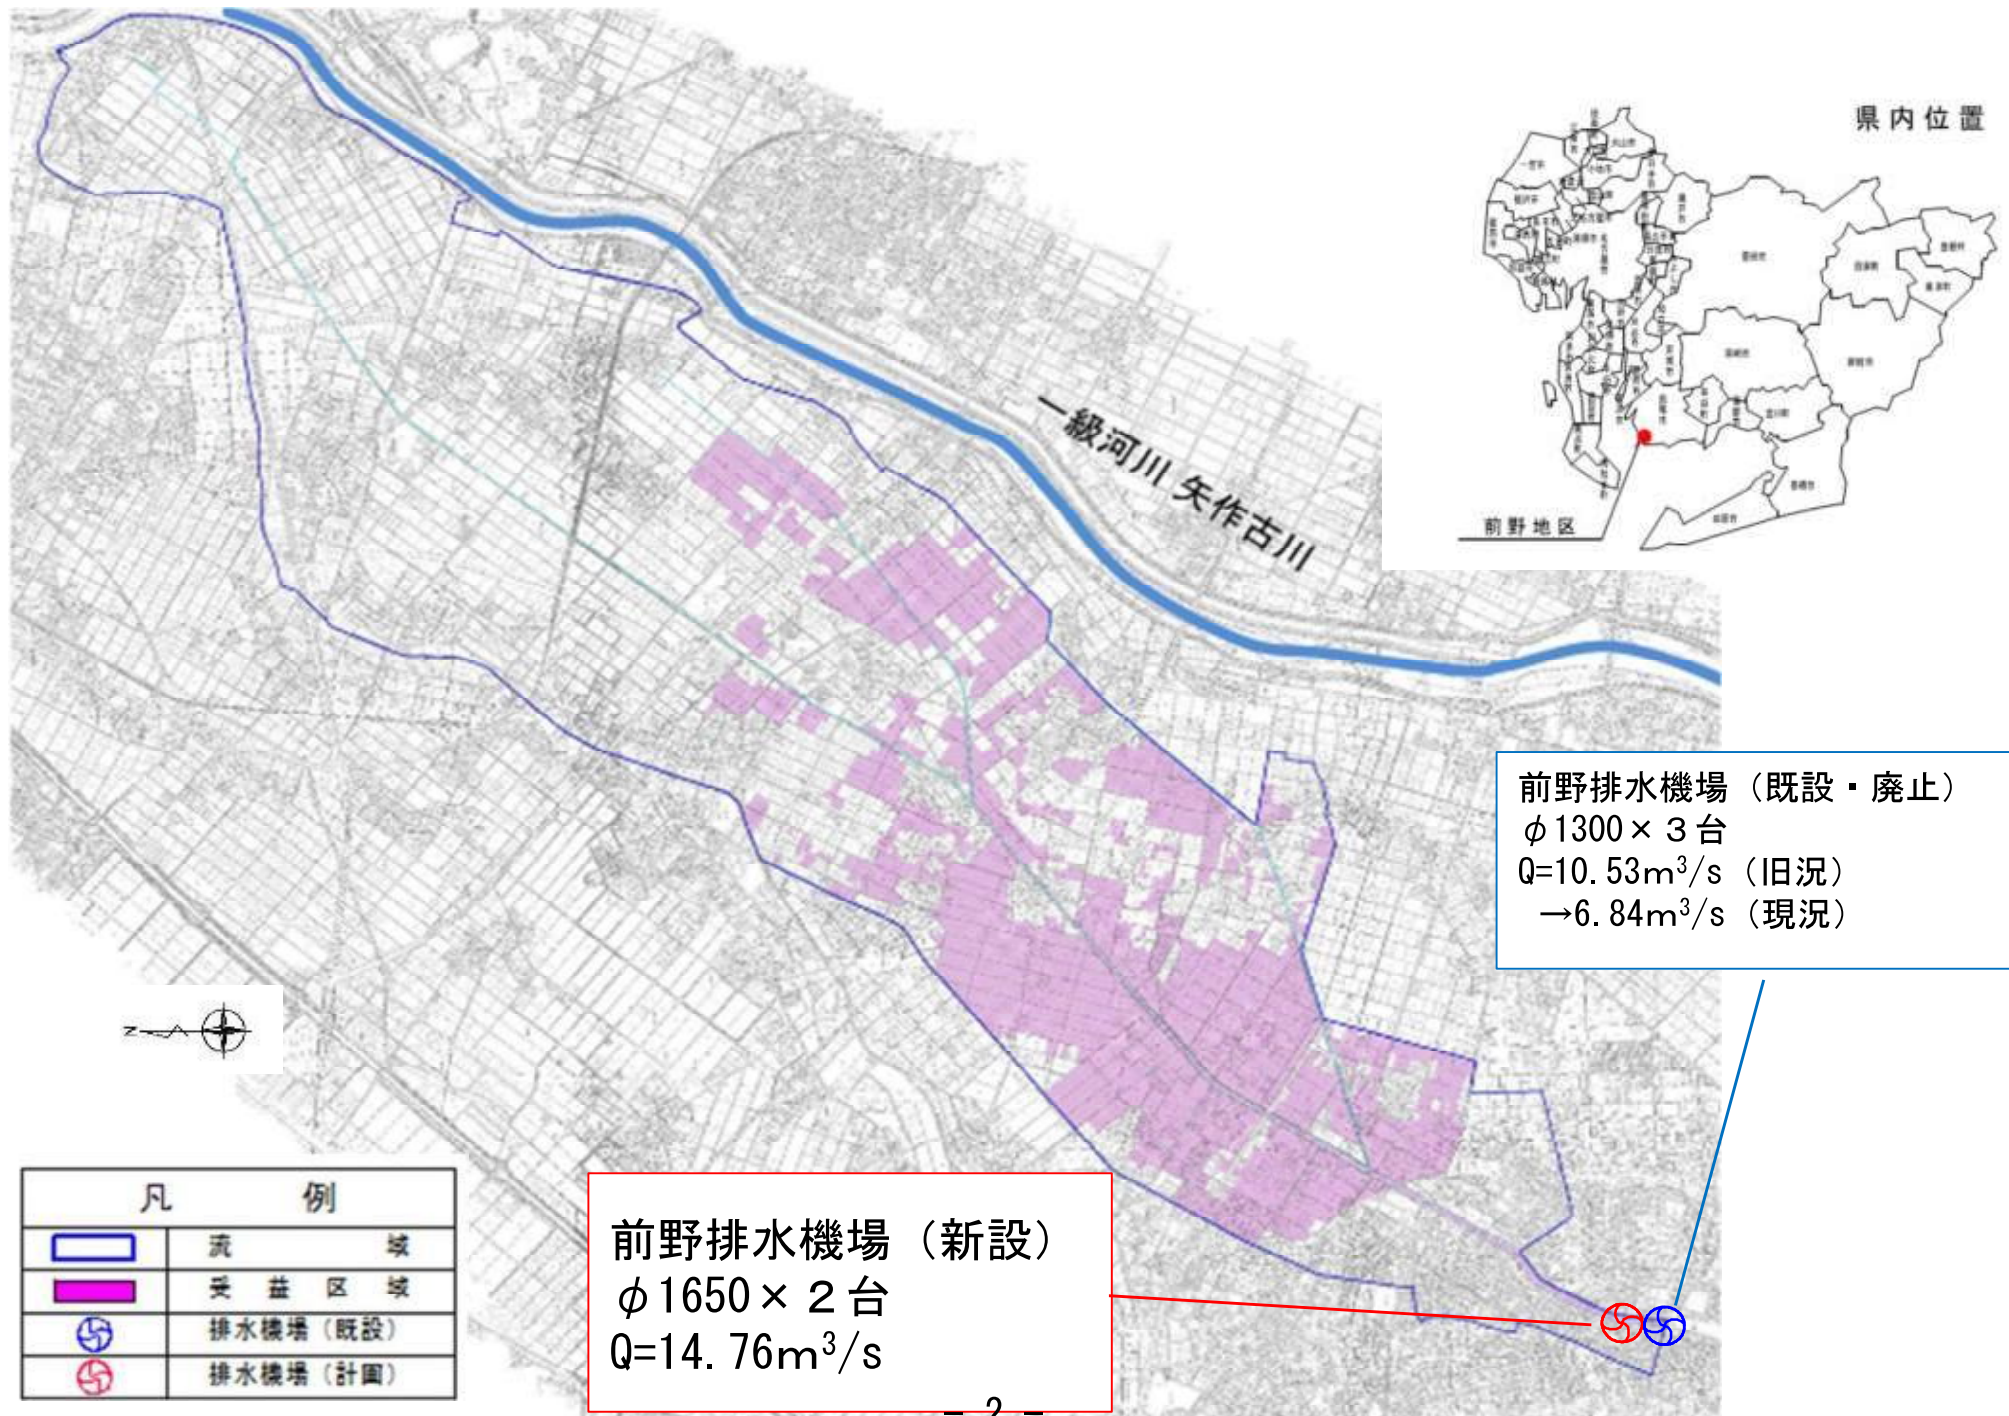

農業農村整備事業等再評価地区別資料

局	名	東海農政局
---	---	-------

都道府県名	愛知県	関係市町村名	にしおし 西尾市
事業名	農村地域防災減災事業	地区名	まえの 前野
事業主体名	愛知県	事業採択年度	平成 25 年度
〔事業内容〕 事業目的： 本地区は、愛知県の中央を流下する矢作古川の右岸に位置する低平地で、地区内排水の大半は地区内の排水機場による排水に頼っている地域である。 前野排水機場は昭和 50 年に整備され、地区内の排水対策が確立された。しかし、地域内開発による流出量の増加に加えて、地盤沈下、経年変化による排水機の機能低下により既存の排水施設では対応が困難となった。 このため、本事業により排水機場の更新整備を行うことにより、湛水被害を解消し、本地域全体として農業経営の安定と国土保全を図るものである。 受益面積： 222ha 主要工事計画： 排水機場 1 箇所 総事業費： 3,420 百万円（計画総事業費：2,720 百万円） 工期： 平成 25 年度～令和 9 年度（計画工期：平成 25 年度～令和元年度） 関連事業： なし			
〔項目〕 ア 事業の進捗状況 令和 4 年度までの進捗率は、53.3%である。 ① 計画工期に対して著しい変更は認められないか 本地区は、事業採択後、現場条件による樋管工の杭基礎の追加、工事場所が住宅密集地のため地元と調整した結果、仮設ヤードの変更（左岸道路から水路内仮設構台）や低振動・低騒音工法への変更が必要となった。また、工事現場が狭小であり、複数工種の同時施工から段階的的施工へ施工計画を見直した。 これらにより、工期を 8 年延長する必要性が生じた。現在は令和 9 年度の事業完了に向け、計画的に事業進捗を図る予定である。 ② 地元負担等について、関係者間の合意形成が図られているか 地元負担について関係者との合意形成が図られている。 イ 関連事業の進捗状況 該当なし。 ① 「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われているか 農業農村整備事業管理計画に即し、適切に連携・調整が行われている。			

- ② 国営附帯地区については、国営事業との進捗調整が図られているか
本地区は国営附帯地区に該当しない。

ウ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化

- ① 受益面積の増又は減が10%未満であるか
受益面積の変動は生じていない。
- ② 主要工事計画の著しい変更が認められないか
計画どおりであり、変更はない。

エ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む）

本地区は、農業効果の算定基礎となる地域農業振興の基本方針などの諸情勢の変化を踏まえ、物価等の変動を除き費用対効果分析の基礎となる要因の変化は生じていない。

- ① 工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除く。）が計画事業費の10%未満であるか
物価等の変動によるものを除き、計画事業費に対する事業費の増分は10%未満（0.6%）である。
- ② 市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られているか
西尾市の農業振興地域整備計画と整合が図られている。
- ③ 費用対効果分析の結果
(B/C) 5.09（現計画時：3.70）

オ 環境等の調和への配慮

本地域は、愛知県の南部に位置し、一級河川矢作古川西部の低平な農村地域である。当該施工箇所は、田園環境整備マスタープランにおいては環境配慮区域には指定されておらず、特に配慮すべき生物は生息していないが、工事の実施に当たっては、締切内に魚類が入り込んだ場合には排水路へ放流するなどの配慮を行う。

また、土砂及び汚濁水の流出防止に努めるとともに、騒音・排ガス対策型の建設機械を使用し、周辺への環境負荷を最小限に軽減する。

カ 事業コスト縮減等の可能性

仮設鋼矢板の転用、杭基礎の変更等により建設コストの縮減を図っている。今後実施予定の工事においても、積極的にコスト縮減に努める。

キ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向

平成12年9月の東海豪雨、平成20年8月豪雨等により農地の湛水が発生するなど、近年の局地的集中豪雨等を受け、農業者及び地域住民から本事業の早急な実施による機能回復が望まれている。

ク その他

計画確定日 平成25年10月4日。

事業主体の
事業実施方針

継続する。

事業主体の 予算要求方針	令和6年度予算を要求する。
第三者 の意見	
補助金 交付の方針	

前野地区の事業の効用に関する説明資料

1. 総費用総便益比の算定

(1) 総費用総便益比の総括

区 分	算定式	数値 (千円)
総費用 (現在価値化)	①=②+③	5,439,409
当該事業による費用	②	3,062,738
その他費用 (関連事業費+資産価額+再整備費)	③	2,376,671
評価期間 (当該事業の工事期間+40年)	④	55年
総便益額 (現在価値化)	⑤	27,732,439
総費用総便益比	⑥=⑤÷①	5.09

(2) 総費用の総括

(単位：千円)

区分	施設名 (又は工種)	事業着工 時点の 資産価額 ①	当該 事業費 ②	関連 事業費 ③	評価期間 における 予防保全費 ・再整備費 ④	評価期間 の 資産価額 ⑤	総費用 ⑥= ③ +④-⑤
当該事業	排水機場 (機場工)	50,351	909,504	-	-	26,088	933,767
	排水機場 (建屋工)	1,114	108,279	-	-	2,253	107,141
	排水機場 (機械工)	-	2,044,955	-	1,221,459	382,782	2,883,632
	小 計	51,466	3,062,738	-	1,221,459	411,122	3,924,540
その他	導水路	205,815	-	-	586,560	63,367	729,008
	樋門	-	-	-	816,926	31,066	785,860
	小 計	205,815	-	-	1,403,486	94,433	1,514,869
合 計		257,281	3,062,738	-	2,624,946	505,555	5,439,409

(3) 年総効果額の総括

(単位：千円)

効果項目	区分	年 総 効 果 (便 益) 額	効 果 の 要 因
食料の安定供給に関する効果		41,456	
	作物生産効果	47,017	農業用排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での作物生産量が増減する効果
	維持管理費節減効果	△ 5,561	農業用排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での施設の維持管理費が増減する効果
農業の持続的発展に関する効果		972,864	
	災害防止効果（農業関係資産）	972,864	農業用排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での災害による農業資産に係る被害額が軽減する効果
農村の振興に関する効果		45,487	
	災害防止効果（一般資産）	45,487	農業用排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での災害による一般資産に係る被害額が軽減する効果
多面的機能の発揮に関する効果		82,762	
	災害防止効果（公共資産）	82,762	農業用排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での災害による公共資産に係る被害額が軽減する効果
合 計		1,142,569	

(4) 総便益額算出表

(単位：千円、%)

評価期間	年度	割引率 (1 + 割引率) ¹ ①	経過年 (t)	作物生産効果						備考
				更新に係る効果 年効果額 ②	新設及び機能向上分に係る効果			計		
					③	効果発生割合 ④	年効果額 ⑤ = ③ × ④	年効果額 ⑥ = ② + ⑤	左 割引後 ⑦ = ⑥ ÷ ①	
1	H25	0.6756	-10	21,792	25,225	-	-	21,792	32,256	着工年
2	H26	0.7026	-9	21,792	25,225	-	-	21,792	31,016	
3	H27	0.7307	-8	21,792	25,225	-	-	21,792	29,823	
4	H28	0.7599	-7	21,792	25,225	-	-	21,792	28,677	
5	H29	0.7903	-6	21,792	25,225	-	-	21,792	27,574	
6	H30	0.8219	-5	21,792	25,225	-	-	21,792	26,514	
7	R1	0.8548	-4	21,792	25,225	-	-	21,792	25,494	
8	R2	0.8890	-3	21,792	25,225	-	-	21,792	24,513	
9	R3	0.9246	-2	21,792	25,225	-	-	21,792	23,569	
10	R4	0.9615	-1	21,792	25,225	-	-	21,792	22,665	
11	R5	1.0000	0	21,792	25,225	-	-	21,792	21,792	評価年
12	R6	1.0400	1	21,792	25,225	-	-	21,792	20,954	
13	R7	1.0816	2	21,792	25,225	-	-	21,792	20,148	
14	R8	1.1249	3	21,792	25,225	-	-	21,792	19,372	
15	R9	1.1699	4	21,792	25,225	-	-	21,792	18,627	完了年
16	R10	1.2167	5	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	38,643	
17	R11	1.2653	6	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	37,159	
18	R12	1.3159	7	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	35,730	
19	R13	1.3686	8	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	34,354	
20	R14	1.4233	9	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	33,034	
21	R15	1.4802	10	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	31,764	
22	R16	1.5395	11	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	30,540	
23	R17	1.6010	12	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	29,367	
24	R18	1.6651	13	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	28,237	
25	R19	1.7317	14	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	27,151	
26	R20	1.8009	15	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	26,108	
27	R21	1.8730	16	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	25,103	
28	R22	1.9479	17	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	24,137	
29	R23	2.0258	18	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	23,209	
30	R24	2.1068	19	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	22,317	
31	R25	2.1911	20	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	21,458	
32	R26	2.2788	21	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	20,632	
33	R27	2.3699	22	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	19,839	
34	R28	2.4647	23	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	19,076	
35	R29	2.5633	24	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	18,342	
36	R30	2.6658	25	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	17,637	
37	R31	2.7725	26	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	16,958	
38	R32	2.8834	27	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	16,306	
39	R33	2.9987	28	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	15,679	
40	R34	3.1187	29	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	15,076	
41	R35	3.2434	30	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	14,496	
42	R36	3.3731	31	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	13,939	
43	R37	3.5081	32	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	13,402	
44	R38	3.6484	33	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	12,887	
45	R39	3.7943	34	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	12,391	
46	R40	3.9461	35	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	11,915	
47	R41	4.1039	36	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	11,457	
48	R42	4.2681	37	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	11,016	
49	R43	4.4388	38	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	10,592	
50	R44	4.6164	39	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	10,185	
51	R45	4.8010	40	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	9,793	
52	R46	4.9931	41	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	9,416	
53	R47	5.1928	42	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	9,054	
54	R48	5.4005	43	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	8,706	
55	R49	5.6165	44	21,792	25,225	100.0	25,225	47,017	8,371	
合計（総便益額）									1,168,470	

※経過年は評価年からの年数。

(4) 総便益額算出表

(単位：千円、%)

評価期間	年度	割引率 (1 + 割引率) ¹ ①	経過年 (t)	維持管理節減効果						備考
				更新に係る効果 年効果額 ②	新設及び機能向上分に係る効果			計		
					③	効果発生割合 ④	年効果額 ⑤ = ③ × ④	年効果額 ⑥ = ② + ⑤	同割引後 ⑦ = ⑥ ÷ ①	
1	H25	0.6756	-10	-5,561	-	-	-	-5,561	-8,231	着工年
2	H26	0.7026	-9	-5,561	-	-	-	-5,561	-7,915	
3	H27	0.7307	-8	-5,561	-	-	-	-5,561	-7,611	
4	H28	0.7599	-7	-5,561	-	-	-	-5,561	-7,318	
5	H29	0.7903	-6	-5,561	-	-	-	-5,561	-7,037	
6	H30	0.8219	-5	-5,561	-	-	-	-5,561	-6,766	
7	R1	0.8548	-4	-5,561	-	-	-	-5,561	-6,506	
8	R2	0.8890	-3	-5,561	-	-	-	-5,561	-6,255	
9	R3	0.9246	-2	-5,561	-	-	-	-5,561	-6,015	
10	R4	0.9615	-1	-5,561	-	-	-	-5,561	-5,784	
11	R5	1.0000	0	-5,561	-	-	-	-5,561	-5,561	評価年
12	R6	1.0400	1	-5,561	-	-	-	-5,561	-5,347	
13	R7	1.0816	2	-5,561	-	-	-	-5,561	-5,141	
14	R8	1.1249	3	-5,561	-	-	-	-5,561	-4,944	
15	R9	1.1699	4	-5,561	-	-	-	-5,561	-4,753	完了年
16	R10	1.2167	5	-5,561	-	-	-	-5,561	-4,571	
17	R11	1.2653	6	-5,561	-	-	-	-5,561	-4,395	
18	R12	1.3159	7	-5,561	-	-	-	-5,561	-4,226	
19	R13	1.3686	8	-5,561	-	-	-	-5,561	-4,063	
20	R14	1.4233	9	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,907	
21	R15	1.4802	10	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,757	
22	R16	1.5395	11	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,612	
23	R17	1.6010	12	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,473	
24	R18	1.6651	13	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,340	
25	R19	1.7317	14	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,211	
26	R20	1.8009	15	-5,561	-	-	-	-5,561	-3,088	
27	R21	1.8730	16	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,969	
28	R22	1.9479	17	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,855	
29	R23	2.0258	18	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,745	
30	R24	2.1068	19	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,640	
31	R25	2.1911	20	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,538	
32	R26	2.2788	21	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,440	
33	R27	2.3699	22	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,347	
34	R28	2.4647	23	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,256	
35	R29	2.5633	24	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,169	
36	R30	2.6658	25	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,086	
37	R31	2.7725	26	-5,561	-	-	-	-5,561	-2,006	
38	R32	2.8834	27	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,929	
39	R33	2.9987	28	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,854	
40	R34	3.1187	29	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,783	
41	R35	3.2434	30	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,715	
42	R36	3.3731	31	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,649	
43	R37	3.5081	32	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,585	
44	R38	3.6484	33	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,524	
45	R39	3.7943	34	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,466	
46	R40	3.9461	35	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,409	
47	R41	4.1039	36	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,355	
48	R42	4.2681	37	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,303	
49	R43	4.4388	38	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,253	
50	R44	4.6164	39	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,205	
51	R45	4.8010	40	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,158	
52	R46	4.9931	41	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,114	
53	R47	5.1928	42	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,071	
54	R48	5.4005	43	-5,561	-	-	-	-5,561	-1,030	
55	R49	5.6165	44	-5,561	-	-	-	-5,561	-990	
合計（総便益額）									-189,271	

※経過年は評価年からの年数。

(4) 総便益額算出表

(単位：千円、%)

評価期間	年度	割引率 (1 + 割引率) ¹ ①	経過年 (t)	災害防止効果（農業）						備考
				更新に係る効果 年効果額 ②	新設及び機能向上分に係る効果			計		
					③	効果発生割合 ④	年効果額 ⑤ = ③ × ④	年効果額 ⑥ = ② + ⑤	同割引後 ⑦ = ⑥ ÷ ①	
1	H25	0.6756	-10	450,825	522,039	-	-	450,825	667,296	着工年
2	H26	0.7026	-9	450,825	522,039	-	-	450,825	641,652	
3	H27	0.7307	-8	450,825	522,039	-	-	450,825	616,977	
4	H28	0.7599	-7	450,825	522,039	-	-	450,825	593,269	
5	H29	0.7903	-6	450,825	522,039	-	-	450,825	570,448	
6	H30	0.8219	-5	450,825	522,039	-	-	450,825	548,516	
7	R1	0.8548	-4	450,825	522,039	-	-	450,825	527,404	
8	R2	0.8890	-3	450,825	522,039	-	-	450,825	507,115	
9	R3	0.9246	-2	450,825	522,039	-	-	450,825	487,589	
10	R4	0.9615	-1	450,825	522,039	-	-	450,825	468,877	
11	R5	1.0000	0	450,825	522,039	-	-	450,825	450,825	評価年
12	R6	1.0400	1	450,825	522,039	-	-	450,825	433,486	
13	R7	1.0816	2	450,825	522,039	-	-	450,825	416,813	
14	R8	1.1249	3	450,825	522,039	-	-	450,825	400,769	
15	R9	1.1699	4	450,825	522,039	-	-	450,825	385,353	完了年
16	R10	1.2167	5	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	799,592	
17	R11	1.2653	6	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	768,880	
18	R12	1.3159	7	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	739,315	
19	R13	1.3686	8	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	710,846	
20	R14	1.4233	9	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	683,527	
21	R15	1.4802	10	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	657,252	
22	R16	1.5395	11	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	631,935	
23	R17	1.6010	12	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	607,660	
24	R18	1.6651	13	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	584,268	
25	R19	1.7317	14	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	561,797	
26	R20	1.8009	15	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	540,210	
27	R21	1.8730	16	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	519,415	
28	R22	1.9479	17	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	499,442	
29	R23	2.0258	18	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	480,237	
30	R24	2.1068	19	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	461,773	
31	R25	2.1911	20	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	444,007	
32	R26	2.2788	21	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	426,919	
33	R27	2.3699	22	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	410,508	
34	R28	2.4647	23	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	394,719	
35	R29	2.5633	24	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	379,536	
36	R30	2.6658	25	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	364,943	
37	R31	2.7725	26	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	350,898	
38	R32	2.8834	27	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	337,402	
39	R33	2.9987	28	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	324,429	
40	R34	3.1187	29	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	311,945	
41	R35	3.2434	30	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	299,952	
42	R36	3.3731	31	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	288,418	
43	R37	3.5081	32	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	277,319	
44	R38	3.6484	33	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	266,655	
45	R39	3.7943	34	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	256,401	
46	R40	3.9461	35	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	246,538	
47	R41	4.1039	36	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	237,058	
48	R42	4.2681	37	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	227,938	
49	R43	4.4388	38	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	219,173	
50	R44	4.6164	39	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	210,741	
51	R45	4.8010	40	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	202,638	
52	R46	4.9931	41	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	194,842	
53	R47	5.1928	42	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	187,349	
54	R48	5.4005	43	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	180,143	
55	R49	5.6165	44	450,825	522,039	100.0	522,039	972,864	173,215	
合計（総便益額）									23,635,517	

※経過年は評価年からの年数。

(4) 総便益額算出表

(単位：千円、%)

評価期間	年度	割引率 (1 + 割引率) ¹ ①	経過年 (t)	災害防止効果（一般資産）						備考
				更新に係る効果 年効果額 ②	新設及び機能向上分に係る効果			計		
					③	効果発生割合 ④	年発生効果額 ⑤ = ③ × ④	年効果額 ⑥ = ② + ⑤	同割引後 ⑦ = ⑥ ÷ ①	
1	H25	0.6756	-10	21,079	24,408	-	-	21,079	31,200	着工年
2	H26	0.7026	-9	21,079	24,408	-	-	21,079	30,001	
3	H27	0.7307	-8	21,079	24,408	-	-	21,079	28,848	
4	H28	0.7599	-7	21,079	24,408	-	-	21,079	27,739	
5	H29	0.7903	-6	21,079	24,408	-	-	21,079	26,672	
6	H30	0.8219	-5	21,079	24,408	-	-	21,079	25,647	
7	R1	0.8548	-4	21,079	24,408	-	-	21,079	24,660	
8	R2	0.8890	-3	21,079	24,408	-	-	21,079	23,711	
9	R3	0.9246	-2	21,079	24,408	-	-	21,079	22,798	
10	R4	0.9615	-1	21,079	24,408	-	-	21,079	21,923	
11	R5	1.0000	0	21,079	24,408	-	-	21,079	21,079	評価年
12	R6	1.0400	1	21,079	24,408	-	-	21,079	20,268	
13	R7	1.0816	2	21,079	24,408	-	-	21,079	19,489	
14	R8	1.1249	3	21,079	24,408	-	-	21,079	18,739	
15	R9	1.1699	4	21,079	24,408	-	-	21,079	18,018	完了年
16	R10	1.2167	5	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	37,386	
17	R11	1.2653	6	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	35,950	
18	R12	1.3159	7	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	34,567	
19	R13	1.3686	8	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	33,236	
20	R14	1.4233	9	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	31,959	
21	R15	1.4802	10	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	30,730	
22	R16	1.5395	11	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	29,547	
23	R17	1.6010	12	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	28,412	
24	R18	1.6651	13	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	27,318	
25	R19	1.7317	14	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	26,267	
26	R20	1.8009	15	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	25,258	
27	R21	1.8730	16	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	24,286	
28	R22	1.9479	17	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	23,352	
29	R23	2.0258	18	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	22,454	
30	R24	2.1068	19	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	21,591	
31	R25	2.1911	20	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	20,760	
32	R26	2.2788	21	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	19,961	
33	R27	2.3699	22	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	19,194	
34	R28	2.4647	23	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	18,455	
35	R29	2.5633	24	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	17,745	
36	R30	2.6658	25	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	17,063	
37	R31	2.7725	26	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	16,406	
38	R32	2.8834	27	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	15,775	
39	R33	2.9987	28	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	15,169	
40	R34	3.1187	29	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	14,585	
41	R35	3.2434	30	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	14,024	
42	R36	3.3731	31	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	13,485	
43	R37	3.5081	32	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	12,966	
44	R38	3.6484	33	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	12,468	
45	R39	3.7943	34	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	11,988	
46	R40	3.9461	35	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	11,527	
47	R41	4.1039	36	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	11,084	
48	R42	4.2681	37	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	10,657	
49	R43	4.4388	38	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	10,248	
50	R44	4.6164	39	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	9,853	
51	R45	4.8010	40	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	9,474	
52	R46	4.9931	41	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	9,110	
53	R47	5.1928	42	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	8,760	
54	R48	5.4005	43	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	8,423	
55	R49	5.6165	44	21,079	24,408	100.0	24,408	45,487	8,099	
合計（総便益額）									1,105,102	

※経過年は評価年からの年数。

(4) 総便益額算出表

(単位：千円、%)

評価期間	年度	割引率 (1 + 割引率) ¹ ①	経過年 (t)	災害防止効果（公共資産）						備考
				更新に係る効果 年効果額 ②	新設及び機能向上分に係る効果			計		
					③	効果発生割合 ④	年効果額 ⑤ = ③ × ④	年効果額 ⑥ = ② + ⑤	同割引後 ⑦ = ⑥ ÷ ①	
1	H25	0.6756	-10	38,465	44,297	-	-	38,465	56,935	着工年
2	H26	0.7026	-9	38,465	44,297	-	-	38,465	54,747	
3	H27	0.7307	-8	38,465	44,297	-	-	38,465	52,641	
4	H28	0.7599	-7	38,465	44,297	-	-	38,465	50,619	
5	H29	0.7903	-6	38,465	44,297	-	-	38,465	48,671	
6	H30	0.8219	-5	38,465	44,297	-	-	38,465	46,800	
7	R1	0.8548	-4	38,465	44,297	-	-	38,465	44,999	
8	R2	0.8890	-3	38,465	44,297	-	-	38,465	43,268	
9	R3	0.9246	-2	38,465	44,297	-	-	38,465	41,602	
10	R4	0.9615	-1	38,465	44,297	-	-	38,465	40,005	
11	R5	1.0000	0	38,465	44,297	-	-	38,465	38,465	評価年
12	R6	1.0400	1	38,465	44,297	-	-	38,465	36,986	
13	R7	1.0816	2	38,465	44,297	-	-	38,465	35,563	
14	R8	1.1249	3	38,465	44,297	-	-	38,465	34,194	
15	R9	1.1699	4	38,465	44,297	-	-	38,465	32,879	完了年
16	R10	1.2167	5	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	68,022	
17	R11	1.2653	6	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	65,409	
18	R12	1.3159	7	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	62,894	
19	R13	1.3686	8	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	60,472	
20	R14	1.4233	9	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	58,148	
21	R15	1.4802	10	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	55,913	
22	R16	1.5395	11	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	53,759	
23	R17	1.6010	12	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	51,694	
24	R18	1.6651	13	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	49,704	
25	R19	1.7317	14	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	47,792	
26	R20	1.8009	15	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	45,956	
27	R21	1.8730	16	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	44,187	
28	R22	1.9479	17	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	42,488	
29	R23	2.0258	18	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	40,854	
30	R24	2.1068	19	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	39,283	
31	R25	2.1911	20	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	37,772	
32	R26	2.2788	21	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	36,318	
33	R27	2.3699	22	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	34,922	
34	R28	2.4647	23	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	33,579	
35	R29	2.5633	24	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	32,287	
36	R30	2.6658	25	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	31,046	
37	R31	2.7725	26	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	29,851	
38	R32	2.8834	27	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	28,703	
39	R33	2.9987	28	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	27,599	
40	R34	3.1187	29	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	26,537	
41	R35	3.2434	30	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	25,517	
42	R36	3.3731	31	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	24,536	
43	R37	3.5081	32	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	23,592	
44	R38	3.6484	33	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	22,684	
45	R39	3.7943	34	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	21,812	
46	R40	3.9461	35	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	20,973	
47	R41	4.1039	36	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	20,167	
48	R42	4.2681	37	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	19,391	
49	R43	4.4388	38	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	18,645	
50	R44	4.6164	39	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	17,928	
51	R45	4.8010	40	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	17,238	
52	R46	4.9931	41	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	16,575	
53	R47	5.1928	42	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	15,938	
54	R48	5.4005	43	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	15,325	
55	R49	5.6165	44	38,465	44,297	100.0	44,297	82,762	14,736	
合計（総便益額）									2,012,621	

※経過年は評価年からの年数。

2. 効果額の算定方法

(1) 作物生産効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の農作物生産量の比較により年効果額を算定した。

○対象作物

水稻、大豆、にんじん、キャベツ、だいこん、はくさい、きゅうり、いちご

○年効果額算定式

年効果額＝単収増加年効果額^{※1}＋作付増減年効果額^{※2}

※1 単収増加年効果額＝（事業ありせば農作物生産量－事業なかりせば農作物生産量）×
単価×単収増加の純益率

※2 作付増減年効果額＝（事業ありせば農作物生産量－事業なかりせば農作物生産量）×
単価×作付増減の純益率

○年効果額の算定

作物名	新設・更新	効果要因	農作物生産量			生産物単価	増収加益	純益率	年効果額
			事業なかりせば	事業ありせば	増減				
			①	②	③				
水稻	新設 更新	単収増（水害防止）	166.5	261.3	94.8	225	21,290	71	15,116
		単収増（水害防止）	143.8	225.6	81.9	225	18,385	71	13,053
		計							28,169
大豆（田）	新設 更新	単収増（水害防止）	44.7	49.5	4.7	181	855	71	607
		単収増（水害防止）	38.6	42.7	4.1	181	739	71	525
		計							1,132
大豆（畑）	新設 更新	単収増（水害防止）	19.7	21.8	2.1	181	377	73	275
		単収増（水害防止）	17.0	18.8	1.8	181	326	73	238
		計							513
にんじん	新設 更新	単収増（水害防止）	91.3	100.7	9.4	92	869	77	669
		単収増（水害防止）	78.8	87.0	8.2	92	751	77	578
		計							1,247
キャベツ	新設 更新	単収増（水害防止）	59.8	65.8	6.0	71	426	78	332
		単収増（水害防止）	51.6	56.8	5.2	71	368	78	287
		計							619
だいこん	新設 更新	単収増（水害防止）	49.0	54.0	5.0	65	323	77	249
		単収増（水害防止）	42.4	46.7	4.3	65	279	77	215
		計							464
はくさい	新設 更新	単収増（水害防止）	47.1	51.9	4.8	48	230	78	179
		単収増（水害防止）	40.7	44.8	4.2	48	199	78	155
		計							334
きゅうり	新設 更新	単収増（水害防止）	163.9	181.1	17.1	272	4,657	76	3,539
		単収増（水害防止）	141.6	156.4	14.8	272	4,020	76	3,055
		計							6,594
いちご	新設 更新	単収増（湿害防止）	62.3	68.6	6.3	897	5,678	75	4,259
		単収増（湿害防止）	53.8	59.2	5.5	897	4,915	75	3,686
		計							7,945
	新設					34,705		25,225	
	更新					29,982		21,792	
	合計					64,687		47,017	

【新設】

- ・農作物生産量： 「事業なかりせば」は、事業実施前の現況の生産量であり、前野土地改良事業計画書に記載された各種諸元を基に算定した。
「事業ありせば」は、計画の生産量であり、「事業なかりせば」に水害防止等による増収率を考慮して算定した。

【更新】

- ・農作物生産量： 「事業なかりせば」は、農業用排水施設の機能喪失時に想定される生産量であり、「事業ありせば」に効果要因別に失われる増収率を考慮して算定した。
「事業ありせば」は、評価時点の生産量であり、農林水産統計による最近年の平均単収を基に算定した。

【共通】

- ・生産物単価： 農業物価統計等による最近5カ年の販売価格に消費者物価指数を反映した価格を用いた。
- ・純益率： 経済効果算定に必要な諸係数通知による標準値等を用いた。

(2) 維持管理費節減効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

○対象施設

前野排水機場、前野導水路、池田導水路、一色悪水樋門

○効果算定式

年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

<農業用用水施設>

区分	事業なかりせば 維持管理費 ①	事業ありせば 維持管理費 ②	年効果額 ③＝①－②
	千円	千円	千円
新設整備	0	0	0
更新整備	0	5,561	△ 5,561
計			△ 5,561

【新設】

- ・事業なかりせば維持管理費（①）： 前野土地改良事業計画書に記載された現況の経費を基に算定した。
- ・事業ありせば維持管理費（②）： 施設管理者からの聞き取りによる評価時点の維持管理費の実績値を基に算定した。

【更新】

- ・事業なかりせば維持管理費（①）： 前野土地改良事業計画書に記載された現況の経費を基に、施設の機能を失った場合において安全管理等に最低限必要な維持管理費を算定した。
- ・事業ありせば維持管理費（②）： 前野土地改良事業計画書に記載された現況の経費を基に算定した。

※本事業の実施により節減が見込まれる維持管理費は、更新整備区分の年効果額△4,197千円。

<算定額>更新整備区分「①－②」＝0千円－4,197千円＝△4,197千円（節減額）

(3) 災害防止効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、災害（洪水等）の発生に伴う農作物等の被害が防止又は軽減される効果を算定した。

○対象資産

農地、農業用施設、一般資産、公共土木施設

○効果算定式

年効果額＝事業なかりせば年被害（想定）額－事業ありせば年被害（想定）額

○年効果額の算定

対象資産項目	事業なかりせば 年被害（想定）額 ①	事業ありせば 年被害（想定）額 ②	年効果額 ③＝①－②
	千円	千円	千円
農業関係資産 （新設）	564,354	42,316	522,039
農業関係資産 （更新）	487,368	36,543	450,825
計	1,051,723	78,859	972,864
一般資産 （新設）	24,408	0	24,408
一般資産 （更新）	21,079		21,079
計	45,487	0	45,487
公共資産 （新設）	44,297		44,297
公共資産 （更新）	38,465		38,465
計	82,762	0	82,762
新設			590,745
更新			510,369
合計			1,101,113

・事業なかりせば年被害（想定）額
（①）：

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に湛水シミュレーションにより事業なかりせば想定される年被害額を推定した。

・事業ありせば年被害（想定）額（②）：

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に湛水シミュレーションにより事業ありせば想定される年被害額を推定した。

3. 評価に使用した資料

【共通】

- ・ 農林水産省農村振興局整備部（監修）[改訂版]「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大成出版社（平成27年9月5日第2版第1刷発行）
- ・ 「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について（平成30年2月1日付け29農振第1784号農林水産省農村振興局整備部長通知）
- ・ 「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について（令和4年4月7日付け4農振第37号農林水産省農村振興局整備部長通知）
- ・ 土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年3月28日付け18農振第1598号農林水産省農村振興局企画部長通知（令和5年4月3日一部改正））
- ・ 土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（令和5年4月3日付け農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

【費用】

- ・ 当該事業費（及び関連事業費）に係る一般に公表されていない諸元については、愛知県農林基盤局農地部農地計画課調べ

【便益】

- ・ 東海農政局統計部（平成19～21年）「第54～56次愛知県農林水産統計年報」農林水産統計協会
- ・ 東海農政局統計部（平成22～23年）「第57～58次東海農林水産統計年報」農林水産統計協会
- ・ 国土交通省水管理・国土保全局（令和2年4月）「治水経済調査マニュアル（案）」
- ・ 国土交通省水管理・国土保全局河川計画課（令和5年6月改正）「治水経済調査マニュアル(案)各種資産評価単価及びデフレーター」
- ・ 上記以外の効果算定に必要な各種諸元については、愛知県農林基盤局農地部農地計画課調べ

令和5年度 東海農政局農業農村整備等事業技術検討会 補足説明資料



前野排水機場(廃止)



前野排水機場(新設)

農村地域防災減災事業


まへの

「前野地区」
(愛知県西尾市)

農村地域防災減災事業「前野地区」の概要

事業地区名 市町村名	前野地区（愛知県西尾市）
地区の概要	本地区は、愛知県の中央を流下する矢作古川の右岸に位置する低平地で、地区内排水の大半は地区内の排水機場による排水に頼っている地域である。 前野排水機場は昭和50年に整備され、地区内の排水対策が確立された。しかし、地域内開発による流出量の増加に加えて、地盤沈下、経年変化による排水機の機能低下により既存の排水施設では対応が困難となった。 このため、本事業により排水機場の更新整備を行うことにより、湛水被害を解消し、本地域全体として農業経営の安定と国土保全を図るものである。
全体事業費	3, 4 2 0 百万円 （負担割合 国 55% : 県 35% : 市 10%）
受益面積 (湛水面積)	2 2 2 h a （田144ha、畑 17ha、その他 61ha）
事業内容	排水機場 1 式（排水ポンプφ1, 650mm×2台）
事業期間	平成25年度～令和9年度

「前野地区」位置図

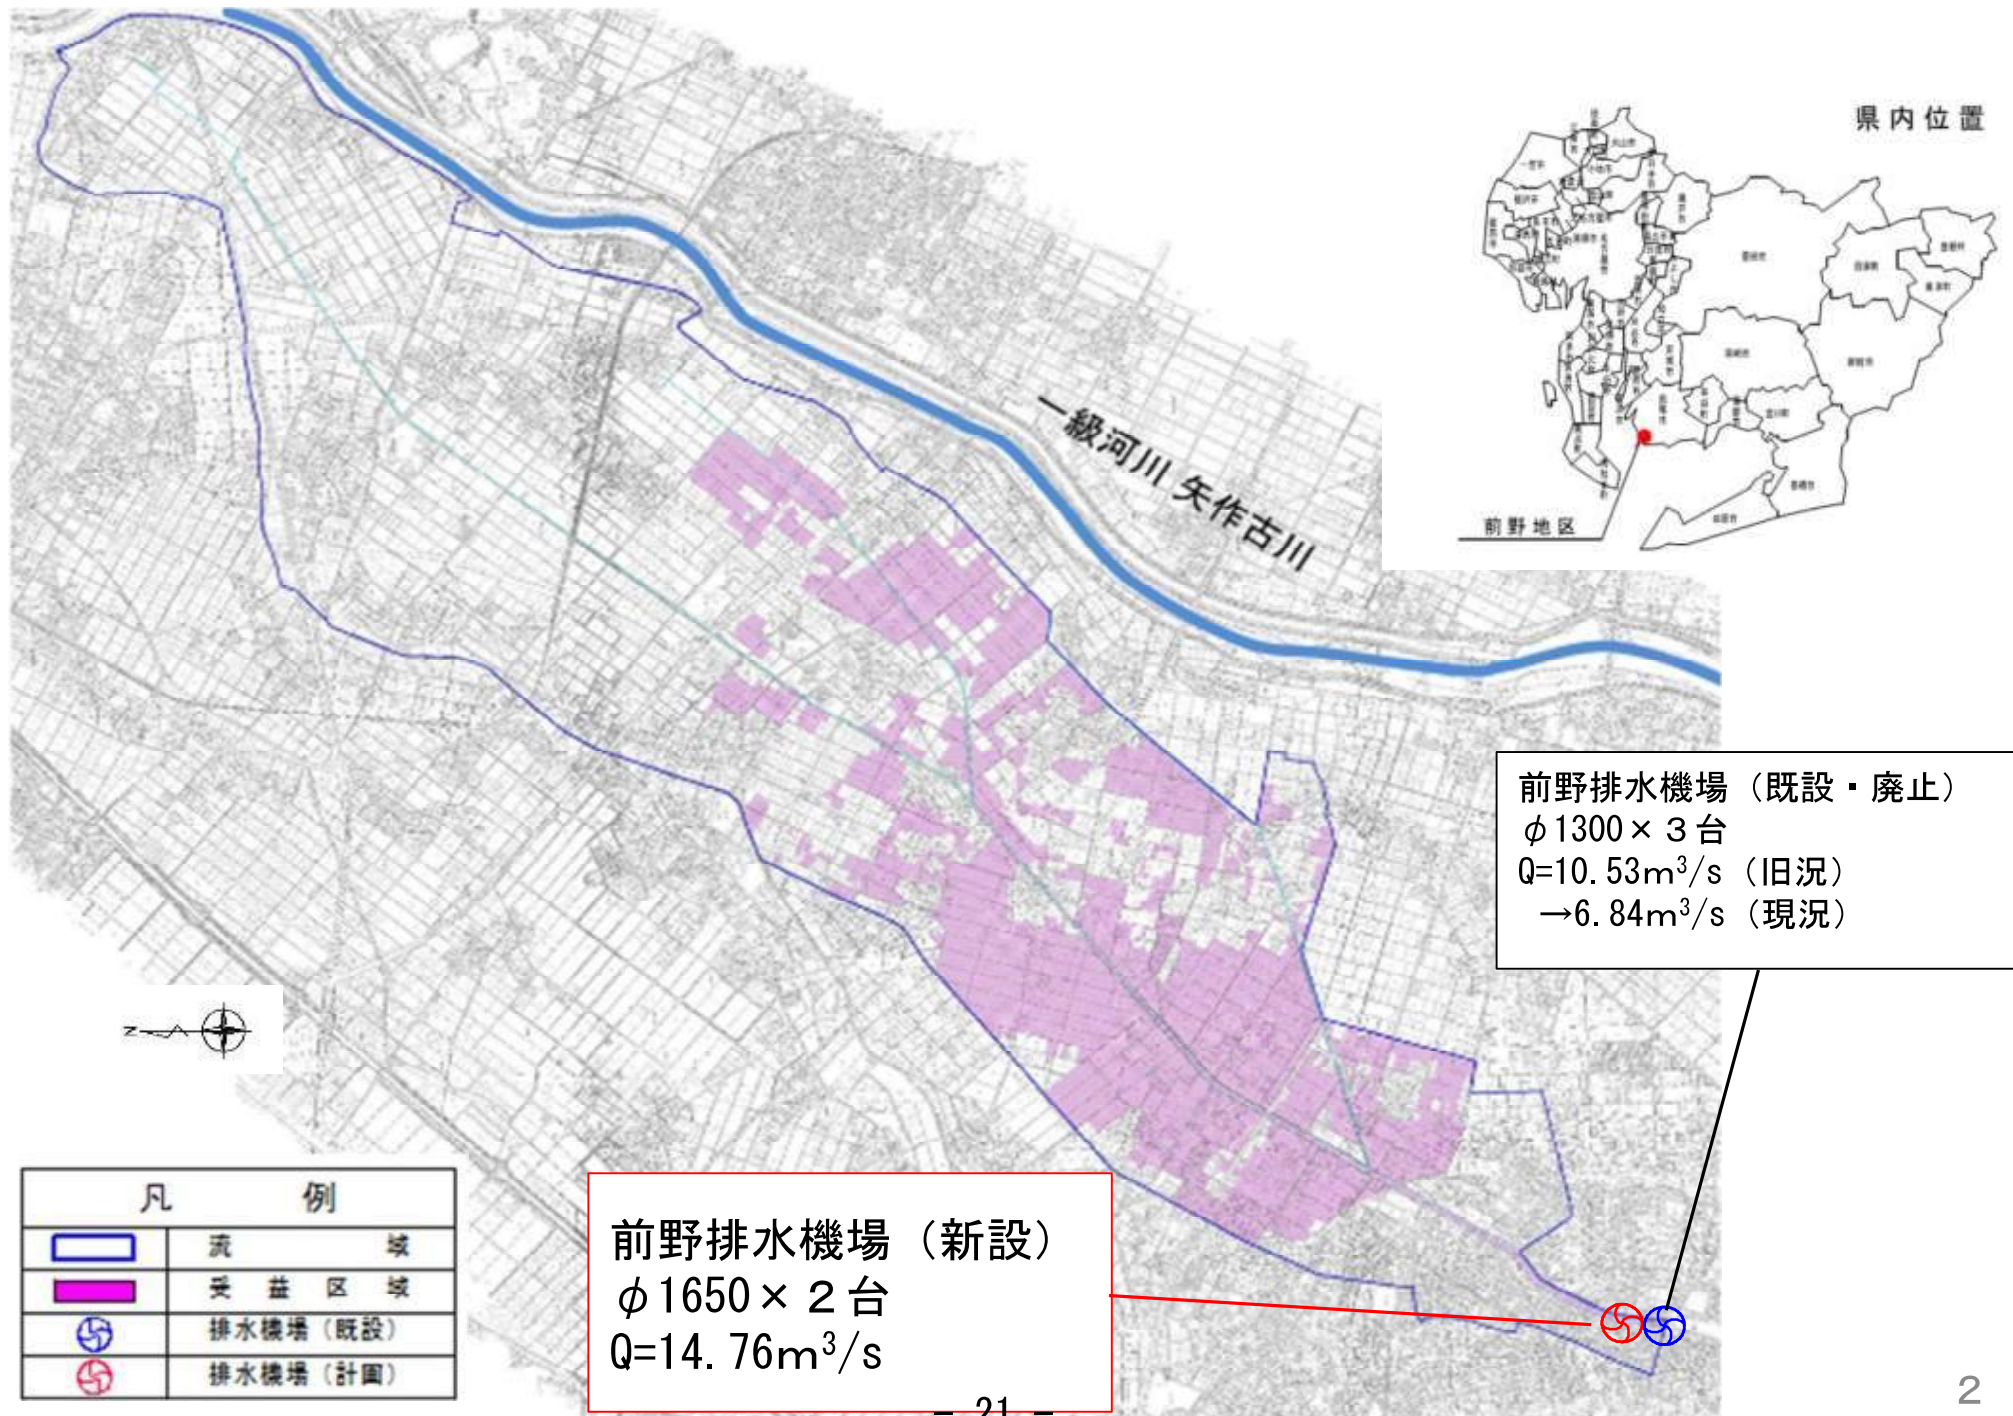

事業の目的

経年変化に伴う排水機の機能低下や地区内開発による流出量の増加等により排水状況が悪化し、既存の排水施設では対応が困難となっており、排水機場の更新整備を実施。


湛水状況

平成16年10月8日～9日(台風22号)

平常時




湛水時

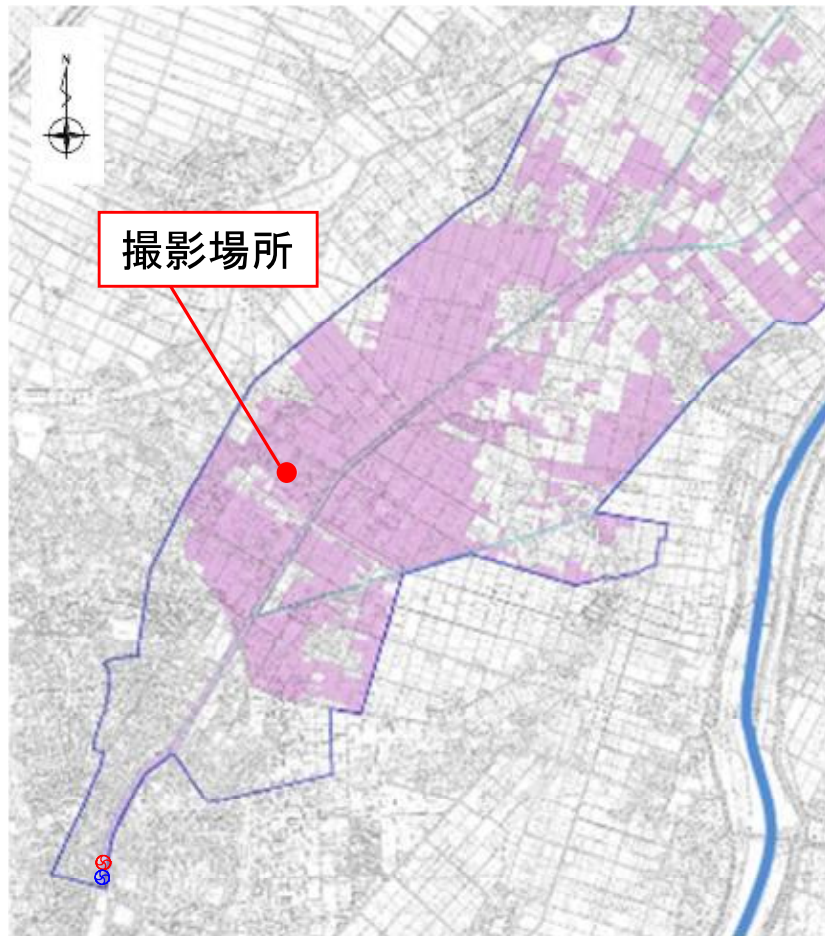

湛水時間等の変化

＜ 3 日連続雨量 (20年確率) におけるシミュレーション結果＞

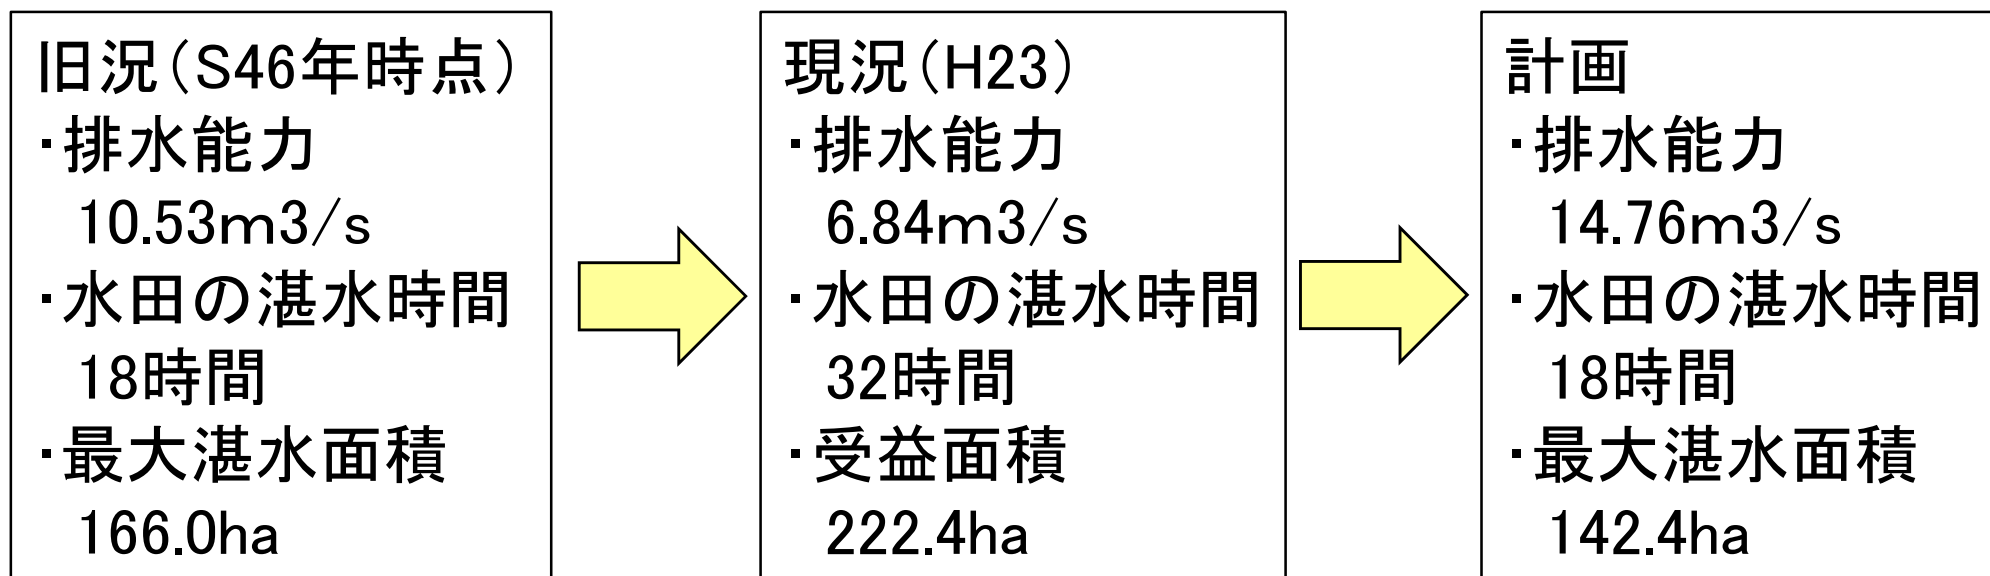

＜排水不良の原因＞

- ・排水機の機能低下
旧況 10.53m³/s → 現況 6.84m³/s
- ・地区内開発による流出率の増加
旧況 83.8% → 現況 84.8%
- ・地盤沈下
S46～H23の間で約15cm沈下

事業の進捗状況

事業工期

【当初計画】

県内の一般的な排水機場の新設・廃止工事の工期を設定（6年間）

1. 施工計画の見直し

- ① 地元との調整の結果、仮設ヤードを変更（左岸道路→水路内仮設構台）＜樋管工＞
- ② 工事現場が狭小で複数工種の同時施工が困難→段階的施工に変更＜機械工、樋管工、撤去工＞
- ③ 振動・騒音対策のため鋼矢板打込み工法の変更
高周波バイブロ工法→油圧圧入引抜工（先行掘削併用）＜機場工、樋管工＞


2. 現場条件により杭基礎の追加＜樋管工＞

3. 予算の制約＜機械工＞


施工計画の見直し等により工期を8年延長

今後のスケジュール（予定）

当初計画：←.....→

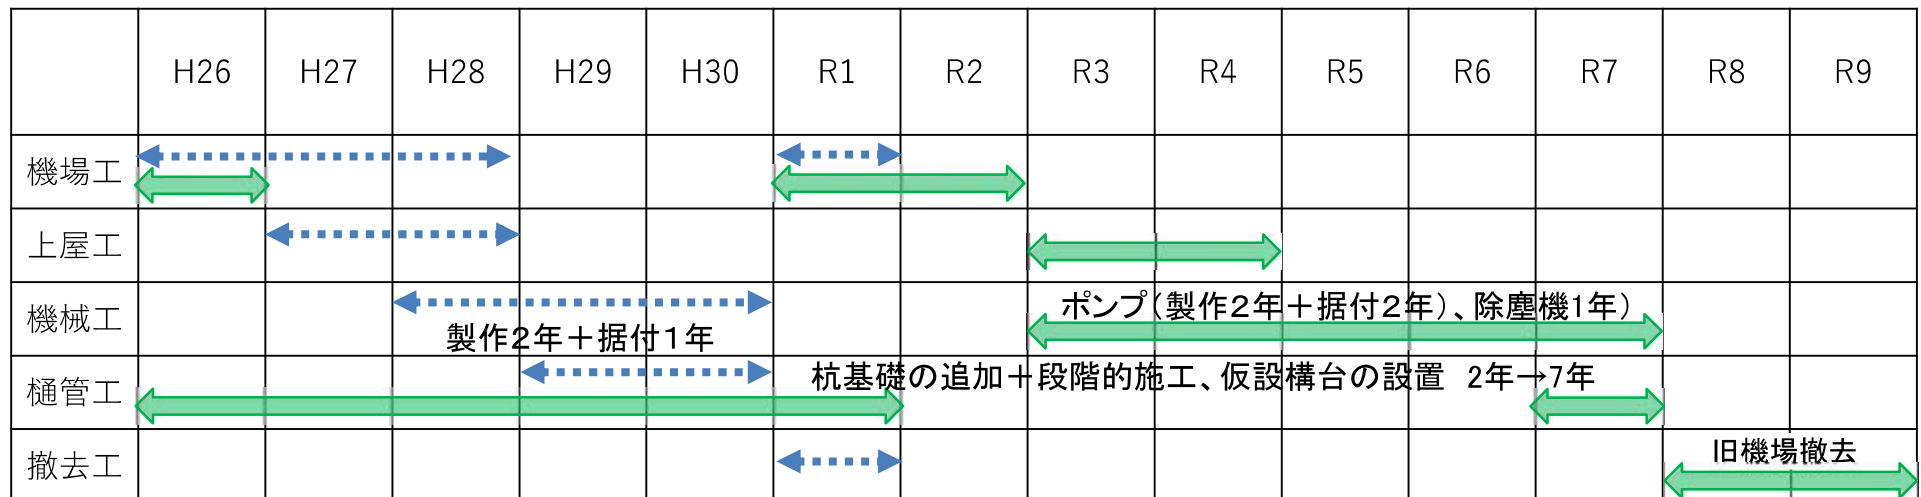

【参考】全体実施設計での計画見直し

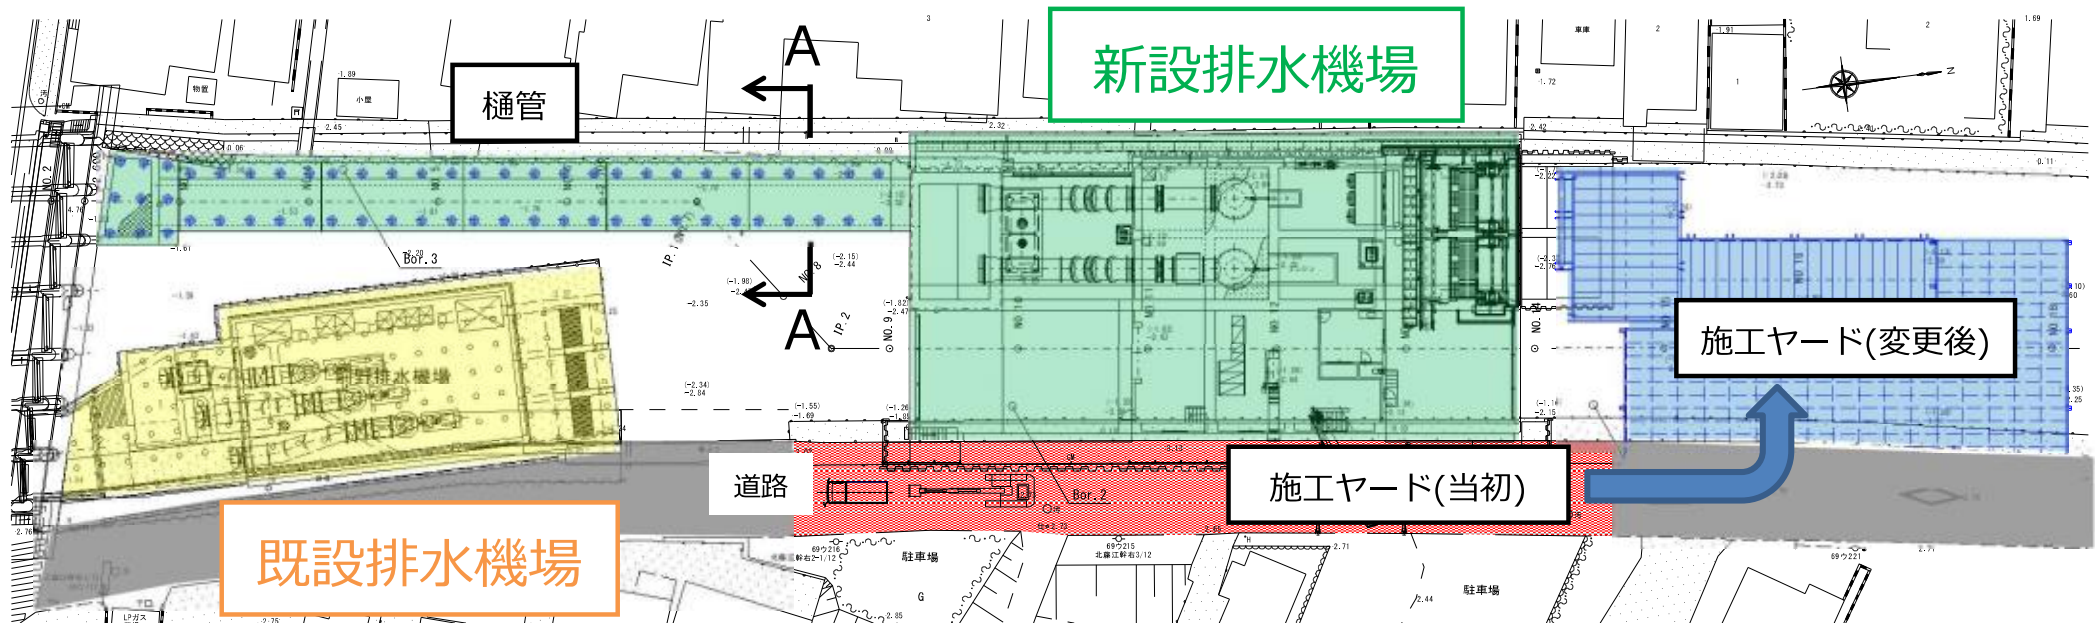

費用対効果分析

○総費用

総費用（現在価値化）	5,439,409千円
当該事業による費用	3,062,738千円
その他費用	2,376,671千円

○総便益

総便益額（現在価値化）	27,732,439千円
-------------	--------------

○総費用総便益比

総便益額/総費用＝5.09

環境への配慮

<周辺家屋等への配慮>

- ・油圧式圧入工法の採用
- ・防音シートによる騒音対策
- ・汚濁水の流出防止対策

○鋼矢板圧入状況



○防音シートによる騒音対策



○汚濁水の流出防止対策



<生態系への配慮>

当該施工箇所は市街化区域のため、環境配慮区域に指定されていない。

- ・特に配慮すべき生物は生息していないが、工事の実施に当たっては、締切内に魚類が入り込んだ場合には排水路に放流するなどの配慮を行う。

コスト縮減

①杭基礎の見直しによるコスト縮減

機場工の杭基礎について、計画のPHC杭から、SC杭に見直し

○施工費用（直接工事費ベース）

杭種	PHC杭	JIS強化杭	SC杭（採用）
コスト	2.31	1.02	1.00

JIS強化杭：PHC杭の一種で、せん断耐力及び変形性能を確保するために道路橋示方書の規定によりスパイラル鉄筋量をPHC杭よりも多く配筋した杭

SC杭：外殻鋼管と高強度コンクリートをライニングした合成杭

②鋼矢板の転用計画の見直しによるコスト縮減

1,328tの搬入量を、複数回転用する計画に見直すことにより、525tに縮減

○機場工・樋管工（工事間で流用）

単位：t

	機場①	樋管①	樋管②-1	樋管②-2	樋管②-3	樋管②-4	機場②-1	機場②-2	機場②-3	機場②-4	計
必要量	240	170	94	47	47	46	213	181	203	87	1,328
うち搬入量	240	129	52	5	0	0	97	0	2	0	525
搬入のうち 次期工事へ転用	221	129	0	4	0	0	84	0	0	0	438
