


海岸保全施設整備連携事業

事業目的

大規模地震や高潮の発生の危険性が高く重要な背後地を抱え、河川改修や港湾整備等の異なる事業との計画的な連携が必要な個所において、海岸堤防等の整備を実施し、津波・高潮対策等を計画的・集中的に推進することで、背後地の人命・資産の防護を図る

事業内容

南海トラフ地震等の大規模地震の発生リスクが高い地域、または、ゼロメートル地帯等で高潮により大きな被害が発生するおそれの高い地域において、近接する河川事業や港湾事業等と連携して背後地を守る事業

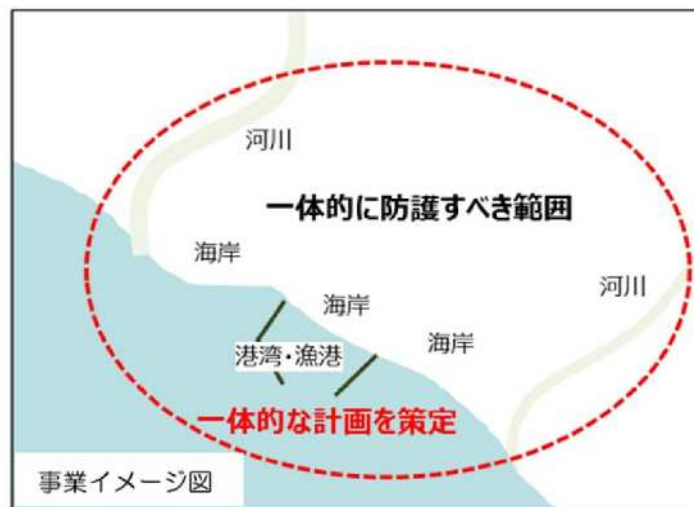


参考 再評価の対象

「農地保全に係る海岸保全施設整備連携事業実施要領」第4によると、「やむを得ず事業計画等を変更する場合には、原則として「農業農村整備事業等補助事業評価（期中・完了後）実施要領」に基づき事業評価を実施した上で、事業計画等の変更を行うものとする。」とあるため、今年度計画変更の必要がある「幡豆地区」は再評価の対象となる。

海岸保全施設整備連携事業「^{はず}幡豆地区」事業概要図【No. 49】

番号	海岸名	地区 海岸名	種類	施設名
①	衣浦港	市川	樋門	市川
②	衣浦港	西小槲	樋門	西小槲
③	衣浦港	小栗	樋門	小栗
④	衣浦港	西尾	堤防	西尾堤防
⑤	衣浦港	西尾	樋門	南奥田第1
⑥	寺津漁港	寺津	樋門	古居
⑦	衣浦港	中根	樋門	中根
⑧	栄生漁港	中根	樋門	北浜川水門
⑨	一色	細川	樋門	大岡第2
⑩	衣浦港	細川	樋門	細川
⑪	一色	細川	樋門	西実録第1
⑫	一色	細川・小藪	樋門	西実録第2
⑬	一色漁港	一色・藤江・生田	樋門	東実録第2
⑭	一色漁港	一色・藤江・生田	樋門	藤江
⑮	一色漁港	一色・藤江・生田	樋門	坂田
⑯	一色漁港	一色・藤江・生田	樋門	酒手島
⑰	一色	生田	樋門	竹生新田
⑱	一色	生田・千間・吉田	樋門	千生新田
⑲	吉良	吉田	樋門	高島新田
⑳	吉良	吉田	樋門	高島
㉑	吉良	吉田	樋門	豊岡新田
施設数				
21か所				

位置図

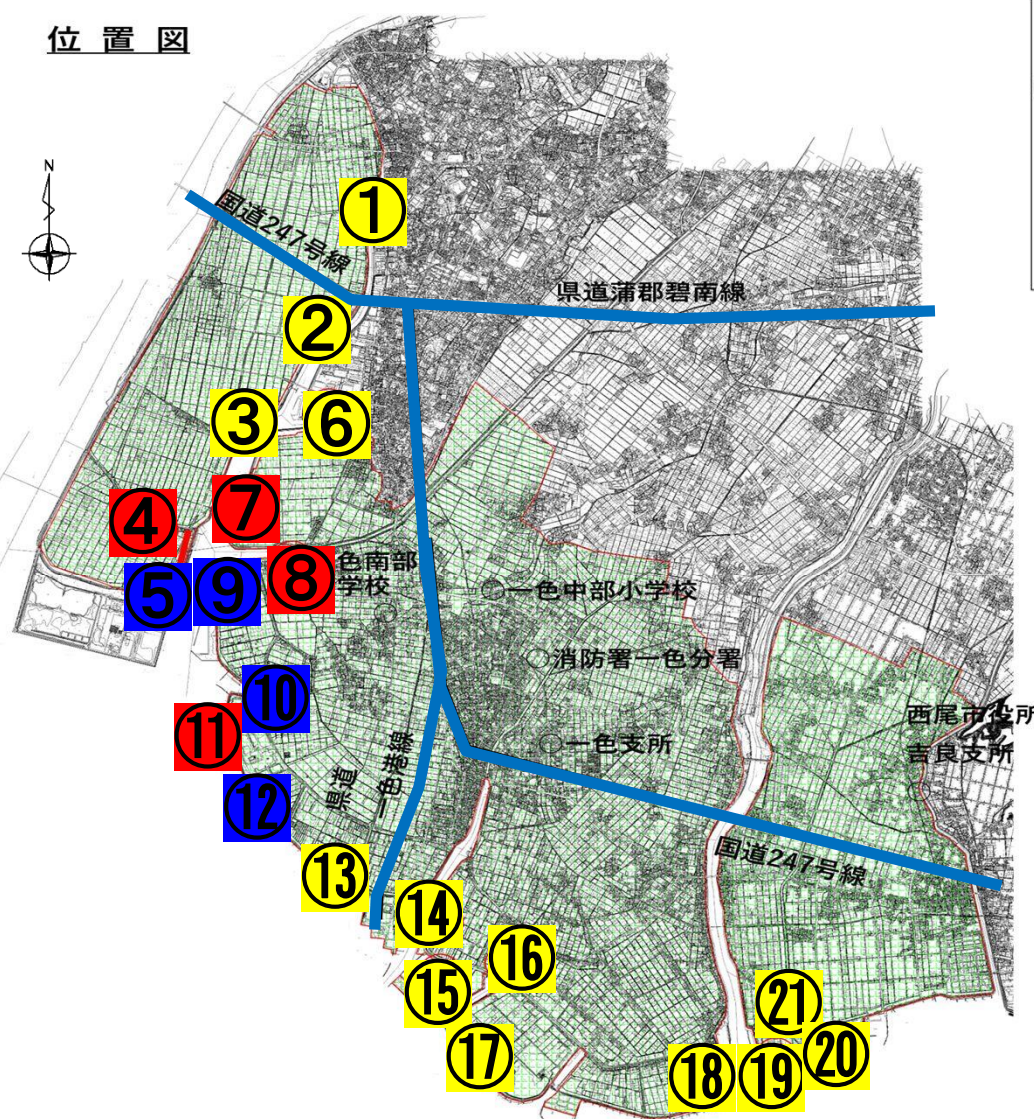

凡 例	
	防護区域 A=3,682ha
	対象施設

凡 例	
	R6年度まで
	R7年度
	R8年度以降

農業農村整備事業等再評価地区別資料

局	名	東海農政局
---	---	-------

都道府県名	愛知県	関係市町村名	にしおし 西尾市
事業名	海岸保全施設整備連携事業	地区名	はづ 幡豆
事業主体名	愛知県	事業採択年度	令和元年度
〔事業内容〕 <>は変更計画を示す 事業目的：本地区は、人口約 17 万人を抱える西三河南部の西尾市に位置している。三河湾に面した衣浦港海岸始め 6 海岸及び一級河川矢作古川の堤防の背後地には、広大なゼロメートル地帯が広がっているが、耐震性の不足が判明しており、南海トラフ地震で想定される津波が発生した場合には 3,682ha が浸水するなど、約 1 万戸の家屋等に甚大な被害が想定される。 このため、市街地や農山漁村地域における津波被害を防ぐため、他省庁と連携した本事業によって三河湾に面した衣浦港海岸始め 6 海岸の海岸堤防等及び一級河川矢作古川の河川堤防の耐震補強を一体的に行い、大規模地震時においても必要な堤防高等を確保することで背後地を防護し、本地域全体として農業経営の安定と国土保全を図るものである。 防 護 面 積： 3,682ha（他省庁所管の事業と連携した防護面積） 主要工事計画： 耐震補強工 堤防 1 か所 樋門<20 か所>（計画 21 か所） 総 事 業 費： <4,286 百万円>（計画総事業費：3,588 百万円） 工 期： <令和元年度～令和 10 年度>（計画工期：令和元年度～令和 7 年度） 関 連 事 業： 事業間連携計画書（西尾・幡豆地域津波対策）に位置付けられた事業 〔項 目〕 ア 事業の進捗状況 本地区の令和 6 年度までの進捗率は<80.9%>（計画 96.6%）である。 ① 計画工期に対して著しい変更は認められないか 工事の進捗に遅れを生じたため、計画工期を令和 10 年度まで 3 年延長する。 ② 地元負担等について、関係者間の合意形成が図られているか 地元負担について関係者との合意形成が図られている。 イ 関連事業の進捗状況 関連する事業のうち河川事業は令和元年度に完了し、漁港海岸事業は令和 12 年度に完了する見込み。			

① 「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われているか
海岸保全基本計画に即し、適切に連携・調整が行われている。

② 国営附帯地区については、国営事業との進捗調整が図られているか
本地区は国営附帯地区に該当しない。

ウ 農林水産業の情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化

① 防護面積の増又は減が10%未満であるか
当初計画時から受益面積の変動は生じていない。

② 主要工事計画の著しい変更が認められないか
計画どおりであり、変更はない。樋門1か所の減については、他事業による耐震化整備により除外したもの。

エ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む）

本地区は、治水経済マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター改訂により、農作物の生産単価や住居、事業所等の評価額及び資産額が増加したことにより、費用対効果が増加している。

① 工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除く。）が計画事業費の10%未満であるか

工法変更による事業費増により15.9%の計画事業費の増額が見込まれているため、計画変更手続中。

② 市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られているか
西尾市の農業振興地域整備計画と整合が図られている。

③ 費用対効果分析の結果
(B/C) 25.78 （現計画時：20.2）

オ 事業コスト削減等の可能性

① 堤防耐震工事で実施する二重鋼矢板締切工法においては、ハット形鋼矢板を使用することで、一般鋼矢板の使用よりも施工枚数を減らし、工事費の低減を図っている。

② 農地海岸に隣接する建設海岸や漁港海岸と施工時期を合わせることで、既設構造物の撤去や復旧作業の重複を極力少なくし、工事費の低減を図っている。

③ 他事業で発生土した土砂を盛土材として有効利用しており、工事費の低減を図っている。

カ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向

○西尾市の意向

本地区の海岸保全施設の老朽化や、近年における異常気象により、市民生活や農・漁業施設などへの多大な被害の発生を危惧していることから、海岸保全施設の早急な対策・整備は欠かせないものと考えている。

このため、本事業での海岸保全施設の改修・整備の着実な進捗を望み、市民生活や生命財産を守り、生産性の向上と地域の活性化に資するためにも、更なる事業の推進を望んでいる。

キ 代替案の実現可能性（上記の検討の結果、問題があると認められる場合に限る。）
該当なし

ク その他

① 環境等の調和への配慮

工事区域周辺は、海苔養殖が盛んなため、海で行う作業は海苔養殖期間（９月～３月）以外の４月から８月としている。また、施工にあたってはノッチタンクによる排水やオイルフェンスの設置等、濁水防止対策に努めている。

また、工事で発生する土砂運搬について、地元町内会と調整し周辺住家への影響が少ない運搬ルートを選定している。

② 計画変更

第１回計画変更年月日（計画確定日） 令和４年１２月１３日

第２回計画変更年月日（計画確定日） 計画変更実施中

事業主体の 事業実施方針	継続する。
事業主体の 予算要求方針	令和８年度予算を要求する。
第三者 の意見	
補助金 交付の方針	

幡豆地区の事業の効用に関する説明資料

1 総費用総便益比の算定

(1) 総費用総便益比の総括

(単位：千円)

区 分	算定式	数値
総費用（現在価値化）	①＝②＋③	9,762,204
当該事業による費用	②	5,673,931
関連事業による費用、資産価額、維持管理費	③	4,088,273
評価期間（当該事業の工事期間＋50年）	④	60年
社会的割引率		4%
総便益額（現在価値化）	⑤	251,756,443
総費用総便益比	⑥＝⑤÷①	25.78

(2) 総費用の総括

(単位：千円)

区分	施設名 (又は工種)	資 産 価 額 (事業着工時点) ①	当該事業 に よ る 費 用 ②	関 連 事 業 に よ る 費 用 ③	維持管理費 ④	資 産 価 額 (評価期間 終了時点) ⑤	総費用 ⑥＝ ①＋②＋③ ＋④－⑤
当該事業	衣浦港海岸始め6海岸	-	5,673,931	-	246,645	365,473	5,555,103
	小 計	-	5,673,931	-	246,645	365,473	5,555,103
その他	一色漁港海岸外連携事業	-	-	3,792,178	697,805	282,882	4,207,101
	小 計	-	-	3,792,178	697,805	282,882	4,207,101
	合 計	-	5,673,931	3,792,178	944,450	648,355	9,762,204

(3) 年総効果額の総括

(単位：千円)

区分 効果項目	年 総 効 果 (便 益) 額	効 果 の 要 因
農業の持続的発展に関する効果	90,727	
災害防止効果（農業関係資産）	90,727	海岸保全施設整備を実施した場合と実施しなかった場合での災害による農業資産に係る被害額が軽減する効果
農村の振興に関する効果	4,617,301	
災害防止効果（一般資産）	4,617,301	海岸保全施設整備を実施した場合と実施しなかった場合での災害による一般資産に係る被害額が軽減する効果
多面的機能の発揮に関する効果	8,474,454	
災害防止効果（公共資産）	8,474,454	海岸保全施設整備を実施した場合と実施しなかった場合での災害による公共資産に係る被害額が軽減する効果
合 計	13,182,482	

(4) 総便益額算出表－1

評価 期間	年度	割引率 (1 + 割引 率) ^t	経 過 年 (t)	災害防止効果 (農業関係資産)						備考	
				更 新 分 に 係 る 効 果 年 効 果 額	新設及び機能向上分 に 係 る 効 果			計			
					(千円) ②	(千円) ③	効 果 発 生 割 合 (%) ④	年 効 果 額 生 合 (千円) ⑤=③×④	年 効 果 額 (千円) ⑥=②+⑤		同 割 引 左 後 (千円) ⑦=⑥÷①
1	H31	0.7903	-6	-	-	-	-	-	-	着工年	
2	R2	0.8219	-5	-	-	-	-	-	-		
3	R3	0.8548	-4	-	-	-	-	-	-		
4	R4	0.8890	-3	-	-	-	-	-	-		
5	R5	0.9246	-2	-	-	-	-	-	-		
6	R6	0.9615	-1	-	-	-	-	-	-		
7	R7	1.0000	0	-	-	-	-	-	-	評価年	
8	R8	1.0400	1	-	-	-	-	-	-		
9	R9	1.0816	2	-	-	-	-	-	-		
10	R10	1.1249	3	-	-	-	-	-	-	完了年	
11	R11	1.1699	4	90,727	-	-	-	90,727	77,551		
12	R12	1.2167	5	90,727	-	-	-	90,727	74,568		
13	R13	1.2653	6	90,727	-	-	-	90,727	71,704		
14	R14	1.3159	7	90,727	-	-	-	90,727	68,947		
15	R15	1.3686	8	90,727	-	-	-	90,727	66,292		
16	R16	1.4233	9	90,727	-	-	-	90,727	63,744		
17	R17	1.4802	10	90,727	-	-	-	90,727	61,294		
18	R18	1.5395	11	90,727	-	-	-	90,727	58,933		
19	R19	1.6010	12	90,727	-	-	-	90,727	56,669		
20	R20	1.6651	13	90,727	-	-	-	90,727	54,487		
21	R21	1.7317	14	90,727	-	-	-	90,727	52,392		
22	R22	1.8009	15	90,727	-	-	-	90,727	50,379		
23	R23	1.8730	16	90,727	-	-	-	90,727	48,439		
24	R24	1.9479	17	90,727	-	-	-	90,727	46,577		
25	R25	2.0258	18	90,727	-	-	-	90,727	44,786		
26	R26	2.1068	19	90,727	-	-	-	90,727	43,064		
27	R27	2.1911	20	90,727	-	-	-	90,727	41,407		
28	R28	2.2788	21	90,727	-	-	-	90,727	39,813		
29	R29	2.3699	22	90,727	-	-	-	90,727	38,283		
30	R30	2.4647	23	90,727	-	-	-	90,727	36,811		
31	R31	2.5633	24	90,727	-	-	-	90,727	35,395		
32	R32	2.6658	25	90,727	-	-	-	90,727	34,034		
33	R33	2.7725	26	90,727	-	-	-	90,727	32,724		
34	R34	2.8834	27	90,727	-	-	-	90,727	31,465		
35	R35	2.9987	28	90,727	-	-	-	90,727	30,255		
36	R36	3.1187	29	90,727	-	-	-	90,727	29,091		
37	R37	3.2434	30	90,727	-	-	-	90,727	27,973		
38	R38	3.3731	31	90,727	-	-	-	90,727	26,897		
39	R39	3.5081	32	90,727	-	-	-	90,727	25,862		
40	R40	3.6484	33	90,727	-	-	-	90,727	24,868		
41	R41	3.7943	34	90,727	-	-	-	90,727	23,911		
42	R42	3.9461	35	90,727	-	-	-	90,727	22,992		
43	R43	4.1039	36	90,727	-	-	-	90,727	22,108		
44	R44	4.2681	37	90,727	-	-	-	90,727	21,257		
45	R45	4.4388	38	90,727	-	-	-	90,727	20,440		
46	R46	4.6164	39	90,727	-	-	-	90,727	19,653		
47	R47	4.8010	40	90,727	-	-	-	90,727	18,898		
48	R48	4.9931	41	90,727	-	-	-	90,727	18,170		
49	R49	5.1928	42	90,727	-	-	-	90,727	17,472		
50	R50	5.4005	43	90,727	-	-	-	90,727	16,800		
51	R51	5.6165	44	90,727	-	-	-	90,727	16,154		
52	R52	5.8412	45	90,727	-	-	-	90,727	15,532		
53	R53	6.0748	46	90,727	-	-	-	90,727	14,935		
54	R54	6.3178	47	90,727	-	-	-	90,727	14,361		
55	R55	6.5705	48	90,727	-	-	-	90,727	13,808		
56	R56	6.8333	49	90,727	-	-	-	90,727	13,277		
57	R57	7.1067	50	90,727	-	-	-	90,727	13,037		
58	R58	7.3910	51	90,727	-	-	-	90,727	12,546		
59	R59	7.6866	52	90,727	-	-	-	90,727	12,074		
60	R60	7.9941	53	90,727	-	-	-	90,727	11,620		
合計 (総便益額)									1,733,749		

※経過年は評価年からの年数。

※小数点以下を四捨五入していることから、記載値は計算結果と合わない場合がある。

(4) 総便益額算出表－2

評価 期間	年度	割引率 (1 + 割引 率) ^t ①	経 過 年 (t)	災害防止効果 (公共土木施設)						備考
				更 新 分 に 係 る 効 果 年 効 果 額 (千円) ②	新設及び機能向上分 に 係 る 効 果 年 効 果 額 効 果 発 生 年 効 果 額 (千円) (%) ③ ④ ⑤=③×④			計 同 割 引 左 後 (千円) ⑦=⑥÷①		
					(千円) ③	効 果 発 生 割 (%) ④	年 効 果 額 (千円) ⑤=③×④	年 効 果 額 (千円) ⑥=②+⑤	同 割 引 (千円) ⑦=⑥÷①	
1	H31	0.7903	-6	-	-	-	-	-	-	着工年
2	R2	0.8219	-5	-	-	-	-	-	-	
3	R3	0.8548	-4	-	-	-	-	-	-	
4	R4	0.8890	-3	-	-	-	-	-	-	
5	R5	0.9246	-2	-	-	-	-	-	-	
6	R6	0.9615	-1	-	-	-	-	-	-	
7	R7	1.0000	0	-	-	-	-	-	-	評価年
8	R8	1.0400	1	-	-	-	-	-	-	
9	R9	1.0816	2	-	-	-	-	-	-	
10	R10	1.1249	3	-	-	-	-	-	-	完了年
11	R11	1.1699	4	8,474,454	-	-	-	8,474,454	7,243,742	
12	R12	1.2167	5	8,474,454	-	-	-	8,474,454	6,965,114	
13	R13	1.2653	6	8,474,454	-	-	-	8,474,454	6,697,585	
14	R14	1.3159	7	8,474,454	-	-	-	8,474,454	6,440,044	
15	R15	1.3686	8	8,474,454	-	-	-	8,474,454	6,192,060	
16	R16	1.4233	9	8,474,454	-	-	-	8,474,454	5,954,088	
17	R17	1.4802	10	8,474,454	-	-	-	8,474,454	5,725,209	
18	R18	1.5395	11	8,474,454	-	-	-	8,474,454	5,504,679	
19	R19	1.6010	12	8,474,454	-	-	-	8,474,454	5,293,225	
20	R20	1.6651	13	8,474,454	-	-	-	8,474,454	5,089,456	
21	R21	1.7317	14	8,474,454	-	-	-	8,474,454	4,893,719	
22	R22	1.8009	15	8,474,454	-	-	-	8,474,454	4,705,677	
23	R23	1.8730	16	8,474,454	-	-	-	8,474,454	4,524,535	
24	R24	1.9479	17	8,474,454	-	-	-	8,474,454	4,350,559	
25	R25	2.0258	18	8,474,454	-	-	-	8,474,454	4,183,263	
26	R26	2.1068	19	8,474,454	-	-	-	8,474,454	4,022,429	
27	R27	2.1911	20	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,867,671	
28	R28	2.2788	21	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,718,823	
29	R29	2.3699	22	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,575,870	
30	R30	2.4647	23	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,438,331	
31	R31	2.5633	24	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,306,072	
32	R32	2.6658	25	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,178,953	
33	R33	2.7725	26	8,474,454	-	-	-	8,474,454	3,056,611	
34	R34	2.8834	27	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,939,049	
35	R35	2.9987	28	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,826,043	
36	R36	3.1187	29	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,717,303	
37	R37	3.2434	30	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,612,830	
38	R38	3.3731	31	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,512,364	
39	R39	3.5081	32	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,415,682	
40	R40	3.6484	33	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,322,786	
41	R41	3.7943	34	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,233,470	
42	R42	3.9461	35	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,147,552	
43	R43	4.1039	36	8,474,454	-	-	-	8,474,454	2,064,976	
44	R44	4.2681	37	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,985,533	
45	R45	4.4388	38	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,909,177	
46	R46	4.6164	39	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,835,728	
47	R47	4.8010	40	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,765,144	
48	R48	4.9931	41	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,697,233	
49	R49	5.1928	42	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,631,962	
50	R50	5.4005	43	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,569,198	
51	R51	5.6165	44	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,508,850	
52	R52	5.8412	45	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,450,807	
53	R53	6.0748	46	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,395,018	
54	R54	6.3178	47	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,341,362	
55	R55	6.5705	48	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,289,773	
56	R56	6.8333	49	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,240,170	
57	R57	7.1067	50	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,192,731	
58	R58	7.3910	51	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,146,862	
59	R59	7.6866	52	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,102,768	
60	R60	7.9941	53	8,474,454	-	-	-	8,474,454	1,060,360	
合計 (総便益額)									161,842,446	

※経過年は評価年からの年数。

※小数点以下を四捨五入していることから、記載値は計算結果と合わない場合がある。

(4) 総便益額算出表－3

評価 期間	年度	割引率 (1 + 割引 率) ^t ①	経 過 年 (t)	災害防止効果（一般資産）						備考
				更 新 分 に 係 る 効 果 年 効 果 額 (千円) ②	新設及び機能向上分 に 係 る 効 果 年 効 果 額 効 果 発 生 合 (千円) (%) ③ ④			計		
					年 効 果 額 (千円) ⑤=③×④	年 効 果 額 (千円) ⑥=②+⑤	同 割 (千円) ⑦=⑥÷①	左 後		
1	H31	0.7903	-6	-	-	-	-	-	-	着工年
2	R2	0.8219	-5	-	-	-	-	-	-	
3	R3	0.8548	-4	-	-	-	-	-	-	
4	R4	0.8890	-3	-	-	-	-	-	-	
5	R5	0.9246	-2	-	-	-	-	-	-	
6	R6	0.9615	-1	-	-	-	-	-	-	
7	R7	1.0000	0	-	-	-	-	-	-	評価年
8	R8	1.0400	1	-	-	-	-	-	-	
9	R9	1.0816	2	-	-	-	-	-	-	
10	R10	1.1249	3	-	-	-	-	-	-	
11	R11	1.1699	4	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,946,748	
12	R12	1.2167	5	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,794,938	
13	R13	1.2653	6	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,649,175	
14	R14	1.3159	7	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,508,854	
15	R15	1.3686	8	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,373,740	
16	R16	1.4233	9	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,244,081	
17	R17	1.4802	10	4,617,301	-	-	-	4,617,301	3,119,376	
18	R18	1.5395	11	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,999,221	
19	R19	1.6010	12	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,884,011	
20	R20	1.6651	13	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,772,987	
21	R21	1.7317	14	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,666,340	
22	R22	1.8009	15	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,563,885	
23	R23	1.8730	16	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,465,190	
24	R24	1.9479	17	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,370,399	
25	R25	2.0258	18	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,279,248	
26	R26	2.1068	19	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,191,618	
27	R27	2.1911	20	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,107,298	
28	R28	2.2788	21	4,617,301	-	-	-	4,617,301	2,026,198	
29	R29	2.3699	22	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,948,310	
30	R30	2.4647	23	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,873,372	
31	R31	2.5633	24	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,801,311	
32	R32	2.6658	25	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,732,051	
33	R33	2.7725	26	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,665,393	
34	R34	2.8834	27	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,601,339	
35	R35	2.9987	28	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,539,768	
36	R36	3.1187	29	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,480,521	
37	R37	3.2434	30	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,423,599	
38	R38	3.3731	31	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,368,860	
39	R39	3.5081	32	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,316,183	
40	R40	3.6484	33	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,265,569	
41	R41	3.7943	34	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,216,905	
42	R42	3.9461	35	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,170,092	
43	R43	4.1039	36	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,125,101	
44	R44	4.2681	37	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,081,816	
45	R45	4.4388	38	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,040,214	
46	R46	4.6164	39	4,617,301	-	-	-	4,617,301	1,000,195	
47	R47	4.8010	40	4,617,301	-	-	-	4,617,301	961,737	
48	R48	4.9931	41	4,617,301	-	-	-	4,617,301	924,736	
49	R49	5.1928	42	4,617,301	-	-	-	4,617,301	889,174	
50	R50	5.4005	43	4,617,301	-	-	-	4,617,301	854,977	
51	R51	5.6165	44	4,617,301	-	-	-	4,617,301	822,096	
52	R52	5.8412	45	4,617,301	-	-	-	4,617,301	790,471	
53	R53	6.0748	46	4,617,301	-	-	-	4,617,301	760,075	
54	R54	6.3178	47	4,617,301	-	-	-	4,617,301	730,840	
55	R55	6.5705	48	4,617,301	-	-	-	4,617,301	702,732	
56	R56	6.8333	49	4,617,301	-	-	-	4,617,301	675,706	
57	R57	7.1067	50	4,617,301	-	-	-	4,617,301	649,982	
58	R58	7.3910	51	4,617,301	-	-	-	4,617,301	624,990	
59	R59	7.6866	52	4,617,301	-	-	-	4,617,301	600,966	
60	R60	7.9941	53	4,617,301	-	-	-	4,617,301	577,860	
合計（総便益額）									88,180,248	

※経過年は評価年からの年数。

※小数点以下を四捨五入していることから、記載値は計算結果と合わない場合がある。

2 年効果額の算定

(3) 災害防止効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、高潮・波浪等による浸水の発生に伴う農作物等の被害が防止又は軽減される効果を算定した。

○対象資産

農作物、農地、農業用施設、農漁家、公共資産、一般資産

○効果算定式

年効果額＝事業なかりせば年被害（想定）額－事業ありせば年被害（想定）額

○年効果額の算定

対象資産項目	事業なかりせば年被害額 ①	現況年被害額 ②	事業ありせば年被害額 ③	年効果額 (更新整備) ④=①-②	年効果額 (新設整備) ⑤=②-③	年効果額 合計 ⑥=④+⑤
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
農 業 関 係 資 産	90,727	-	-	90,727	-	90,727
農 作 物 被 害	10,224	-	-	10,224	-	10,224
農 地 被 害	56,497	-	-	56,497	-	56,497
農 業 用 施 設 被 害	15,170	-	-	15,170	-	15,170
農 漁 家 被 害	8,836	-	-	8,836	-	8,836
公 共 資 産	8,474,454	-	-	8,474,454	-	8,474,454
公 共 土 木 施 設 被 害	8,474,454	-	-	8,474,454	-	8,474,454
一 般 資 産	4,617,301	-	-	4,617,301	-	4,617,301
一 般 資 産 被 害	4,617,301	-	-	4,617,301	-	4,617,301
新 設					-	-
更 新				13,182,482		13,182,482
合 計						13,182,482

・事業なかりせば年被害額（①）：

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に、確率年毎に高潮・波浪による越波量等に基づき背後地の浸水量を算定し、事業なかりせば想定される年被害額を推定した。

・現況年被害額（②）：

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に、確率年毎に高潮・波浪による越波量等に基づき背後地の浸水量を算定し、現況で想定される年被害額を推定した。

・事業ありせば年被害額（③）：

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に、確率年毎に高潮・波浪による越波量等に基づき背後地の浸水量を算定し、事業ありせば想定される年被害額を推定した。

・年平均被害額

今回のように耐震対策事業での一回の地震で堤防施設が崩壊することを想定する場合、確率年のような事は想定できないため、年被害額として50年間供用する中で1回相当する年平均被害額として1/50で整理した。

3 評価に使用した資料

【共通】

- ・農林水産省農村振興局整備部（監修）[改訂版]「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大成出版社（平成27年9月5日第2版第1刷発行）
- ・「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」（平成19年3月28日付け18農振第1597号農林水産省農村振興局企画部長通知（最終改正：令和7年4月2日））
- ・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年3月28日付け18農振第1598号農林水産省農村振興局企画部長通知（令和7年4月1日一部改正））
- ・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（令和7年4月1日付け農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

【費用】

- ・当該事業費に係る一般に公表されていない諸元については、愛知県農林基盤局農地部農地整備課調べ

【便益】

- ・農林水産省農村振興局・水産庁、国土交通省河川局・港湾局（令和6年2月一部変更）「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」
- ・国土交通省水管理・国土保全局（令和6年4月改正）「治水経済調査マニュアル（案）」
- ・国土交通省水管理・国土保全局河川計画課（令和6年6月改正）「治水経済調査マニュアル(案)各種資産評価単価及びデフレーター」
- ・農林水産統計年報（平成30年～令和4年）
- ・上記以外の効果算定に必要な各種諸元については、愛知県農林基盤局農地部農地整備課調べ
