

国営道前平野土地改良事業
再評価基礎資料（案）

令和8年7月

中国四国農政局 道前平野農地整備事業所

目 次


1. 事業概要	1
1.1 地域の概要	1
1.2 事業目的	1
1.3 関係市	4
1.4 受益面積	4
1.5 関係戸数	4
1.6 主要作物	4
1.7 主要工事計画	6
1.8 総事業費	7
1.9 工期	7
1.10 予定負担区分	7
2. 事業の進捗状況	8
2.1 主要工事の進捗状況	8
2.2 総事業費の執行状況	8
2.3 工事施工状況	9
2.4 営農状況	11
3. 関連事業の進捗状況	17
3.1 採択状況	17
3.2 総事業費ベースの進捗状況	17
4. 社会経済情勢の変化	18
4.1 人口・世帯数の推移	18
4.2 産業別就業人口の推移	19
4.3 経営耕地面積の推移	21
4.4 農家数の推移	23
4.5 主要作物別作付面積の推移	36
4.6 参考資料	39
5. 事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無	47
5.1 事業の施行に係る地域	47
5.2 主要工事計画の変更	47
5.3 総事業費の増減	47
6. 費用対効果分析の基礎となる要因の変化	49
6.1 県、市の農業振興の方向	49
6.2 費用対効果分析の基礎となる要因の変化	51
6.3 費用対効果分析の中で定量的に捉えられない効果	54
7. 環境との調和への配慮	56
7.1 環境検討委員会、情報協議会の設置	56

7.2	国営道前平野地区環境配慮推進協議会の設置.....	56
7.3	生態系への配慮.....	57
7.4	景観への配慮.....	63
7.5	環境配慮図	64
8.	事業コスト縮減の可能性.....	65
8.1	流用土の採用.....	65
8.2	工事発生土仮置場費用の削減	65
9.	関係団体の意見	67

1. 事業概要

1.1 地域の概要

道前平野地区は、愛媛県東予地方の西部に位置し、行政区は西条市である。本地区は、東は二級河川中山川水系中山川に、西は堂ヶ森に、北は瀬戸内海に、南は石鎚山に接しており、温暖な気候の下、農村景観を有している。

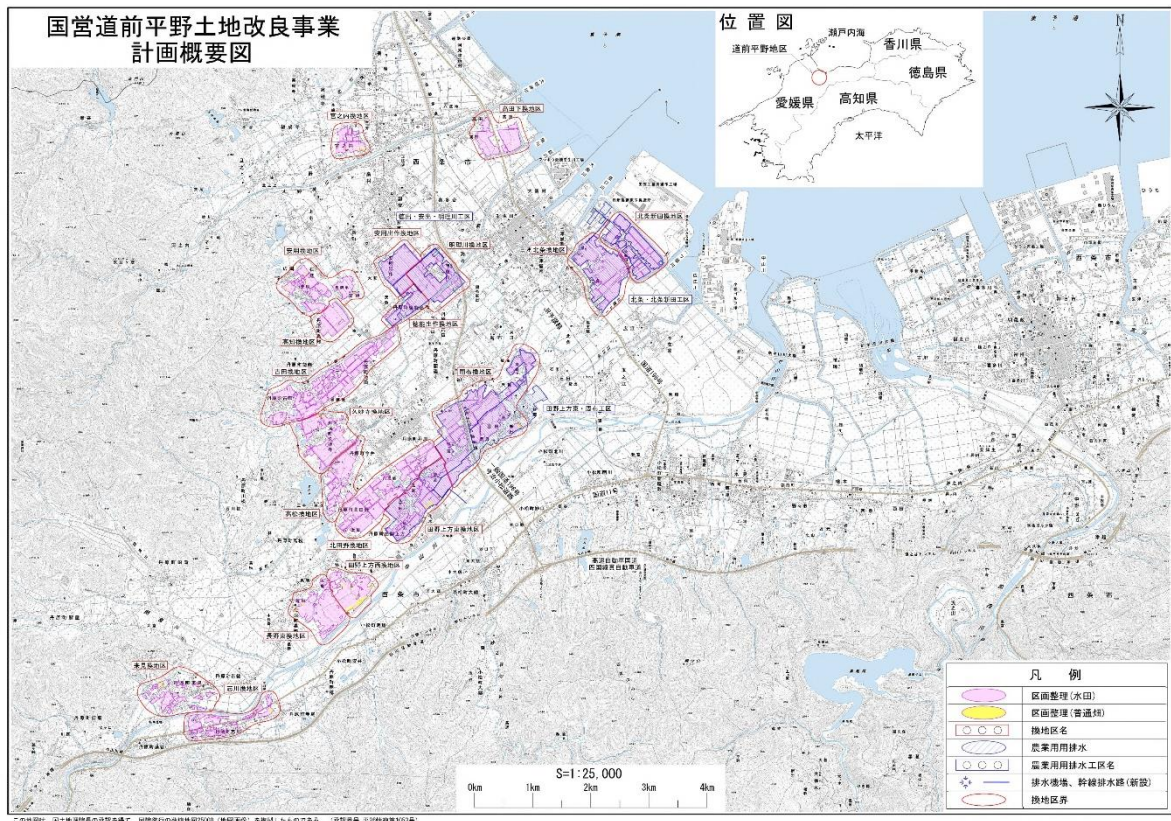

国営道前平野土地改良事業「道前平野地区」概要図

1.2 事業目的

本地区は、瀬戸内海に面した愛媛県西条市に位置し、国営道前道後平野土地改良事業(平成元年度～平成25年度)等で整備されたかんがい用水を用いて、水稻、はだか麦、野菜類等、多様な農作物が栽培される農業地帯である。

本地区は、水田区画の多くが狭小であり、また、耕作道路は狭く効率的な農作業が行えない状況であるとともに、地区内河川の中・下流周辺では、降雨時に慢性的な湛水が発生しているほか、後継者不足、農業従事者の高齢化等により、耕作放棄地が増加するおそれがある。

このため、本事業では、区画整理及び農業用排水を一体的に施行し、耕作放棄地を含めた農地の土地利用を計画的に再編し、担い手への農地の利用集積を進め、併せて湛水被害を解消することにより、緊急的に生産性の向上と耕作放棄地の解消・発生防止による優良農地の確保を図り、農業

の振興を基幹とした総合的な地域の活性化に資することを目的としている。

整備前と整備後



北条団地（区画整備前）



北条団地（区画整備後）



明理川団地（区画整備前）



明理川団地（区画整備後）



久妙寺団地（区画整備前）



久妙寺団地（区画整備後）

整備前と整備後



田野上方東・周布工区
中山川排水樋門（農業用排水施設整備前）



田野上方東・周布工区
中山川排水樋門（農業用排水施設整備後）



徳出・安出・明理川工区
1号幹線排水路（農業用排水施設整備前）



徳出・安出・明理川工区
1号幹線排水路（農業用排水施設整備後）



北条・北条新田工区
2号幹線排水路（農業用排水施設整備前）



北条・北条新田工区
2号幹線排水路（農業用排水施設整備後）

1.3 関係市

愛媛県西条市

1.4 受益面積

区画整理 654ha（水田 643ha、普通畑 11ha）

農業用排水 323ha（水田 321ha、普通畑 2ha）

1.5 関係戸数

区画整理 : 関係戸数 1,760 戸

農業用排水 : 関係戸数 786 戸

1.6 主要作物

水稻、飼料用米、大豆、さといも、夏秋きゅうり、アスパラガス、いちご、はだか麦、
ブロッコリー

主要作物の作付け状況



水稻



大豆



さといも



夏秋きゅうり



アスパラガス



いちご



はだか麦



ブロッコリー

1.7 主要工事計画

1.7.1 区画整理

(1) 区画整理

工区名	面積 (ha)	整地工		表土扱い		備 考
		標準区画	土量 (m ³)	面積 (ha)	土量 (m ³)	
周布、北条、北条新田、明理川、高田下、安用、安用出作、宮之内、徳能出作、高知、古田、久妙寺、高松、北田野、田野上方東、田野上方西、長野東、来見、志川	459	0.5ha (100m×50m)	862,700	439	658,500	水田
	184	0.3ha (100m×30m)	433,600	168	252,000	
小 計	643		1,296,300	607	910,500	
周布、安用、宮之内、古田、久妙寺、田野上方東、田野上方西、来見、志川	5	0.5ha (100m×50m)	9,800	5	7,500	普通畑
	6	0.3ha (100m×30m)	12,900	6	9,000	
小 計	11		22,700	11	16,500	
合 計	654		1,319,000	618	927,000	

(2) 末端用水路等

項 目 区 分	数 量	規 模	構 造	備 考
末 端 用 水 路 (パイプライン)	71.7km	かんがい面積 530ha 0.01～0.09m ³ /s	硬質塩化ビニル管 φ75～φ300	
末 端 用 水 路 (開水路)	18.4km	かんがい面積 124ha 0.01～0.07m ³ /s	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF250～BF500	

(3) 末端排水路等

項 目 区 分	数 量	規 模	構 造	備 考
支 線 排 水 路	63.7km	0.01～4.07m ³ /s	鉄筋コンクリート角フリューム KF250～KF500 鉄筋コンクリート組立柵渠 B650×H400～B1800×H600	
支 線 用 排 水 路	2.0km	0.03～0.09m ³ /s	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF250～BF550	末端排水路と兼用

(4) 暗渠排水

項 目 区 分	面積 (ha)	集 水 渠				吸 水 渠						集水渠出口以下の 排水施設			備 考
	事業名														
	区画 整理	勾 配	管種	管 径 (mm)	延長 (m/ha)	勾 配	管種	管 径 (mm)	深さ (m)	間隔 (m)	延長 (m/ha)	名称	構 造	数量 (m/ha)	
周布、 北条、 北条新田、 明理川、 高田下、 安用、 安用出作、 徳能出作、 高知、 古田、 久妙寺、 北田野、 田野上方東	381	1/500	硬質 塩化 ビニ ル管	75 100	114	1/500	陶管	75	0.7	7.5	1,372	末端 排水 路	鉄筋コ ンクリ ート角 フリュ ーム	101	
計	381														

1.7.2 農業用排水

(1) 排水機

項目 名称	位置	排水量 (m³/s)	揚程(m)		排水機			原動機			備考
			全揚程	実揚程	型式	口径 (mm)	台数 (台)	型式	動力 (kW)	台数 (台)	
北条新田排水機場	愛媛県西条市北条	7.3	4.1	3.5	斜流	1,000	3	発動機	139	3	

(2) 排水路

項目 水路名	受益面積 (ha)	排水量 (m³/s)	延長(km)			構造	勾配	主要構造物	備考
			開きよ	トンネル その他	計				
田野上方東・周布工区幹線排水路	164	20.4	3.0	1.2	4.2	コンクリート二次製品	1/200	河川放流工 2箇所 合流工 1箇所 分水工 3箇所	
徳出・安出・明理川工区幹線排水路	72	4.0	1.8	0.6	2.4	コンクリート二次製品	1/250	河川放流工 1箇所 分水工 1箇所	
北条・北条新田工区幹線排水路	87	6.0	0.9	0.3	1.2	コンクリート二次製品	1/1,300	—	
計	323	30.4	5.7	2.1	7.8				

1.8 総事業費

総事業費：34,100 百万円（令和 8 年度ベース、物価や労賃の変動等含む）

区画整理：24,377 百万円

農業用排水：9,723 百万円

（参考）計画変更時点

総事業費：26,041 百万円（計画変更時点）

区画整理：19,041 百万円

農業用排水：7,000 百万円

1.9 工期

平成 28 年度～令和 11 年度

1.10 予定負担区分

事業方式	事業	国庫負担	県負担	市町負担	農家負担
一般型	区画整理	66.67%	25.00%	3.33%	5.00%
	農業用排水	66.67%	25.00%	8.33%	—

2. 事業の進捗状況

2.1 主要工事の進捗状況

主要工事の進捗率は下表のとおりである。

工種	事業量（計画）	令和7年度まで	進捗率 （事業費ベース）
区画整理	654ha	245ha	51.8%
農業用排水	1 か所	1 か所	71.3%
	7.8km	4.6km	

注：令和7年度決算時点で整理。

2.2 総事業費の執行状況

（単位：百万円）

総事業費	令和7年度まで		令和8年度		令和8年度まで 進捗率	令和8年度 以降
	事業費	進捗率	前年度 繰り越し	当初予算		
34,100	19,545	57.3%	839	1,419	63.9%	12,297

注：事業費は令和7年度決算時点で整理、進捗率は事業費ベース。

2.3 工事施工状況

区画整理工事



明理川団地（区画整備前）H22 年
出典：国土地理院ウェブサイト



明理川団地（区画整備後）R5 年
出典：国土地理院ウェブサイト



久妙寺団地（区画整備前）H29 年 4 月



久妙寺団地（区画整備中）H29 年 12 月



久妙寺団地（区画整備中）H30 年 3 月



久妙寺団地（区画整備後）H31 年 3 月

農業用排水工事（排水路）



北条新田排水機場（工事着手前）R2年6月



北条新田排水機場（工事中）R7年5月



北条新田排水機場（工事後）R8年3月



徳出・安出・明理川工区
1号幹線排水路（工事着手前）H29年12月



徳出・安出・明理川工区
1号幹線排水路（工事中）R2年11月



徳出・安出・明理川工区
1号幹線排水路（工事中）R2年11月



徳出・安出・明理川工区
1号幹線排水路（工事後）R3年3月

2.4 営農状況

本地区では、水田が農地面積の9割以上を占めており、総じて稲作が盛んな地域である。一方で、飼料用米、大豆、はだか麦といった土地利用型作物や、露地野菜（さといも他）、施設野菜（いちご他）についても、農業生産法人を中心とした生産が行われている。

以下に、地区内の先進事例である農事組合法人及び個別経営体の活動概要等を示す。

2.4.1 先進事例

（1）農事組合法人 吉田

【経営概要】

主要作物：水稲（10.5ha）、はだか麦（42.5ha）、大豆（34.3ha）、加工用たまねぎ（4.2ha）、さといも（2.6ha） ※令和6年度（周桑農業協同組合への聞き取り結果）

所在地：愛媛県西条市

法人設立：平成27年9月9日

【活動の特徴】

1) 活動の概要

- ・「一集落一農場、公平・公正、農地を遊ばせない」をモットーに儲かる農業を目指す。
- ・吉田上生産組合設立当初から、組合長及び理事のみに負担をかけないよう、水稲、麦、大豆など品目ごとの栽培方針を定める栽培部長、地域の農地を数ブロックに分け、管理するブロック長、機械担当、会計担当、女性部など全員が役割を担うことで、運営、部門間の連携を図っている。
- ・一年を通じた作業の確保のため、収益性の高い里芋（H24）、加工用たまねぎ（H28）を導入した。さらにH30年からは施設アムスメロンを導入し、経営の安定化を図っている。
- ・H19年「美しい田んぼにやさしい笑顔」を目標に「環境保全会」を設立し、通学路を中心にひまわりを植え、景観形成活動を始め、地域住民の癒しの場になっている。



写真. 加工用たまねぎ収穫



写真. 通学路周辺にひまわり

【表彰経歴】平成29年度日本農業賞県知事賞

平成30年度西条市民表彰

【出典】愛媛県HP（集落営農法人・組織の優良事例）

（URL：<https://www.pref.ehime.jp/page/3817.html>）

2) 地域貢献活動

- ・通学路を中心とした観賞用ヒマワリを栽培している。

3) 経営多角化

- ・年間作業体系の構築、構成員の所得向上、女性が活躍できる場作りを目的に、平成 24 年度にさといも、平成 28 年度に加工用たまねぎを導入した。
- ・構成員 1 名当たりの所得は、さといもについては約 14.3 日の労働で約 137,000 円、加工用たまねぎについては約 10 日の労働で約 100,000 円である。

4) 女性部・青年部の設置

- ・女性の積極的な参加を促している。また、活動費を組織から助成し、活性化や意見集約を行っている。
- ・平成 27 年度から青年部を設置し、若手農業者の育成を行っている。

5) 雇用・研修生受け入れ

- ・継続的な農業経営を行っていくために周桑農業協同組合管内の農事組合法人では初めての取り組みとして 1 名雇用を行いました。
- ・農業大学生の研修受入を開始しました。



写真. さといも選別風景



写真. さといも畝立て風景

【出典】周桑農業協同組合企画開発課「集落営農の取り組みについて」（令和 6 年）

(2) 徳永氏

【経営概要】

経営形態：個別経営体（家族経営体）

経営規模：約 55ha（うち、本地区内は約 8ha） ※令和 7 年度

主要作物：水稲、はだか麦、大豆、たまねぎ ※令和 6 年度

所在地：愛媛県西条市

構成員：家族 3 名、アルバイト 1 名（うち、オペレーターは 3 名） ※令和 6 年度

【活動の概要】

1) 大型機械による高収益作物の生産

中畔（杭畦畔：座標で管理）を取り除いて 50a 区画を 1ha 区画に変えた圃場を 6～7 筆耕作しており、1ha 区画の圃場で大型機械を使用してたまねぎを生産している。また、いろいろな作物を試行し、どの作物が 1 番良いかを検討している。

2) 作業受託

レーザーレベラーを保有しており、他農家の均平作業を受託している。

3) スマート農業の取組

防除用ドローン、GPS 付直進アシスト農機を導入している。また、本事業にて自動給水栓を設置しており、スマートフォンで水管理を行っている。

【将来展望】

1) 乾田直播

2～3 年前から乾田直播に取り組み、試行錯誤している。これにより、作業の分散化が可能となる。

2) 法人の立ち上げ

将来的には独自法人を立ち上げることも視野に入れている。

GPSスマートアシスト機能付きトラクター（100馬力超）のほか、田植え機、コンバイン等の大型機械を活用

法人化を視野に、ICT化を進め効率化を図りながらさらに経営規模を拡大する意向

大型機械導入の効果を高めるために
農地の大区画化、集約化を望んでいる

H26 R4 R15目標

13ha → 37ha 60ha

農業所得が約3倍に増加 稼ぐ農業を実現



写真. たまねぎ栽培



写真. 乾田直播

【出典】徳永氏聞き取り調査記録

2.4.2 作付状況

本地区では、水田が農地面積の9割以上を占めており、総じて稲作（435ha）が盛んな地域である。一方で、飼料用米（5ha）、大豆（48ha）、はだか麦（174ha）といった土地利用型作物や、露地野菜（さといも他 39ha）、施設野菜（いちご他 20ha）についても、農業生産法人を中心とした生産が行われている。

表 2.1 本地区における土地利用計画（再評価時点）

地 目		田					畑					計				
時 点		現 況		計 画		増 減	現 況		計 画		増 減	現 況		計 画		増 減
本地面積		(ha) 680		(ha) 632		(ha) △ 48	(ha) 11		(ha) 11		(ha) -	(ha) 691		(ha) 643		(ha) △ 48
作期	作物名	作付 面積	作付 率	作付 面積	作付 率	作付 面積	作付 面積	作付 率	作付 面積	作付 率	作付 面積	作付 面積	作付 率	作付 面積	作付 率	作付 面積
表作 (春夏)	水稲	(ha) 435	(%) 64.0	(ha) 418	(%) 66.1	(ha) △ 17	(ha) -	(%) -	(ha) -	(%) -	(ha) -	(ha) 435	(%) 63.0	(ha) 418	(%) 65.0	(ha) △ 17
	飼料用米	5	0.7	36	5.7	31	-	-	-	-	-	5	0.7	36	5.6	31
	大豆	48	7.1	96	15.2	48	-	-	-	-	-	48	6.9	96	14.9	48
	さといも	8	1.2	19	3.0	11	5	45.5	5	45.5	-	13	1.9	24	3.7	11
	夏秋きゅうり	9	1.3	16	2.5	7	6	54.5	6	54.5	-	15	2.2	22	3.4	7
	アスパラガス (建べい率考慮)	7 (6)	1.0	15 (13)	2.4	8	-	-	-	-	-	7 (6)	1.0	15 (13)	2.3	8
	いちご (建べい率考慮)	16 (14)	2.4	32 (28)	5.1	16	-	-	-	-	-	16 (14)	2.3	32 (28)	5.0	16
	小計	528	77.7	632	100.0	104	11	100.0	11	100.0	-	539	78.0	643	99.9	104
	不作付地	152		-			-		-			152		-		
計	680	77.7	632	100.0	104	11	100.0	11	100.0	-	691	78.0	643	99.9	104	
裏作 (秋冬)	はだか麦	174	25.6	253	40.0	79	-	-	-	-	-	174	25.2	253	39.3	79
	ブロッコリー	11	1.6	12	1.9	1	-	-	-	-	-	11	1.6	12	1.9	1
	計	185	27.2	265	41.9	80	-	-	-	-	-	185	26.8	265	41.2	80
合計		713	104.9	897	141.9	184	11	100.0	11	100.0	-	724	104.8	908	141.1	184

※ 1. 現計画の土地利用計画における作付率に、再評価時点の本地面積を乗じて算定した。

※ 2. 上表は区画整理、農業用排水（農振白地含む）を含む地区全体の面積を示す。

※ 3. 作付面積、作付率の合計には不作付地（自己保全管理、調整水田、その他）を含まない。

2.4.3 農地集積状況

本地区の平成 26 年度における担い手への農地集積率は 40%であったが、令和 6 年度においては 64%であり、西条市の 58%、愛媛県の 40%、全国の 62%を上回っており、農地集積が進展している。また、計画値を超えている団地もある。

表 2.2 本地区における農地集積状況

(単位:ha)																		
区分	R6状況	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	計画
周布	実施中	耕地面積					95.2				98.6		98.6	98.6	96.4	96.4	96.4	91.0
		集積面積					65.0				60.2		79.7	79.6	80.5	82.7	89.1	84.4
		集積率					68.3%				61.0%		80.8%	80.7%	83.5%	85.7%	92.4%	92.7%
北条	工事完了R6	耕地面積					46.8				43.3		43.3	43.3	45.1	45.1	45.1	43.9
		集積面積					20.7				20.8		21.6	24.0	27.7	26.4	26.9	38.4
		集積率					44.2%				48.0%		49.9%	55.5%	61.4%	58.6%	59.7%	87.5%
北条新田	実施中	耕地面積					38.6				36.5		36.5	36.5	37.8	37.8	37.8	37.2
		集積面積					13.3				13.3		13.8	16.2	15.6	20.2	21.1	30.7
		集積率					34.5%				36.4%		37.8%	44.5%	41.2%	53.5%	55.8%	82.5%
明理川	工事完了R6	耕地面積					33.5				32.0		32.0	32.0	31.9	31.9	31.9	31.3
		集積面積					15.7				27.3		26.1	26.4	27.1	27.1	27.2	25.7
		集積率					46.9%				85.2%		81.5%	82.5%	85.1%	85.0%	85.2%	82.1%
高田下	未着手	耕地面積					25.4				25.4		25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	23.4
		集積面積					14.3				14.3		17.8	18.5	18.1	18.9	18.5	20.2
		集積率					56.3%				56.4%		70.2%	73.1%	71.3%	74.7%	73.0%	86.3%
安用	工事完了R6	耕地面積					31.4				31.0		31.0	31.0	30.0	30.0	30.0	27.9
		集積面積					7.6				7.7		8.7	9.1	9.8	10.9	11.2	22.4
		集積率					24.2%				24.8%		28.0%	29.4%	32.6%	36.4%	37.4%	80.3%
安用出作	工事完了R6	耕地面積					27.6				25.6		25.6	25.6	25.6	25.7	25.7	26.0
		集積面積					6.8				6.8		10.4	12.5	19.0	15.1	15.8	21.1
		集積率					24.6%				26.6%		40.7%	48.8%	74.3%	58.9%	61.6%	81.2%
宮之内	未着工	耕地面積					13.5				13.4		13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	12.6
		集積面積					1.8				1.8		2.0	2.0	6.9	10.7	11.7	10.7
		集積率					13.3%				13.4%		15.0%	15.0%	51.5%	80.4%	88.0%	84.9%
徳能出作	工事完了R6	耕地面積					15.6				16.3		16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	13.9
		集積面積					9.5				7.5		10.7	10.4	10.9	10.6	13.5	12.7
		集積率					60.9%				46.1%		65.7%	64.0%	66.6%	65.1%	83.0%	91.4%
高知	実施中	耕地面積					18.2				18.1		18.1	18.1	19.0	19.0	19.0	17.3
		集積面積					9.0				9.0		11.5	10.8	13.6	9.6	9.9	14.4
		集積率					49.5%				49.7%		63.5%	59.6%	71.8%	50.5%	52.1%	83.2%
古田	未着工	耕地面積					65.8				67.1		67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	62.4
		集積面積					30.1				29.9		37.9	40.1	38.5	39.4	39.4	49.9
		集積率					45.7%				44.5%		56.4%	59.8%	57.4%	58.8%	58.7%	80.0%
久妙寺	完了R4	耕地面積					35.1				32.4		32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	33.0
		集積面積					12.8				12.6		21.7	21.7	21.7	21.4	21.0	26.4
		集積率					36.5%				38.9%		67.0%	67.0%	67.0%	65.9%	64.7%	80.0%
高松	未着手	耕地面積					25.9				25.9		25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	24.0
		集積面積					6.9				7.2		13.7	12.9	10.1	13.2	11.6	19.2
		集積率					26.6%				27.8%		52.9%	49.6%	38.8%	50.8%	44.8%	80.0%
北田野	未着工	耕地面積					68.0				71.6		71.6	71.6	71.7	71.7	71.7	65.3
		集積面積					22.7				19.2		41.5	39.5	36.5	36.9	39.7	52.3
		集積率					33.4%				26.8%		57.9%	55.2%	50.9%	51.5%	55.4%	80.1%
田野上方東	実施中	耕地面積					52.1				52.5		52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	49.8
		集積面積					24.0				41.7		37.0	37.3	38.7	38.6	40.1	39.9
		集積率					46.1%				79.4%		70.4%	71.1%	73.7%	73.6%	76.4%	80.1%
田野上方西	未着工	耕地面積					26.3				25.7		25.7	25.7	27.5	27.5	27.5	24.9
		集積面積					8.2				8.3		9.2	9.4	10.6	12.9	15.1	20.0
		集積率					31.2%				32.3%		35.8%	36.6%	38.6%	46.8%	54.8%	80.3%
長野東	未着手	耕地面積					37.5				37.8		37.8	37.8	38.8	38.8	38.8	34.5
		集積面積					6.9				6.1		9.6	8.9	23.3	25.3	21.5	27.7
		集積率					18.4%				16.2%		25.4%	23.6%	60.1%	65.2%	55.5%	80.3%
来見	未着手	耕地面積					15.6				14.5		14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	13.0
		集積面積					1.5				4.8		5.4	5.4	4.4	4.4	5.3	10.5
		集積率					9.6%				33.0%		37.2%	37.0%	30.5%	30.5%	36.5%	80.8%
志川	未着工	耕地面積					20.0				20.5		20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	18.3
		集積面積					1.6				1.6		4.4	3.5	3.3	3.3	3.1	14.7
		集積率					8.0%				7.8%		21.4%	17.0%	16.1%	16.0%	15.2%	80.3%
計		耕地面積					692.1				688.3		688.3	688.3	691.5	691.6	691.6	649.7
		集積面積					278.4				300.1		382.6	388.4	416.2	427.6	441.7	541.3
		集積率					40.2%				43.6%		55.6%	56.4%	60.2%	61.8%	63.9%	83.3%
西条市		集積率	29.6%	22.6%	34.7%	32.5%	35.2%	39.7%	41.8%	47.4%	47.0%	52.3%	53.8%	53.5%	54.8%	59.6%	57.9%	
愛媛県		集積率	37.4%	35.9%	33.0%	24.6%	25.8%	27.4%	28.4%	29.8%	30.8%	31.8%	33.6%	34.2%	35.9%	37.4%	39.8%	
全国		集積率	48.1%	47.9%	48.8%	48.7%	50.3%	52.3%	54.0%	55.2%	56.2%	57.1%	58.0%	58.9%	59.5%	60.4%	61.5%	

※ 1. 本地区は「事業所調べ」、西条市は「西条市調べ」、愛媛県及び全国は農林水産省 HP「担い手への農地集積の状況」

※ 2. 平成 26 年 3 月末の調査から、国の調査方法の変更に伴い、対象となる担い手の範囲が変更されている。

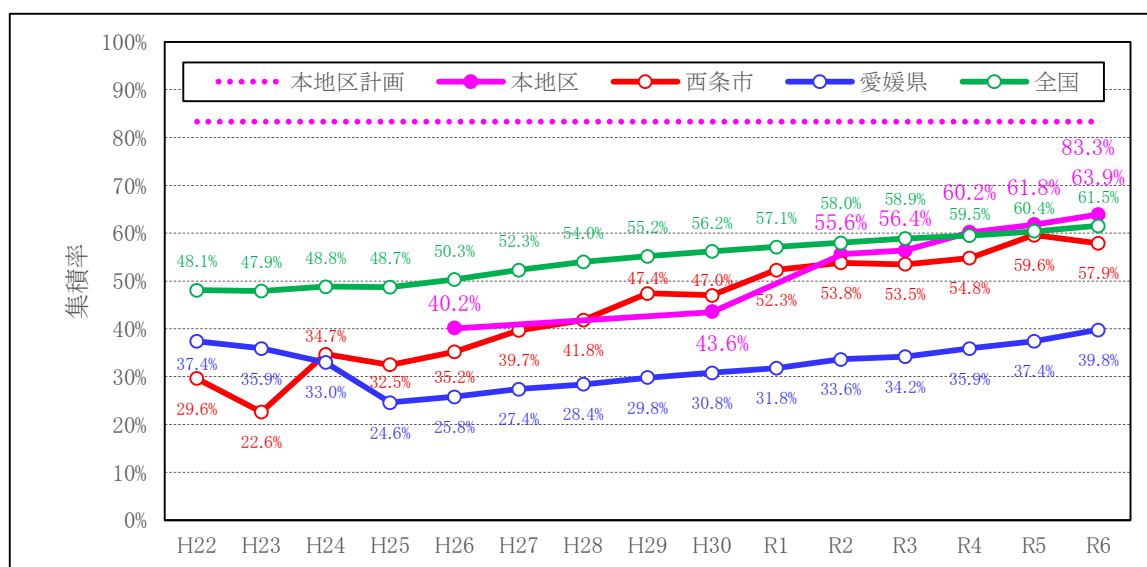


図 2.1 担い手への農地集積率の推移 (本地区、西条市、愛媛県、全国)

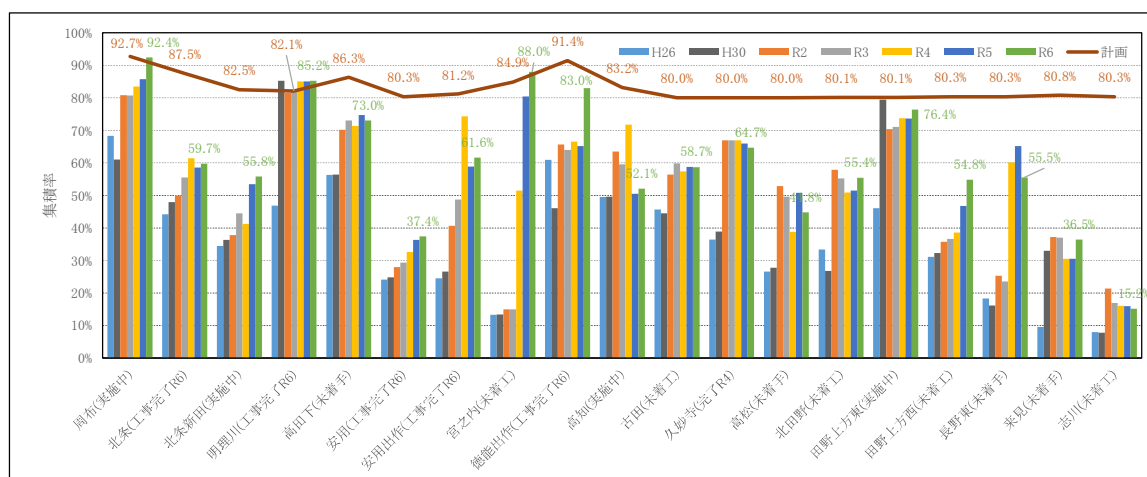


図 2.2 各団地の担い手への農地集積率の推移 (本地区)

2.4.4 地域のコミュニケーション

地域のコミュニケーションの状況について、東予土地改良協議会へ聞き取り調査を行った。新設したポンプ場の管理組合設立が結果的に地域のコミュニケーションを活性化させたという状況を確認した。

項目	内容
コミュニケーションの向上	① 本事業で造成された3つのポンプ場の管理は改良区ではなく、組合で規約をつくって管理することとした（北条団地と北条新田団地で組合を分けた）。これにより熱心に話し合っており、コミュニケーションが増えた。【東予改良区】
