

与良川通信

第13号



令和3年3月15日発行



工事名：栃木南部農業水利事業
与良川統合排水機場建設工事

発注者：農林水産省 関東農政局

受注者：前田建設工業株式会社

事務所：〒329-0222
栃木県小山市上生井606-1
(TEL) 0282-68-1081 (FAX) 0282-67-2600

「安全」「環境」「品質」を最優先して作業を行ってまいります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、何卒宜しくお願いします。
ご意見、ご感想がありましたら、お気軽にお声掛けください。

令和3年2月末現在
工事進捗率：42.5%

文責=鈴木



はじめに



2月は機場本体にてBF躯体の築造を、右岸側では西部自然排水樋門の築造と東西サイホンの埋戻しを行いました。
3月、4月は機場本体の1F躯体築造と、右岸側で堤防および道路の復旧を行います。

連節ブロック・底版コンクリート

3月に入り右岸側では堤防の拡幅掘削から連節ブロックの据付けを行っています。
連節ブロックの据付けにより、堤防は最終形になります。
また同時に河床コンを打設したのち、5月末には仮締切を撤去し河道に通水します。



連節ブロック



河床コンクリート打設

連節ブロック設置箇所



機場本体部の工事

機場本体部は4/8に1階スラブコンクリートを打設します。これにより機場本体部の土木躯体ができ上がり、このあと5月からは建築の鉄骨建方工事が始まります。
吐出し水槽部の施工も始まっています。



吐出し水槽

機場本体部


与良川⇒

お知らせ

◆下記日程で大規模なコンクリート打設を行います。
当日はたいへんご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解 ご協力の程、よろしくお願いいたします。



4/8(火) 8:00~18:00 約210台

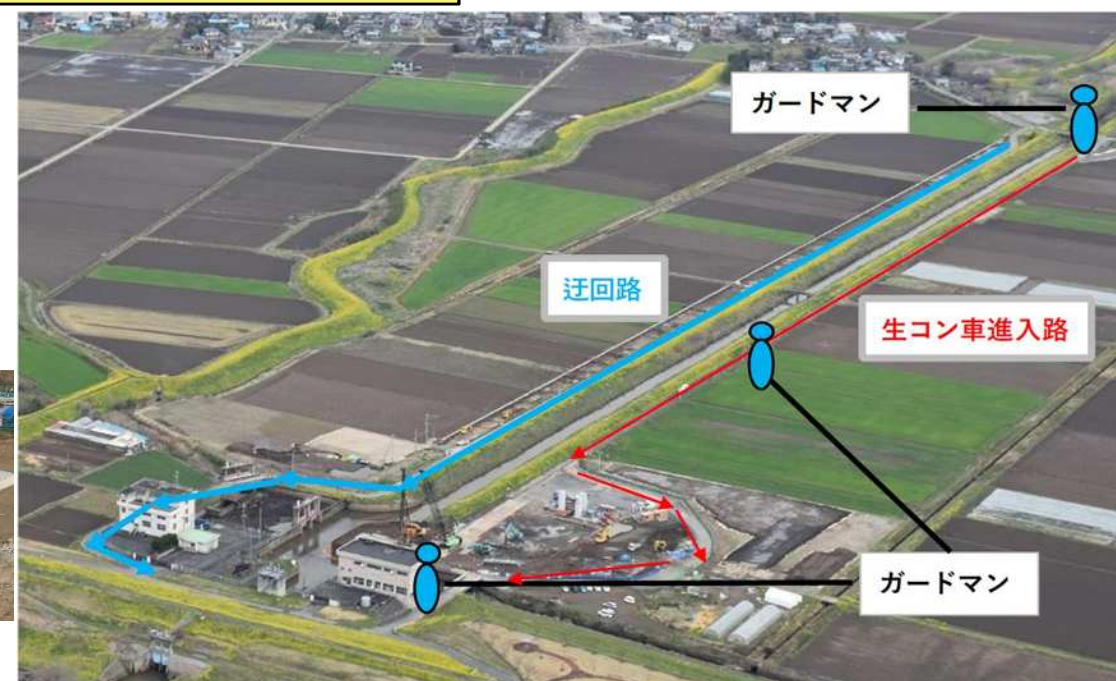

職員紹介



現場担当の鈴木諒です。
令和元年10月から現場担当を務めてまいりましたが、令和3年4月より東北支店に異動となります。
約1年6か月、地域の皆様の熱い声援とおいしいお米のおかげで心身ともに成長することができました。
私としては、最終竣工までいられないことを残念に思いますが、引き続き後輩の小笠原職員、鈴木凛太郎職員へのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
