


# ～羽鳥ダム直轄管理事業の紹介～

## 羽鳥ダム取水施設周辺の「土砂撤去」を行いました

- 令和6年8月21日（水曜日）から令和6年10月7日（月曜日）にかけて、羽鳥ダムの水位を低下させ、取水導水路周辺に堆積した土砂を撤去しました。
- 隈戸川へのかんがい取水は、ダムの水位が低下するとダム湖内にある水路で導水されますが、取水施設近くに土砂が堆積してしまい、ダム水位が下がった時の取水を阻害していました。
- 今回、土砂撤去を実施したことで**約133万m<sup>3</sup>（約4日分※）の取水容量が回復**しました。 ※毎秒3.5m<sup>3</sup>で取水した場合

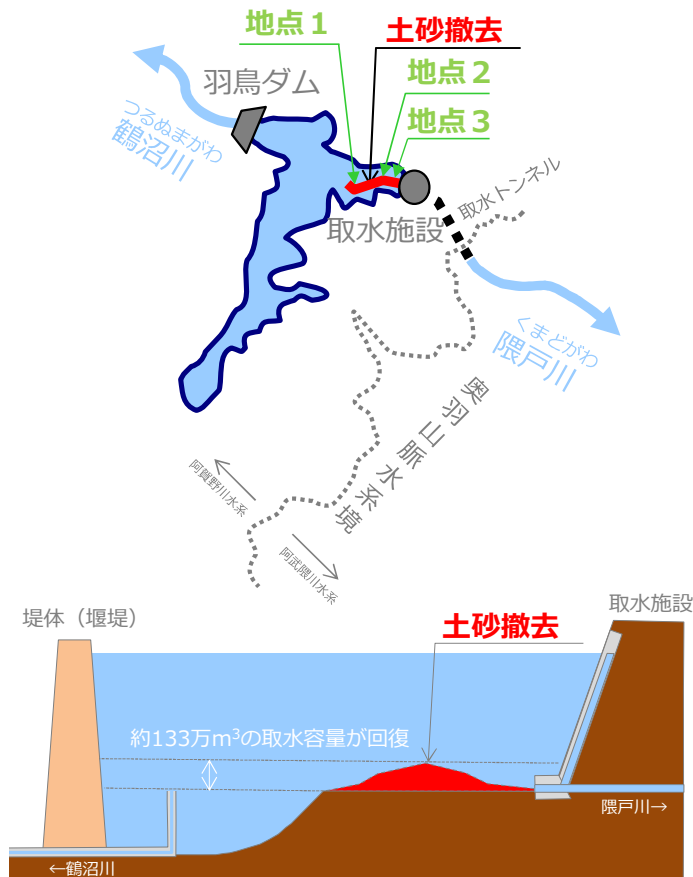

撤去前



撤去中



撤去後



POINT

土砂を撤去したことで、渇水で水位が低下した時でもかんがい用水が取水できます
