


<工事>

受注者名	工事名 (施工場所)	表彰理由
豊国工業 (株) 中四国支店	吉野川北岸二期農業水利事業 遠光他水位調整ゲート製作据付工事 (徳島県阿波市市場町大俣及び切幡地内)	<p>1. 本工事は、幹線用水路内の既設自動水位調整ゲートの改修を行うもの。用水は、通年通水されており、工事の実施可能期間「5日」と制約がある中、関連する土木工事と調整を図りながら、工程管理を行い、所定の出来形及び品質を満たすとともに、安全に工事を完了させた。</p> <p>2. 改修対象の自動水位調整ゲートは、幹線用水路脇のフロートで上流水位をほぼ一定に保持する仕組み。フロート室については、ゴミ等が入りフロートの動作に支障をきたさないようカバーが設置される。ここで、受注者は、フロート室内の状況を確認しやすくするため、フロート室カバー上部に点検口の設置を提案。また、維持管理中、現場ですぐにゲートの取扱いができるよう、「取扱説明書ダウンロード用QRコード」を現場施設に掲示するなど施設管理の低減につながる効果的な提案がなされた。</p> <p>以上のとおり、適切な工程管理、現況施設を把握し、維持管理を考えた積極的な提案がなされるなど、的確に工事を実施したことを高く評価。</p>
<p>概要</p> <p>本工事は、吉野川北岸二期農業水利事業計画に基づき、老朽化し不具合が生じた水位調整施設の更新を行うものである。</p> <p>(工事概要)</p> <p>(1) 遠光チェック工</p> <p>1) ゲート設備 1門 型式 ステンレス製自動水位調整ゲート 寸法 純径間2.700m、扉高2.700m</p> <p>2) 鋼製付属設備 1式</p> <p>(2) 市場チェック工</p> <p>1) ゲート設備 1門 型式 ステンレス製自動水位調整ゲート 寸法 純径間2.700m、扉高2.300m</p> <p>2) 鋼製付属設備 1式</p> <p>(工期)</p> <p>令和4年9月1日～令和5年3月29日</p> <p>(請負代金(最終(税込み)))</p> <p>118,030,000円</p>		

【施工状況等】

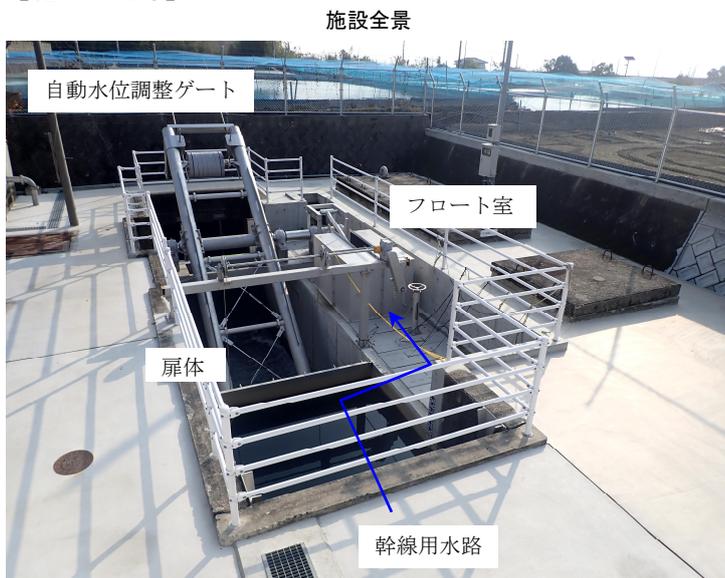

※青：流水方向

フロート室内部状況

上流

