

- ▶ 令和6年能登半島地震により、複数の地すべりブロックが滑動し、多数の亀裂や斜面崩壊が発生。
- ▶ 今後の地震、豪雨等に伴って、近隣の民家や国道等に被害を及ぼすことが懸念されたため、応急対策工事及び緊急に実施すべき地すべり防止対策工事について、石川県の要請を受け権限代行で実施。
- ▶ 令和6年9月豪雨では、不安定化していた斜面が崩落、工事用道路が被災し通行不可となったが、土砂の撤去や法面吹付等応急復旧工事を実施。
- ▶ 現在は、地下水を排除する集水井の設置工事等を実施中。

【直轄代行稲舟地区全景】



【被災状況（一部区間）】



【応急復旧】




工事用道路の被災状況



工事用道路の復旧状況

【本復旧（集水井イメージ図・写真）】

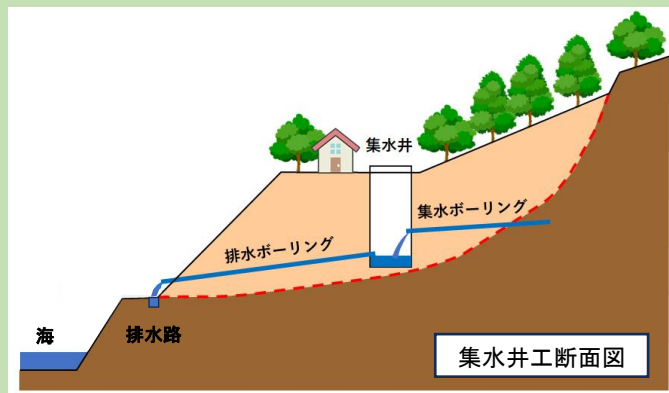

現在の復旧状況



地すべりブロックの地下水を排除するための集水井の設置(完成)

