


明治用水頭首工 応急対策

令和4年7月19日

【左岸側の工事】

漏水箇所の周囲を矢板や大型土のうで囲む工事

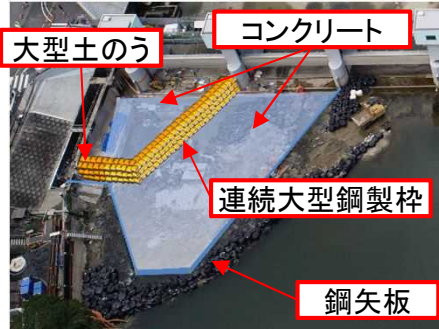

令和4年7月6日撮影

【右岸側の取水】

矢作川から自然取水とポンプにより注水

【右岸取水口】

自然取水とポンプの併用により取水



【旧安永川】

ポンプにより旧安永川に注水



【右岸側で実施した工事】

取水口付近の水位を上げるため、矢板や大型土のうを設置



明治用水頭首工 左岸応急対策

- 漏水の流入箇所の周囲を矢板や大型土のうで囲う工事を進めています。
- 矢板の設置後、できる限り流入箇所に水が流れ込まないようにするため、矢板の内側全体を土のう等で埋め、その上をコンクリートで覆います。
- その後、大型土のう等を設置します。

