国営・岸渡排水路 だより

～国営総合農地防災事業(庄川左岸地区)で
岸渡排水路を造成しています～

第⑲号

平成28年11月28日

発行元　北陸農政局庄川左岸農地防災事業所
岸渡排水路担当(関、長谷川、鶴来、鷲尾)
TEL　(0763)32－1210(代表)
http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/syogawa/

★平成28年度の岸渡排水路工事に着手

平成28年度の岸渡排水路工事の施工業者が決まり、工事に着手しました。工事期間は平成28年9月から平成29年3月までで、今年度の工事をもって岸渡排水路が全線完成します。

今年度も安全かつ円滑に工事を進めるために「岸渡排水路工事連絡協議会」を設立しました。協議会の定期会合は、月一回の開催を予定しています。

連絡協議会には、地元自治会、庄西用水・砺波市土地改良区、庄川左岸農地防災事業所及び施工業者（４社）が参加し、安全確保・事故防止・工程調整などの連絡や協議を行います。工事に関連するお問合せは、自治会の区長さんや地元土地改良区役員さんを通じて連絡協議会へお寄せください。

地域の皆さまには、工事による振動や騒音、道路の通行規制等でご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

○施工業者の紹介

【工事名】	【施工業者】	【工事車両プレート色】	【工事担当者】
(林工区)その９工事	アルカスコーポレーション(株)	(橙)	高田　裕久
(林工区)その10工事	砺波工業(株)	(黄)	安川　芳昭
(林工区)その11工事	中越興業(株)	(青)	越橋　学
ゲート設備工事	水機工業(株)		田中　太陽

○岸渡排水路(林工区)工事の内容

その９工事は、市道下に内径2.2ｍのコンクリート管を敷設する工事です 。その10工事は大型フリュームの敷設と、通常時は中村川へ、洪水時は岸渡排水路へ水の流れを切り替える分水場の工事です。その11工事は、岸渡排水路最上流部の工事で若林口用水路から岸渡川と中村川（岸渡排水路）に水を分ける分水場の工事です。

その9工事の施工状況

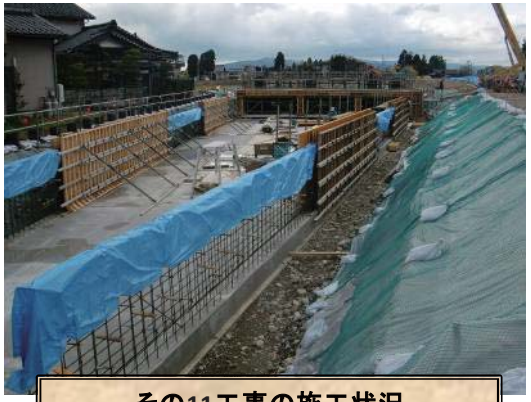

その11工事の施工状況

その10工事の施工状況

○岸渡洪水調整池の試験貯水を実施

岸渡洪水調整池において、10月24日から11月15日までの間、調整池に水を入れて三次池まで満水にして、施設（池法面や表面保護工の安定、ゲート施設の作動等）の確認を行いました。ご協力いただきありがとうございました。
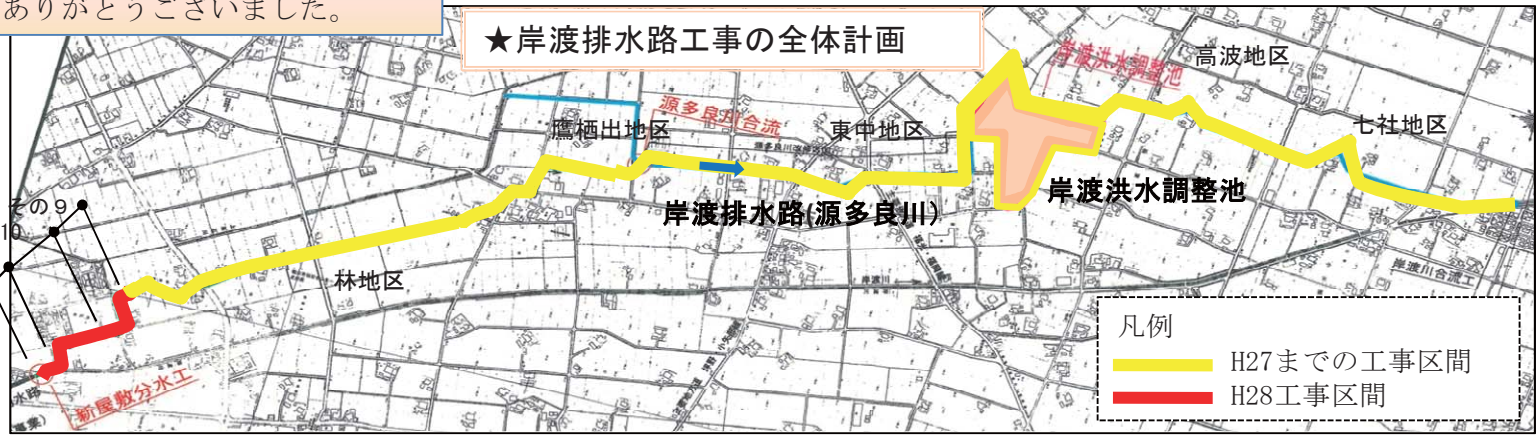
岸渡洪水調整池　満水時の状況
