与良川通信

第10号

令和2年12月14日発行

工事名：栃木南部農業水利事業
　　与良川統合排水機場建設工事
発注者：農林水産省 関東農政局
受注者：前田建設工業株式会社
事務所：〒329-0222
　　栃木県小山市上生井606-1

「安全」「環境」「品質」を最優先して作業を行ってまいります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、何卒宜しくお願いします。
ご意見、ご感想がありましたら、お気軽にお声掛けください。

令和2年11月末現在
工事進捗率：34.0％

文責=拝師

はじめに

第10号を発行いたします。
11月は排水機場本体部の地下壁と接続桝のコンクリート構築、右岸では与良川の半川締切り、地盤改良を行いました。
12月は本体部と接続桝の鉄筋コンクリート構築と、右岸側の施設工事を進めていきます。

本体部コンクリート打設

本体部では地下壁鉄筋の組立が進み、下図②までのコンクリート打設を11月9日に完了しました。
現在は壁鉄筋の組立を進めており、いよいよ地上付近まで組みあがってきました。12月16日と25日に下図③のコンクリートを打設します。

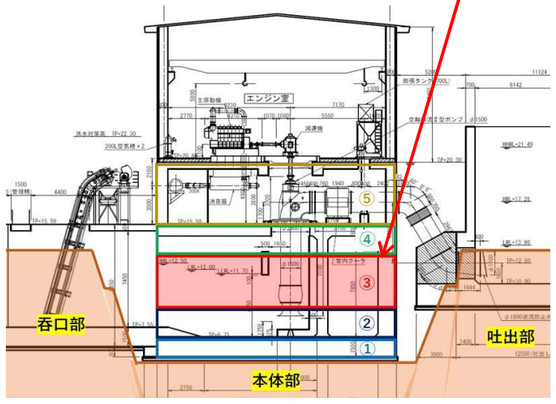

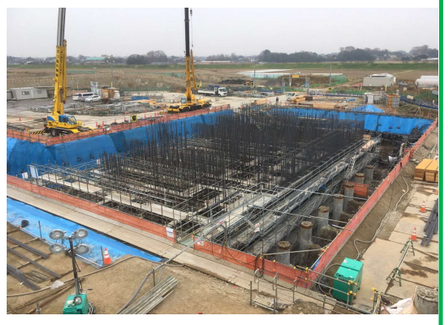

壁鉄筋組立状況（現在）

非出水期について

非出水期とは、11/1～5/31までの期間をさし、比較的河川の水量が少ないこの時期に河川内の工事を行います。一方で、6/1～10/31までは出水期といい梅雨や台風で河川が増水しやすいため河川内工事はストップします。

お知らせ

◆下記日程でコンクリートの打設を行う予定です。

12/16(水)　8:00～16:30　約 120 台
12/24(木)　8:00～16:30　約　60 台
12/25(金)　8:00～16:30　約 100 台

終日生コン車が往来し、ご迷惑をおかけいたします。
何卒よろしくお願いいたします。

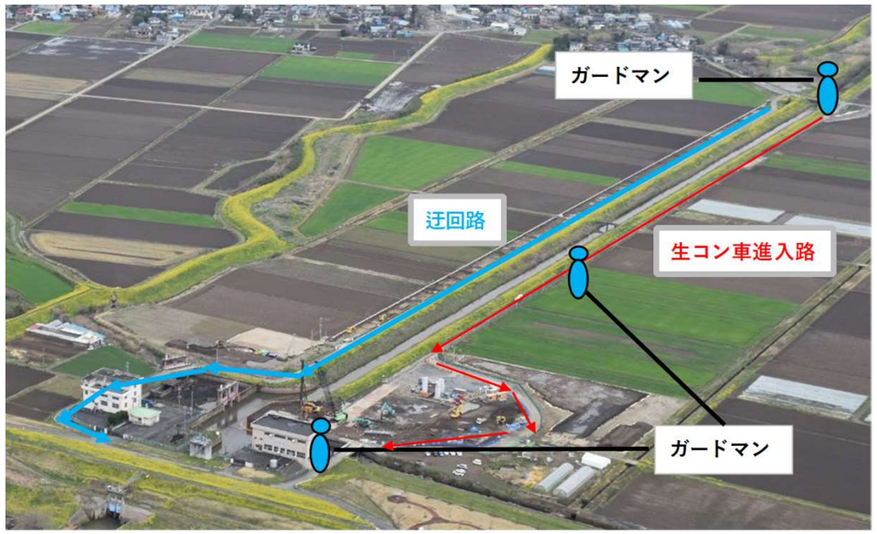

職員紹介

現場担当の拝師涼太です。
9月下旬よりこちらに着任し、第8号与良川通信を担当しました。構造物が目の前で出来上がっていくことにやりがいを感じながら日々頑張っています。
来年の1月末にはこちらを離れ、福井県のJR南福井作業所へ赴任いたします。残り約2か月間たくさんのことを学びたいです。それと同時に与良川統合排水機場が無事完成することを心より願っています。

所長より	この一年たいへんお世話になりました。 おかげさまで工事は順調に進んでおります。来年も引き続きご協力をお願い申し上げます。
