概　略　工　程　表

工事名：和歌山平野高地防災事業　藤崎井水路（波分排水路）建設工事

予定工期：　令和8年5月27日　～　令和10年3月6日　650　日間
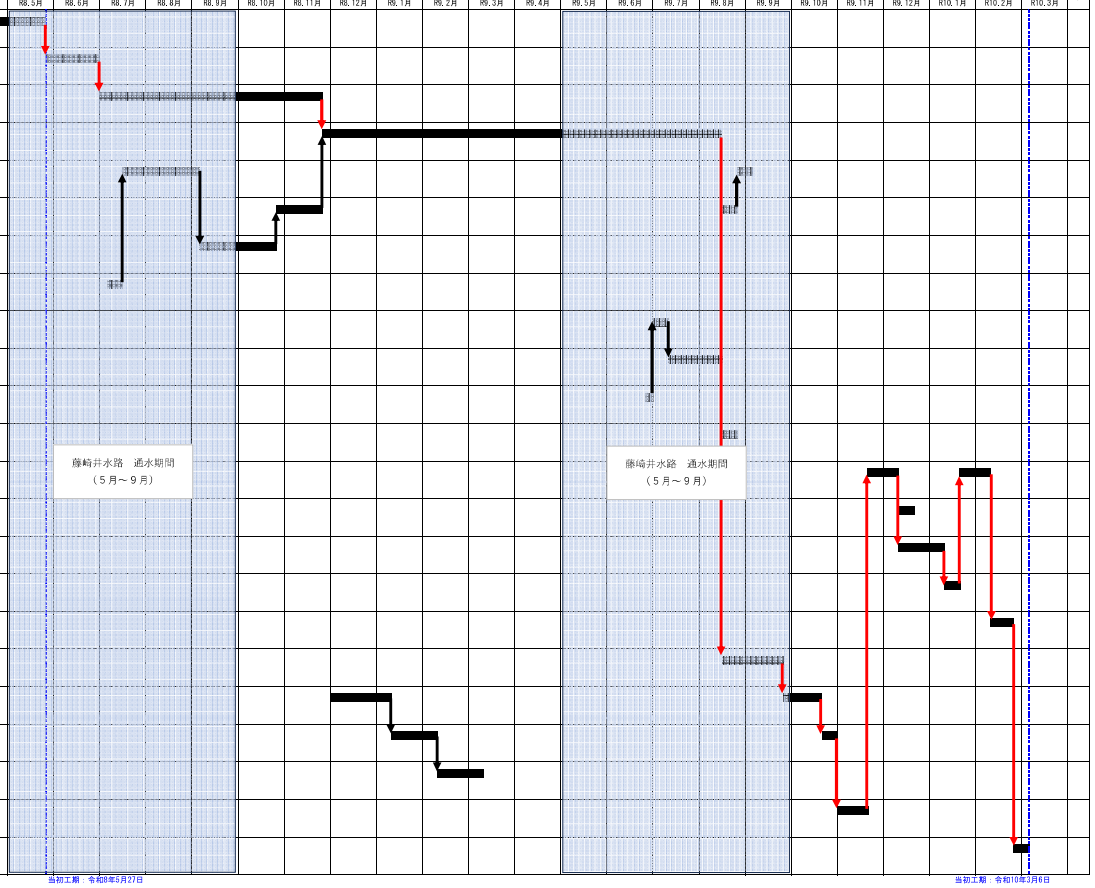
工種		細目	数量	単位	班編成	設計作業日数	備考
余裕期間			1	式		40	
準備工			1	式		30	
製作工			1	式		150	
推進工	推進工	泥濘式推進工	447	m	1	252	
推進工	発進基地	立坑土留工	1	式	1	60	
推進工	発進基地	立坑土工	1	式	1	40	
推進工	発進基地	地盤改良工	1	式	1	50	
推進工	発進基地	仮設工	1	式	1	10	
推進工	到達基地	立坑土留撤去工	1	式	1	10	
推進工	到達基地	地盤改良工	1	式	1	30	
推進工	到達基地	仮設工	1	式	1	5	
附帯工	分流工	接続水槽工	1	式	1	10	
附帯工	分流工	土工	1	式	1	40	
附帯工	分流工	分流水路工	1	式	1	10	
附帯工	分流工	分流工	1	式	1	30	
附帯工	分流工	擁壁工	1	式	1	10	
附帯工	分流工	場内整備工	1	式	1	15	
附帯工	放流工	接続水槽工	1	式	1	40	
附帯工	放流工	土工	1	式	1	65	
附帯工	放流工	接続水路工	1	式	1	40	
附帯工	放流工	擁壁工	1	式	1	30	
附帯工	放流工	場内整備工	1	式	1	20	
後片付け						15
