令和7年度　和歌山平野農地防災事業　名草排水路第3-3工区工事　　工程表

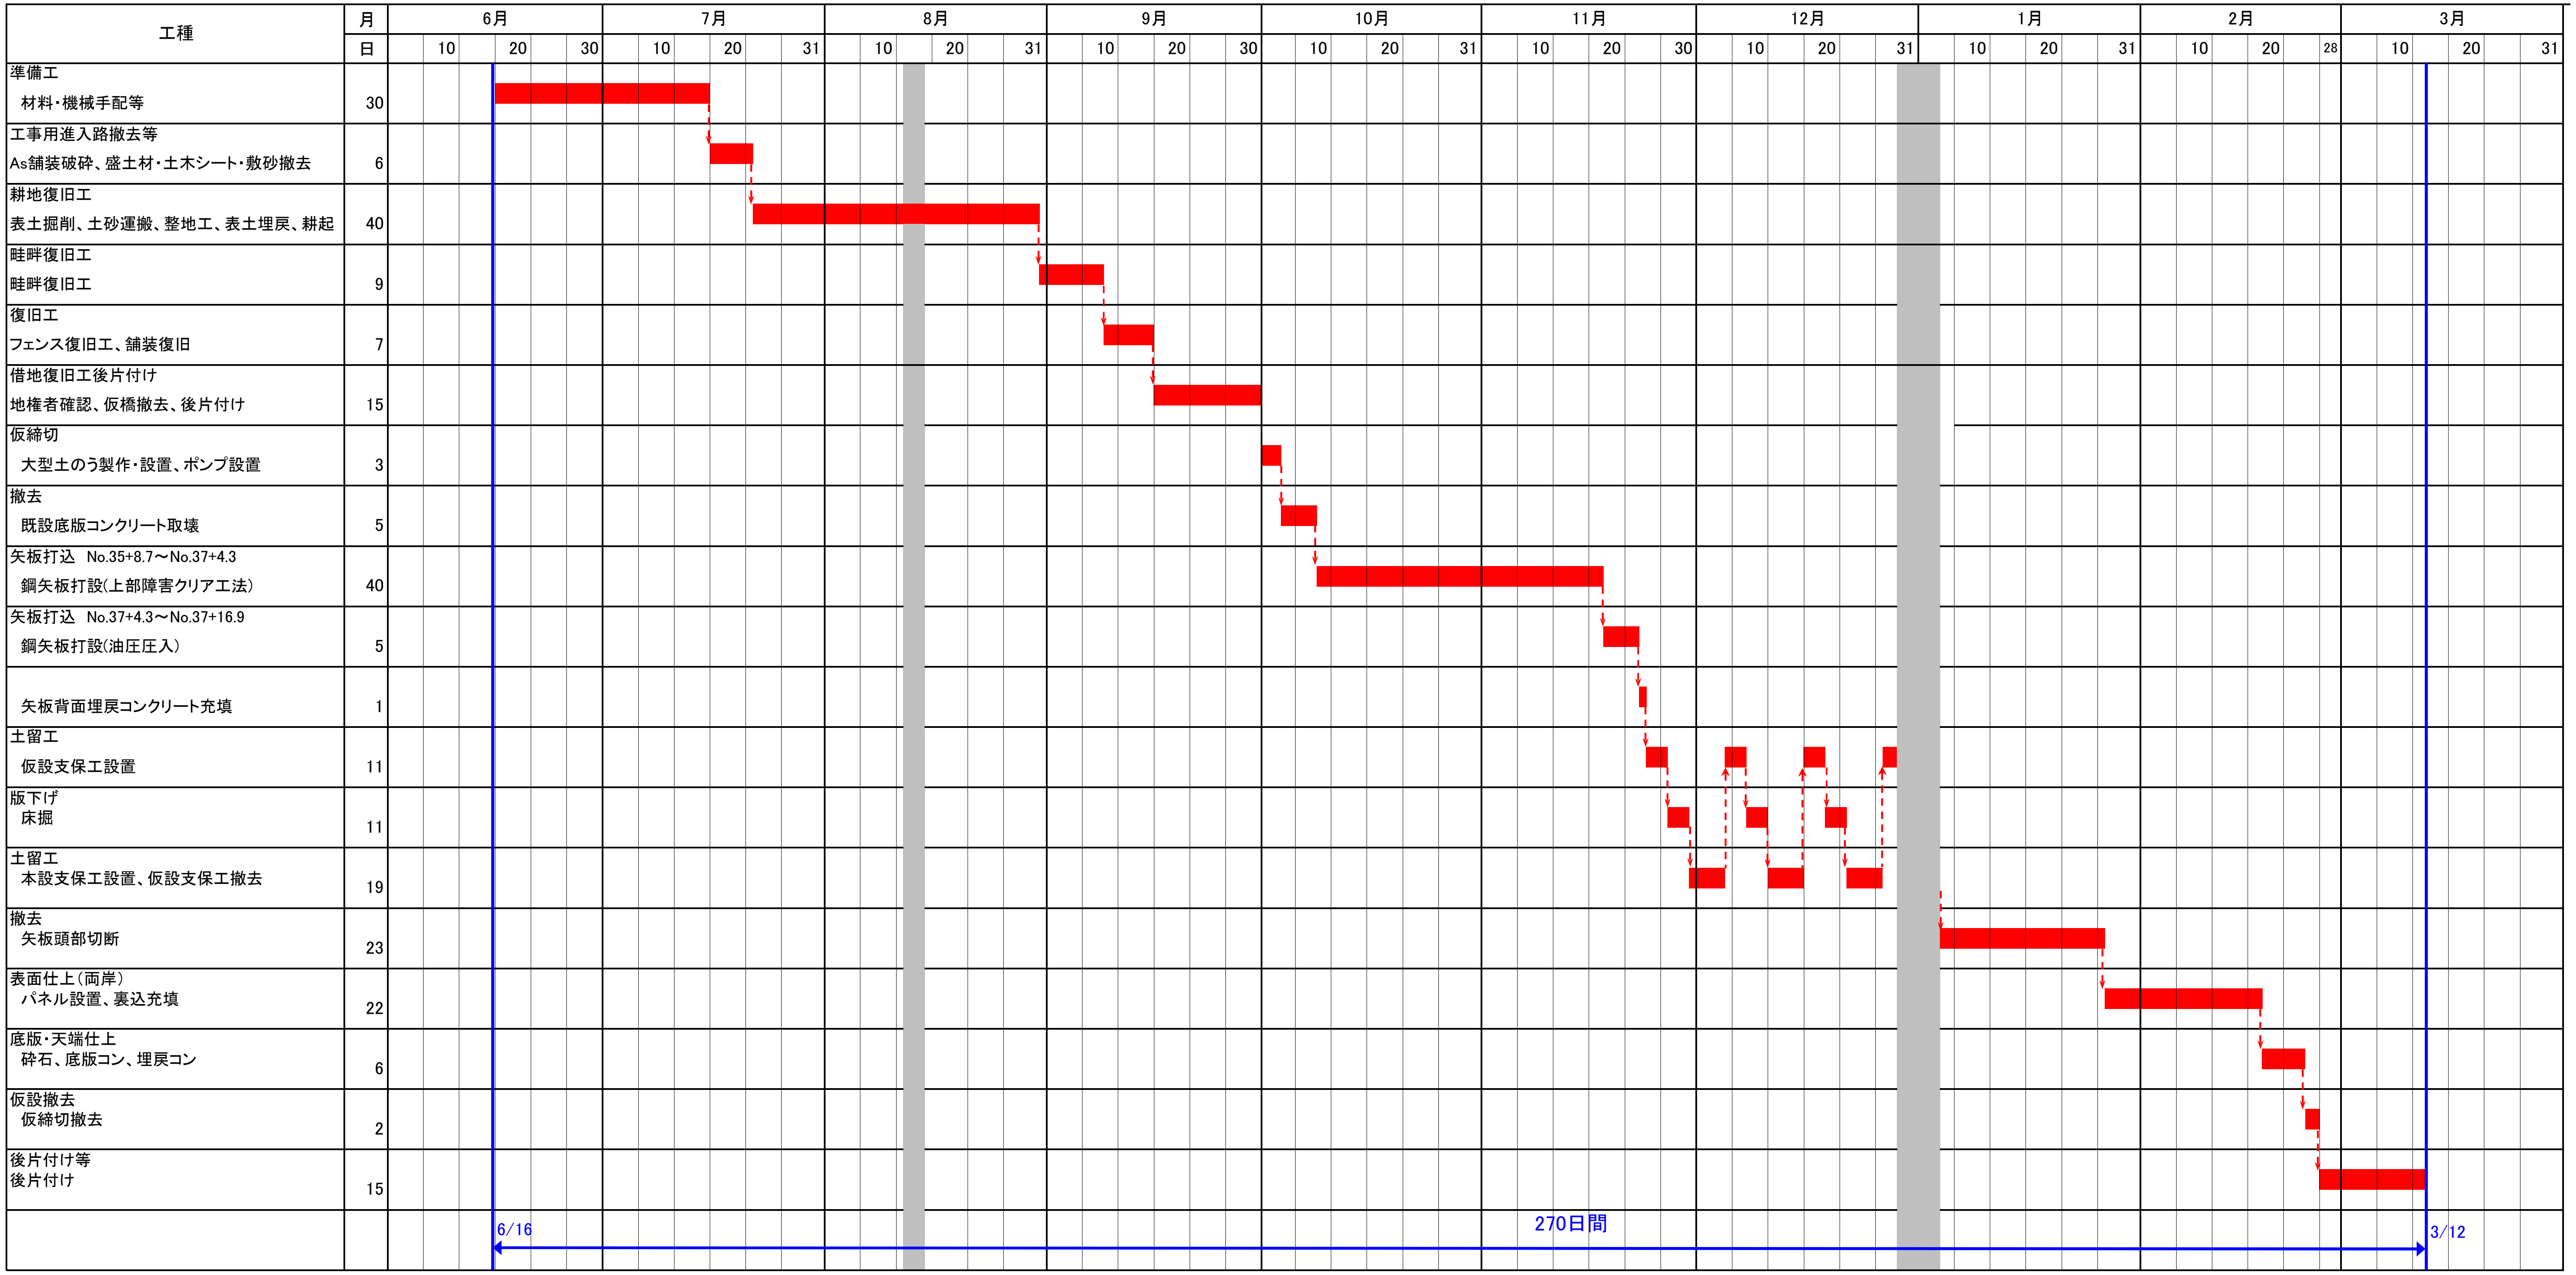

工種	日
準備工 材料・機械手配等	30
工事用進入路撤去等 As舗装破砕、盛土材・土木シート・敷砂撤去	6
耕地復旧工 表土掘削、土砂運搬、整地工、表土埋戻、耕起	40
畦畔復旧工 畦畔復旧工	9
復旧工 フェンス復旧工、舗装復旧	7
借地復旧工後片付け 地権者確認、仮橋撤去、後片付け	15
仮締切 大型土のう製作・設置、ポンプ設置	3
撤去 既設底版コンクリート取壊	5
矢板打込　No.35+8.7～No.37+4.3 鋼矢板打設(上部障害クリア工法)	40
矢板打込　No.37+4.3～No.37+16.9 鋼矢板打設(油圧圧入)	5
矢板背面埋戻コンクリート充填	1
土留工 仮設支保工設置	11
版下げ 床掘	11
土留工 本設支保工設置、仮設支保工撤去	19
撤去 矢板頭部切断	23
表面仕上(両岸) パネル設置、裏込充填	22
底版・天端仕上 砕石、底版コン、埋戻コン	6
仮設撤去 仮締切撤去	2
後片付け等 後片付け	15
