四箇井出島排水路(その2)工事　工程表

R8.6.16 ～　R9.3.12　　270日間
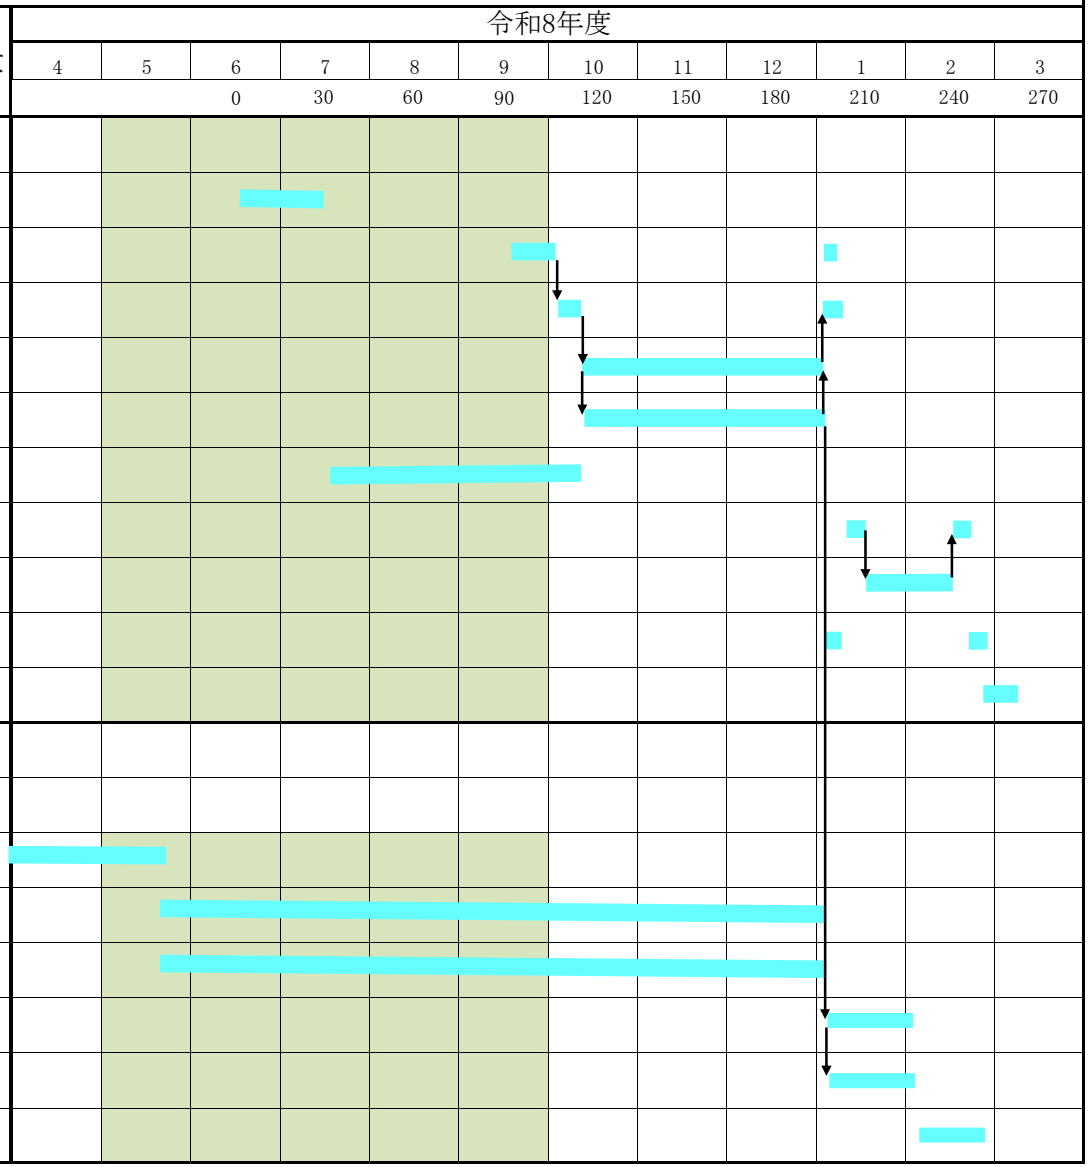
工　種	数量	単位	班編成	設計作業日数
【四箇井出島排水路(その2)工事】				
準備工				30
仮設工(仮廻し水路・迂回路・仮締切設置)	1	式	1	15
四箇井水路工・分流工土工	1	式	1	15
四箇井水路工躯体工	19.5	m	1	70
分流工躯体工	15.6	m	1	70
ボックスカルバート製作	1	式		90
分流水路工土工	1	式	1	15
分流水路工躯体工	21.0	m	1	30
仮設工撤去	1	式	1	15
後片付け	1	式	1	20
(参考:関連工事)				
【ゲート工事】				
準備・設計	1	式		
工場製作(機械設備)	1	式		
製品製作(電気設備)	1	式		
現場据付	1	式		
据付工(試運転・調整含む)	1	式		
後片付け	1	式
