

令和 7 年度～令和 9 年度

八郎潟農業水利事業

A 1－3 幹線用水路建設工事

現 場 説 明 書

東北農政局八郎潟農業水利事業所

1. 一般事項

別紙－1「一般事項」のとおり。

2. 入札の保証

別紙－2「入札の保証について」のとおり。

3. 契約の保証について

別紙－3「契約の保証について」のとおり。

4. 国庫債務負担行為契約事項

本工事は、国庫債務負担行為契約事項として、令和7年度から令和9年度までの3会計年度により施工するものである。

5. 特約事項

- (1) 各会計年度における請負代金額の支払限度額の割合及び出来高予定額の割合は、次のとおりとする。

年 度	支払限度額の割合	出来高予定額の割合
令和7年度	7.8%	19.6%
令和8年度	26.6%	41.8%
令和9年度	65.6%	38.6%

- (2) 令和7年度及び令和8年度にそれぞれ補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合は、下表①～③のように各会計年度の支払限度額の割合を変更し、契約を変更することにより、各会計年度における支払限度額を変更するものとする。ただし、下表は、追加で執行可能となった予算額により各年度の出来高予定額の9割まで措置された場合の割合であり、追加の予算額によっては、下表の割合と異なる場合がある。

年 度	支払限度額の割合		
	①令和7年度及び令和8年度に追加で予算の執行が可能となった場合	②令和7年度のみ追加で予算の執行が可能となった場合	③令和8年度のみ追加で予算の執行が可能となった場合
令和7年度	17.6%	17.6%	7.8%
令和8年度	37.6%	16.7%	47.5%
令和9年度	44.8%	65.7%	44.7%

6. 部分払及び中間前金払

(1) 部分払もしくは中間前金払のいずれかを選択し、工事請負契約書で約定するものとする。

(2) 工事請負契約書に規定する「部分払」の回数は、以下のとおりとする。

1) 中間前金払を選択しない場合

①支払条件

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和7年度	あり	なし	なし※
令和8年度	あり	なし	あり（1回）※ 令和7年度出来高に対する部分払
令和9年度	あり	なし	あり（2回）※ うち1回は令和8年度出来高に対する部分払

※ ただし、令和7年度及び令和8年度にそれぞれ補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合は、追加で執行が可能となった状況に応じて②から④の支払条件とし、契約を変更することにより各会計年度において部分払を請求できる回数を変更するものとする。

②支払条件（令和7年度及び令和8年度に追加で予算の執行が可能となった場合）

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和7年度	あり	なし	あり（2回）※ うち1回は年度末部分払
令和8年度	あり	なし	あり（2回）※ うち1回は年度末部分払
令和9年度	あり	なし	あり（1回）

※ ただし、支払請求は補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった時期以降にできるものとする。

③支払条件（令和７年度のみ追加で予算の執行が可能となった場合）

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和７年度	あり	なし	あり（２回）※ うち１回は年度末部分払
令和８年度	あり	なし	なし
令和９年度	あり	なし	あり（２回） うち１回は令和８年度出来高に対する部分払

※ ただし、支払請求は補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった時期以降にできるものとする。

④支払条件（令和８年度のみ追加で予算の執行が可能となった場合）

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和７年度	あり	なし	なし
令和８年度	あり	なし	あり（３回）※ うち１回は令和７年度出来高に対する部分払 うち１回は年度末部分払
令和９年度	あり	なし	あり（１回）

※ ただし、支払請求は補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった時期以降にできるものとする。

２）中間前金払を選択した場合

①支払条件

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和７年度	あり	なし※	なし※
令和８年度	あり	なし※	あり（１回）※ 令和７年度出来高に対する部分払
令和９年度	あり	あり	あり（１回）※ 令和８年度出来高に対する部分払

※ ただし、令和７年度及び令和８年度にそれぞれ補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合は、追加で執行が可能となった状況に応じて②から④の支払条件とし、契約を変更することにより各会計年度における中間前金払の有無及び部分払を請求できる回数を変更するものとする。

②支払条件（令和７年度及び令和８年度に追加で予算の執行が可能となった場合）

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和７年度	あり	あり※	あり（１回）※ 年度末部分払
令和８年度	あり	あり※	あり（１回）※ 年度末部分払
令和９年度	あり	あり	なし

※ ただし、支払請求は補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった時期以降にできるものとする。

③支払条件（令和７年度のみ追加で予算の執行が可能となった場合）

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和７年度	あり	あり※	あり（１回）※ 年度末部分払
令和８年度	あり	なし	なし
令和９年度	あり	あり	あり（１回） 令和８年度出来高に対する部分払

※ ただし、支払請求は補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった時期以降にできるものとする。

④支払条件（令和８年度のみ追加で予算の執行が可能となった場合）

年 度	前金払	中間前金払	部分払
令和７年度	あり	なし	なし
令和８年度	あり	あり※	あり（２回）※ うち１回は令和７年度出来高に対する部分払 うち１回は年度末部分払
令和９年度	あり	あり	なし

※ ただし、支払請求は補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった時期以降にできるものとする。

7. 施工年度の概要

本工事の出来高予定は、特約事項の範囲であるが、概ね下表の年度区分を目標に工事の進捗を図るものとする。

工 種	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
管体工		○	○
通気施設工		○	
排泥施設工		○	○
横断工		○	
小排水路工	○	○	
暗渠排水	○	○	

8. 資材価格について

本工事で用いる資材等のうち、東北農政局ホームページで公表されている資料及び定期発行物に記載されている資材以外の資材であって見積徴集した資材、随時調査した資材の価格については申請者受理通知の際に入札説明書等ダウンロードシステムで配布することとしている。

9. 特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等

- (1) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等の実施が義務づけられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法第 12 条に基づく説明書（農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。） 工事関係書類様式（様式 12-1 及び様式 12-2①～③のうち該当様式））を落札決定後直ちに発注者に提出し、その内容の説明を行わなければならない。
- (2) また、建設リサイクル法第 12 条に基づき、請負契約の当事者が、①分別解体等の方法、②解体に関する費用、③再資源化等をする施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用を工事請負契約書に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないため、共通仕様書工事関係書類様式（様式 13-1 及び様式 13-2①～③のうち該当様式）を前条の説明書と同時に提出し、その内容の説明を行わなければならない。
- (3) なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはしないものとする。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、発注者と協議するものとする。

10. 積算工種区分等について

本工事の予定価格積算における工種区分等については、農林水産省農村振興局制定「土地改良事業等請負工事積算基準」に基づき、次のとおりとしている。

- (1) 工種区分：管水路工事
- (2) 施工地域区分：補正なし
- (3) 契約保証費：計上する
- (4) 冬期補正（歩掛）：なし
- (5) 冬期補正：（現場管理費）：0.59%
- (6) 豪雪補正：10%
- (7) 週休2日補正：4週8休以上（月単位）
- (8) 現場環境改善費の計上：計上あり
- (9) 単価期：令和7年9月期単価

11. 施工

- (1) 産業廃棄物処理場までの運搬距離

産業廃棄物処理場までの運搬距離は以下のとおり考えている。

名 称	運 搬 距 離
廃プラスチック（塩ビ管）	L=49.5km 以下
有筋コンクリート殻	L=34.3km 以下

- (2) 仮設工

- 1) 水替工

排水ポンプの運転日数は次表のとおり考えている。

工 種	排水区分	運転日数／台	数 量
地盤改良工・管水路工 （横断工区・下流工区上流側） （NO.75+2.00～NO.87+33.15）	作業時	16 日	13 箇所
横断工施工区間 （NO.75+2.00～NO.75+18.30）	常時	4 日	3 箇所
地盤改良工・管水路工 （上流工区・下流工区下流側） （NO.69+2.30～NO.75+2.00） （NO.87+33.15～NO.94+0.00）	作業時	17 日	13 箇所

- 2) 仮設材の供用日数

仮設材の供用日数及び使用回数は、以下のとおり考えている。

名 称	供用日数	使用回数	施工場所	備 考
敷鉄板 (下流工区上流側) (NO. 75+14. 87～NO. 87+33. 15)	412 日	1 回	工事用道路 工事用進入路	
敷鉄板 (下流工区下流側) (NO. 87+33. 15～NO. 94+22. 37)	263 日	1 回	工事用道路	
敷鉄板 (下流工区上流側・上流工区) (NO. 75+14. 87～NO. 87+33. 15) (NO. 69+2. 30～NO. 74+54. 87)	783 日	2 回	工事用道路 転回部 農道接続部	
敷鉄板 (クレーン足場) (NO. 75+21. 80～NO. 94) (NO. 69+2. 30～NO. 74+48. 60)	565 日	43 回	工事用道路	

(3) 地盤改良工の材料ロスについて

地盤改良工の材料ロス量は次のとおり考えている。

施工場所	改良深	想定添加量	材料ロス込数量
管体工上流工区	1. 6m	160kg/m3	25. 60ton/100m2
横断工区	4. 7m	185kg/m3	19. 61ton/100m3
管体工下流工区	1. 0m	160kg/m3	16. 00ton/100m2

12. 施工歩掛について

令和7年度土地改良工事積算基準（農林水産省農村振興局制定）に記載のない歩掛については、以下のとおり考えている。

(1) 硬質塩化ビニル管切断（φ65～200）

1口当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0. 005	人	
普通作業員		0. 005	人	
諸雑費		5. 000	%	上記労務費の合計に対する割合

(2) 硬質塩化ビニル管撤去 (φ65、φ75)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.060	人	
普通作業員		0.108	人	

(3) 硬質塩化ビニル管撤去 (φ100、φ125)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.072	人	
普通作業員		0.120	人	

(4) 硬質塩化ビニル管撤去 (φ150)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.108	人	
普通作業員		0.156	人	

(5) 硬質塩化ビニル管撤去 (φ200)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.150	人	
普通作業員		0.294	人	

(6) 硬質塩化ビニル管据付工 (φ65、φ75)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.100	人	
普通作業員		0.180	人	

(7) 硬質塩化ビニル管据付工 (φ100、φ125)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.120	人	
普通作業員		0.200	人	

(8) 硬質塩化ビニル管据付工 (φ150)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.180	人	
普通作業員		0.260	人	

(9) 硬質塩化ビニル管据付工 (φ200)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.250	人	
普通作業員		0.490	人	

(10) 硬質塩化ビニル管T S継手工 (φ65、φ75)

2口当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配管工		0.040	人	
普通作業員		0.040	人	
諸雑費		1.000	%	上記労務費の合計に対する割合

(11) ボックスカルバート据付工 (B3000×H2000)

10m当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
土木一般世話役		4.6	人	
特殊作業員		3.0	人	
普通作業員		10.0	人	
ラフテレーンクレーン (油圧ジブ型・低騒音・排対型)	50t 吊	1.7	日	賃料
諸雑費		54.0	%	上記労務費及び 機械経費の合計 に対する割合
ボックスカルバート	B3000×H2000×L1000	10.0	個	

(12) パイプライン基礎 (振動コンパクタ)

10m3 当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
特殊作業員		0.20	人	
諸雑費		12.00	%	上記労務費に対 する割合
山砂	SF 相当	13.20	m3	
土木一般世話役		0.25	人	
普通作業員		0.92	人	
機械土工 (超ロングア ームバックホウ掘削)	山積 0.4m3 (平積 0.3m3)、最大作業 半径 15-19m	11.10	m3	機- 1

(機－１)

116m3 当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
バックホウ（超ロングアーム）排対型（２次）	山積 0.4m3（平積 0.3m3）、最大作業半径 15-19m	1.48	供用日	
軽油	ハ°トル給油	85.00	L	
特殊運転手		1.00	人	

13. 仮設材輸送について

現地から仮設材置場までの運搬距離及び輸送量は次表のとおり考えている。

資材名	基地	運搬距離	仮設材輸送量	備考
敷鉄板	秋田市	L=40km まで	548.75ton	往復

14. 重建設機械分解・組立・輸送

(１) 重建設機械分解・組立・輸送については下表のとおり計上している。

名 称	規 格	台 数	工 種	備 考
中層混合処理機（トレンチャ式）	機械質量 20t 以上 60t 以下	1 台	地盤改良工 (中層混合処理工)	

(２) 重建設機械輸送については下表のとおり計上している。

名 称	規 格	台 数	工 種	備 考
バックホウ（超ロングアーム型）	機械質量 20t 以上 30t まで	2 台	土工、管体基礎工	

15. 管割図について

参考として別紙－４「管割図」を添付する。

16. 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について

(１) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、地震又は台風等被災地域における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮すること。

(2) 被災地域における被災農林漁家等の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行うので、受注者は協力すること。

- ① 工事着手時点における雇用見込人数
- ② 月毎の雇用実績人数

17. 「工事書類の簡素化」について

農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、工事書類の簡素化を図るため、土木工事共通仕様書などの基準等が平成 26 年 3 月 28 日に改正された。

これに合わせ、平成 26 年 4 月より農林水産省ウェブサイトにて提出書類様式を編集可能な形式（Word、Excel）で掲載、ダウンロードを可能とすることで、受注者の利便性の向上を図っている。

なお、上記の土木工事共通仕様書などの改正内容、提出書類書式及び「工事書類の簡素化」についての概要は、農林水産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/ に掲載されているので確認されたい。

18. 本工事の積算上の工期は、令和 7 年 11 月 21 日～令和 10 年 3 月 3 日（834 日間）としている。

19. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 20 条の 2 第 2 項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別添様式により通知するものとする。

別紙－ 1

一般事項

1 労働災害の防止について

既に、労働省労働基準局長より「建設業における労働災害防止対策の徹底について」（昭和 53 年 12 月 15 日付基発第 687 号）で、建設業関係団体に通知されているところであるが一層徹底するよう努めること。

- (1) 工事の計画段階における安全性の検討
- (2) 技術管理の徹底
- (3) 安全衛生に関する責任体制の確立
- (4) 工程の適正化

2 元請、下請関係の合理化について

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化（請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 60 日以内でできる限り短い期間とすること等）、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

3 適正な工事施工の確保について

- (1) 受注者は、工事請負契約書第 6 条（一括委任又は一括下請負の禁止）及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 12 条（一括下請負の禁止）の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。
- (2) 受注者は、工事現場に設置が義務づけられている専任、主任技術者等については、適切な資格、技術力等を有する者を配置すること。
- (3) 発注者は、農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第 1 編第 1 章第 1 節総則 1－1－15 及び「施設機械工事等共通仕様書」第 1 編第 1 章第 1 節総則 1－1－16 に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。

4 労働福祉の改善等について

建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

5 建設業退職金共済制度について

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という）に加入するとともに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙（以下「証紙」という）を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。
- (2) 受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という）を工事契約締結後 1 ヶ月以内に発注者に提出すること。

ただし、この期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。

- (3) 受注者は、(2)の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに出すこと。

なお、(2)の申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。

- (4) 発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。
- (5) 受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。
- (6) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
- (7) 受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。
- (8) 建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。

6 ダンプ・トラック等による過積載等の防止について

- (1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
- (2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
- (3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
- (4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
- (5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ同団体等への加入者の使用を促進すること。
- (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプ・トラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
- (7) 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

7 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について

建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セー

フティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。

8 不法無線局について

不法無線局（電波法に基づく免許を受けずに開設した無線局）を設置した車両は工事現場周辺他で電波障害等を引き起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。

なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。

9 違約金

本契約に関し、受注者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第 48 条の 2 第 1 項又は第 54 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 受注者の刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 3 又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。

また、受注者が上記の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

10 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額

予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査（以下「低入札価格調査」という。）を受けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の 3 以上とすること。

11 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額

低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の 10 分の 2 以内とすること。

12 間伐材等木材の利用促進について

農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。

ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。

13 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

(1) 暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1) により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

- (3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

14 一次下請業者への支払について

一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は 60 日以内の手形で行うものとする。

15 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について

- (1) 開札の結果、予決令第 86 に規定する調査（以下、「低入札価格調査」という。）の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」（平成 18 年 4 月 25 日付け 18 農振第 177 号農村振興局整備部長名）に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。

①監督体制の強化等

ア 施工体制の点検

施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請する場合がある。

さらに、「施工段階における確認マニュアル（一部改正）」（平成 18 年 3 月 31 日付け事務連絡農村振興局設計課施工企画調整室長名）等に基づき、重点的な工事監督を実施する。

なお、事前通告をしないで点検することがある。

イ 下請け契約状況の調査

低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。

なお、事前通告をしないで点検することがある。

ウ 受注者側技術者の増員について

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は東北農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去 2 年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、主任（監理）技術者と同等の要件を満たす別の技術者 1 名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。

なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。

(7) 工事成績 70 点未満の評定を通知された者。

- (イ) 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。

- (ウ) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者。

- (エ) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

②発注方式

「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事の場合で、当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定がある場合で、低入札価格調査対象工事となった場合は、当初工事の契約時において

合意した単価等を後工事の積算で使用するものとする。

(2) 全ての低入札価格調査の対象工事（以下「対象工事」という。）を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。

① 対象工事について、(1)に示す次のア～ウの段階において、監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ②及び③に示す対策を講ずる。

ア 施工確認段階

イ 施工体制点検段階

ウ 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階

② ①に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。

（総合評価落札方式の場合）

1年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を50%減ずる。

③ ①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事（「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）において、次の入札参加制限を講ずる。

- ・対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工事に係る入札参加を制限する。

- ・対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。

④ 当該対象工事の工事成績が65点未満の場合、評定通知日から1年間、②と同様の措置を講ずる。

別紙－２

入札の保証について

入札参加者は、以下の①から⑤までのいずれかの書類を提出しなければならない。

① 入札保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書

- イ 保管金領収証書は、「日本銀行仙台支店」に見積金額の 100 分の 5 の金額以上に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
- ロ 保管金領収証書の宛名の欄には、「東北農政局歳入歳出外現金出納官吏 総務部会計課課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。
- ハ 落札者が契約を結ばないときは、保管金は、会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の 7 の規定により国庫に帰属する。
- ニ 入札参加者は、入札執行後、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出とともに提出すること。
- ホ 見積金額の増額により入札保証金の金額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

② 入札保証金に代わる担保としての国債に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書

- イ 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に見積金額の 100 分の 5 の金額以上に相当する金額の国債を払い込んで、交付を受けること。
- ロ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 東北農政局総務部会計課課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。
- ハ 落札者が契約を結ばないときは、保管有価証券は、会計法第 29 条の 7 の規定により国庫に帰属する。
- ニ 入札参加者は、入札執行後、政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案とともに提出すること。
- ホ 見積金額の増額により国債の総額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

③ 落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保証書

- イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、銀行等とする。
- ロ 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人」と記載されるように申し込むこと。
- ハ 保証債務の内容は、落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いとすること。
- ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- ホ 保証金額は、見積金額の 100 分の 5 の金額以上とすること。
- ヘ 保証期間は、書類の提出日から入札執行の日から 7 日を経過した日以降の日であって、契約担当官等が指定する日までを含むものとする。
- ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後 6 カ月間以上確保されるものとする。

チ 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 7 の規定により国庫に帰属する。

リ 入札参加者は、落札者決定後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ただし、落札者については、工事請負契約書案提出後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

ヌ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

ル 見積金額の増額により保証金額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する保険会社との入札保証保険契約に係る証券

イ 入札保証保険とは、落札者が契約を結ばない場合に、保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。

ロ 入札保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

ハ 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人」と記載されるように申し込むこと。

ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

ホ 保険金額は、見積金額の 100 分の 5 の金額以上とすること。

ヘ 保険期間は、書類の提出日から入札執行の日から 7 日を経過した日以降の日であって、契約担当官等が指定する日までを含むものとする。

ト 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 7 の規定により国庫に帰属する。

チ 見積金額の増額により保険金額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書

イ 銀行等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）（以下「金融機関等」という。）による契約保証の予約を受け、契約保証予約証書を提出した場合は、予算決算及び会計令第 77 条第 2 号に規定する場合に該当するものとして、入札保証金の全部を納めさせないこととする。

ロ 契約保証予約証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人」と記載されるように申し込むこと。

ハ 契約保証の予約の内容は、金融機関等と入札参加者である予約契約者との間で、予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。

ニ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

ホ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。

ヘ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たって、いかなる留保も付されていないこと。

別紙－３

契約の保証について

- (１) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書

- (ア) 保管金領収証書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
- (イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「東北農政局歳入歳出外現金出納官吏 総務部会計課 課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。
- (ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
- (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- (オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券（利付国債に限る。）に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書

- (ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
- (イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 東北農政局総務部会計課課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。
- (ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
- (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- (オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書

- (ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は、公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。

- (イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人」と記載するように申し込むこと。
- (ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
- (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に、記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- (オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
- (カ) 保証期間は、工期を含むものとする。
- (キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ヶ月以上確保されるものとする。
- (ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱については契約担当官等の指示に従うこと。
- (ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成后、契約担当官等から保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

- (ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
- (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人」と記載するように申し込むこと。
- (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- (エ) 保証金額は、請負代金額の１０分の３の金額以上とする。
- (オ) 保証期間は、工期を含むものとする。
- (カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
- (キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券

- (ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
- (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
- (ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人」と記載

するように申し込むこと。

(エ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の3の金額以上とする。

(カ) 保険期間は、工期を含むものとする。

(キ) 請負代金額を変更する取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(2) (1) の規定にかかわらず、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

(3) その他


保険証券等の電磁的方法による提出

保証証書等（契約の保証に係る保証書若しくは証券又は前払金保証に係る保証証書をいう。以下同じ。）の提出又は寄託に代えて電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって、金融機関等が定め、契約担当官等の認める措置（以下「電磁的方法による提出」という。）を行う場合は、受注者は、保証証書等の提出又は寄託に代えて、電子証書等閲覧サービス（電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。）上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報（電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。）及び認証情報（電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。）を契約担当官等に提供し、契約担当官等が、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧することをもって代えることができる。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供すること。

なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。

管割図(1/5)

S=1:100

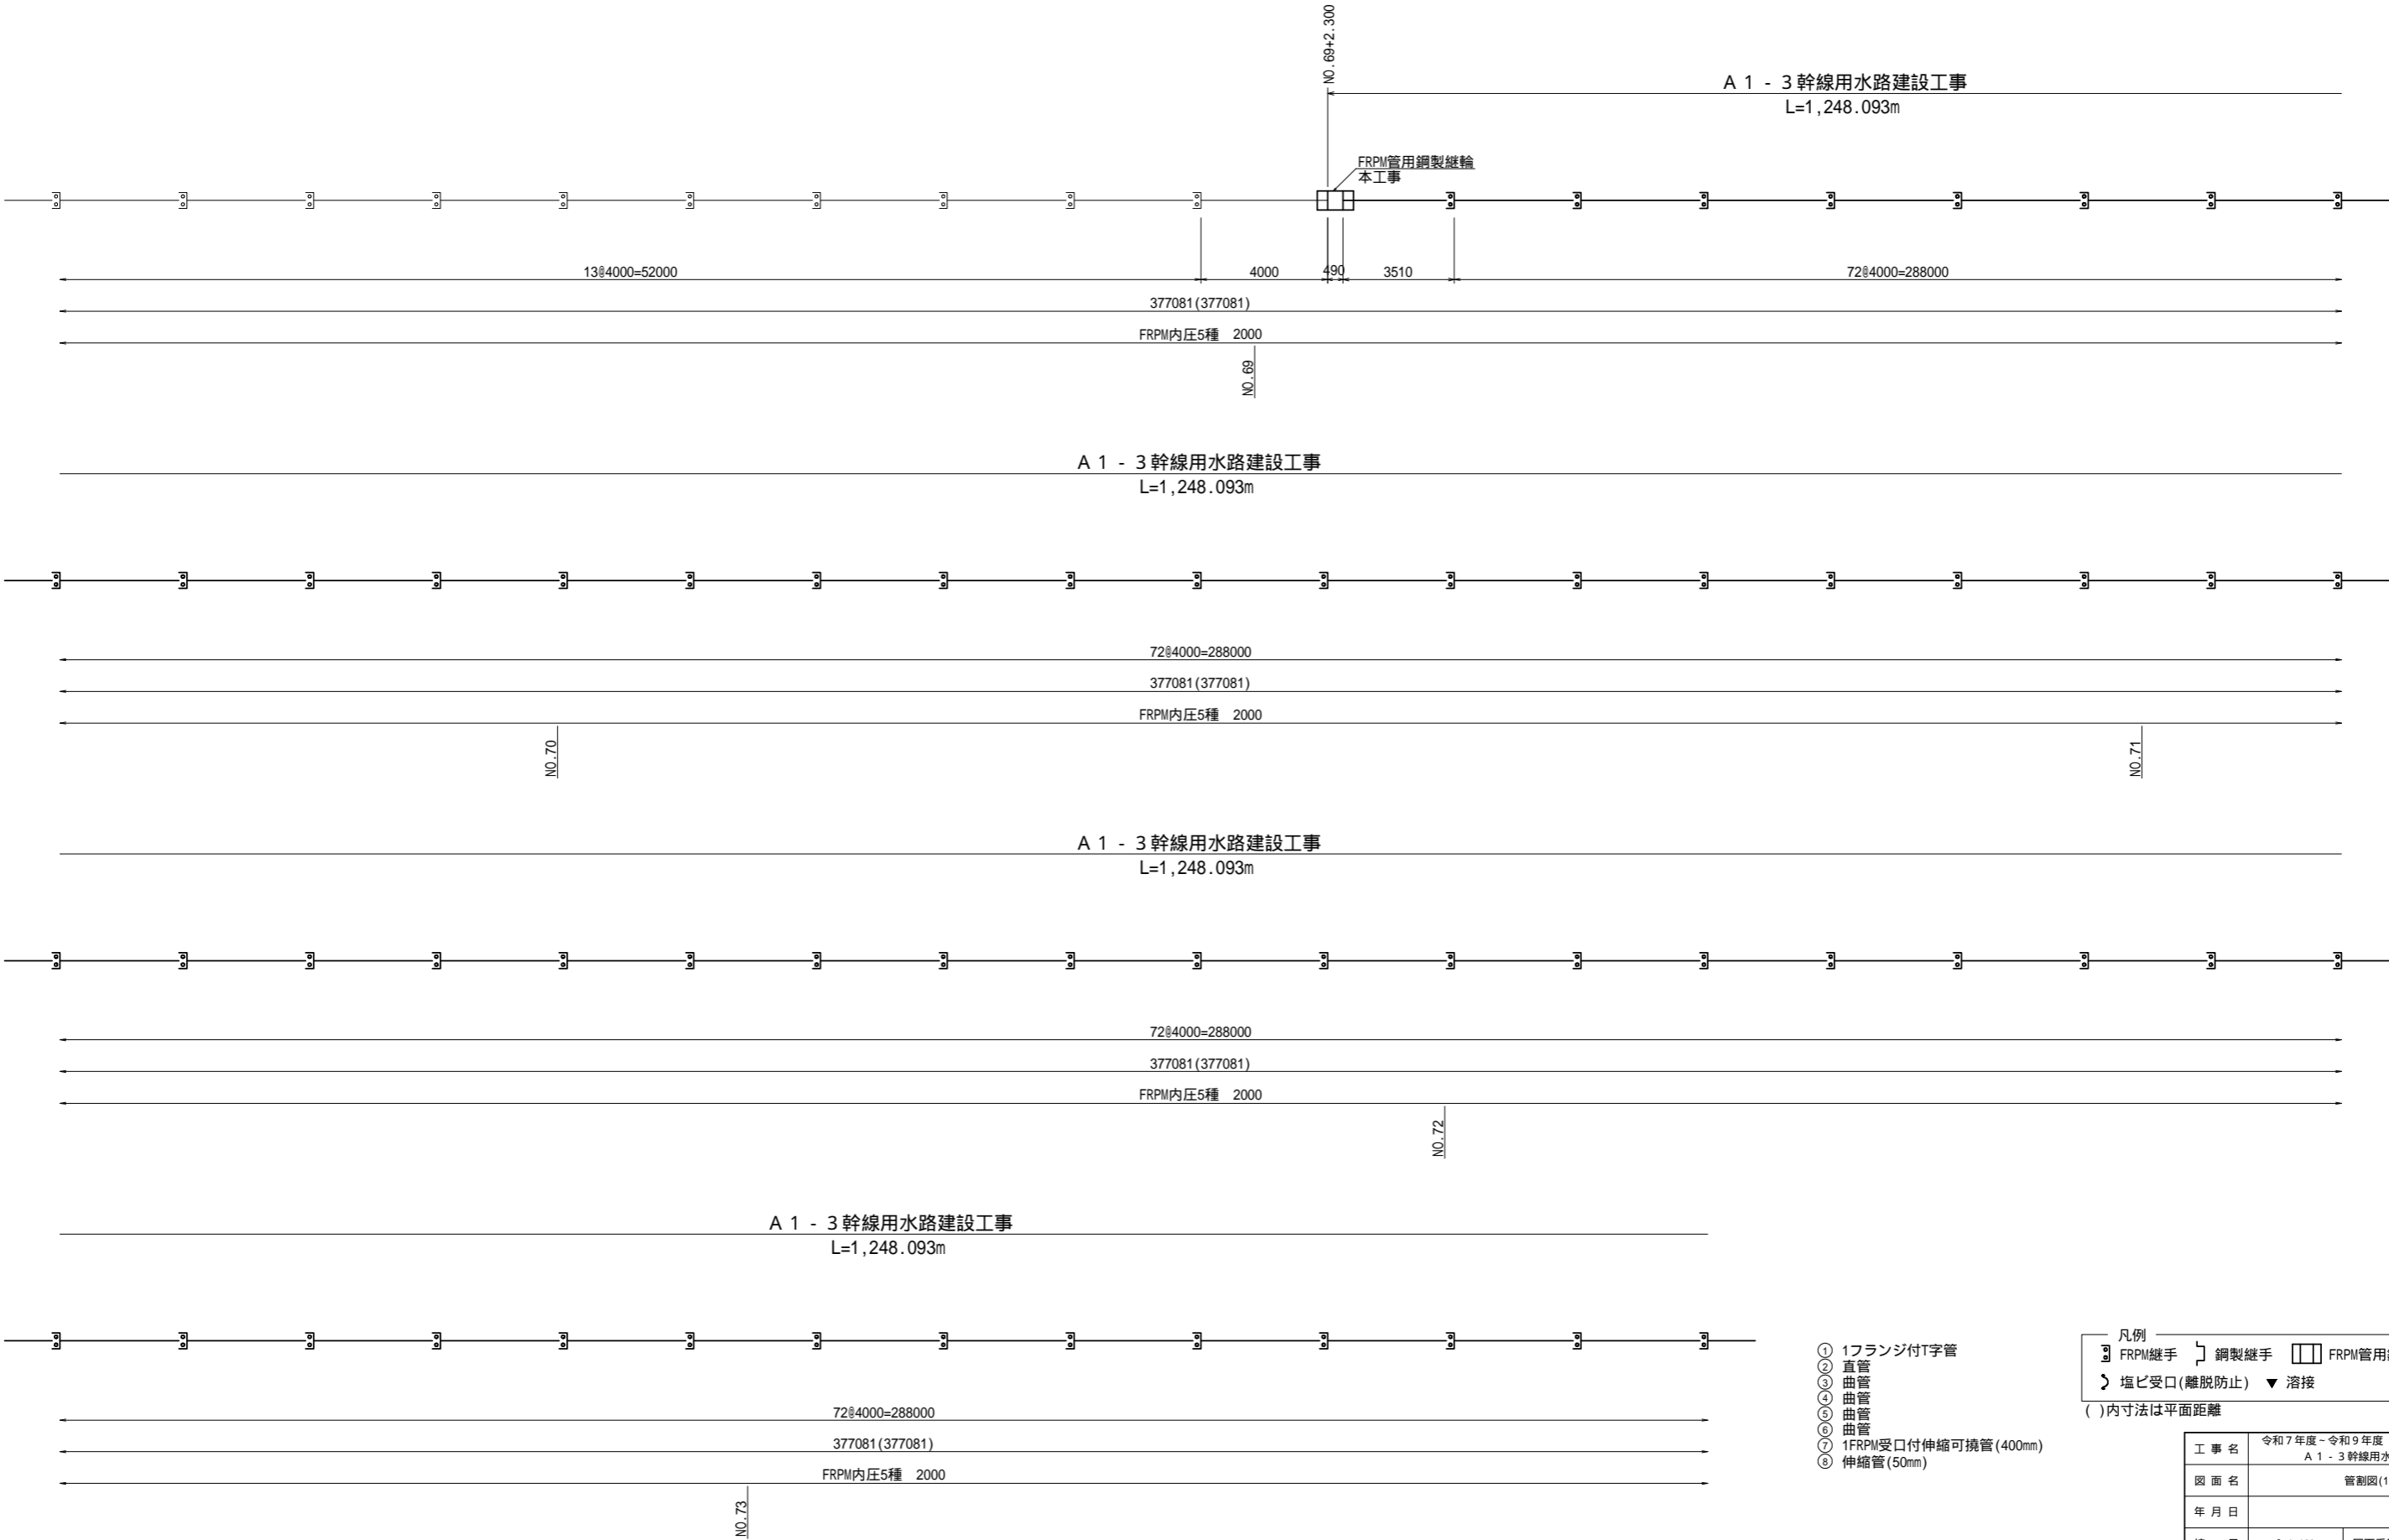

- ① 1フランジ付T字管
- ② 直管
- ③ 曲管
- ④ 曲管
- ⑤ 曲管
- ⑥ 曲管
- ⑦ 1FRPM受口付伸縮可撓管(400mm)
- ⑧ 伸縮管(50mm)

凡例

FRPM継手

鋼製継手

FRPM管用鋼製継輪

塩ビ受口(離脱防止)



溶接

() 内寸法は平面距離

工 事 名	令和7年度～令和9年度 八郎潟農業水利事業 A 1 - 3 幹線用水路建設工事		
図 面 名	管割図(1/5)		
年 月 日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1-1/5
会 社 名			
事務所名	東北農政局 八郎潟農業水利事業所		






S=1 : 100

第3号排泥施設
排水



第4号排泥施設

NO. 77

- 凡例
- | | | | | | |
|---|------------|---|------|---|------------|
|  | FRPM継手 |  | 鋼製継手 |  | FRPM管用鋼製継輪 |
|  | 塩ビ受口(離脱防止) |  | 溶接 | | |


()内寸法は平面距離

工 事 名	令和7年度～令和9年度 八郎潟農業水利事業 A1-3 幹線用水路建設工事		
図 面 名	管割図(2/5)		
年 月 日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1-2/5
会 社 名			
事務所名	東北農政局 八郎潟農業水利事業所		


管割図(3/5)

S=1:100


A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m




A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m



A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m



A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m



- ① 1フランジ付T字管
- ② 直管
- ③ 曲管
- ④ 曲管
- ⑤ 曲管
- ⑥ 曲管
- ⑦ 1FRPM受口付伸縮可撓管(400mm)
- ⑧ 伸縮管(50mm)

凡例

FRPM継手

鋼製継手

FRPM管用鋼製継輪

塩ビ受口(離脱防止)

溶接

()内寸法は平面距離

工 事 名	令和7年度～令和9年度 八郎潟農業水利事業 A 1 - 3 幹線用水路建設工事		
図 面 名	管割図(3/5)		
年 月 日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1-3/5
会 社 名			
事務所名	東北農政局 八郎潟農業水利事業所		

管割図(4/5)

S=1:100

A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

第16号通気施設

(A)

117@4000=468000

2750

2000

2300

36@4000=144000

632800(632800)

FRPM内圧5種 2000

NO.85

A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

36@4000=144000

632800(632800)

FRPM内圧5種 2000

NO.86

NO.87

A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

VIP.12

HB= 0-00-00
VB= 0-00-20
CB= 0-00-20

36@4000=144000

2850

2000

74@4000=296000

632800(632800)

FRPM内圧5種 2000

330204(330204)

NO.88

VIP.12

A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

74@4000=296000

330204(330204)

FRPM内圧5種 2000

NO.89

- ① 1フランジ付T字管
② 直管
③ 曲管
④ 曲管
⑤ 曲管
⑥ 曲管
⑦ 1FRPM受口付伸縮可撓管(400mm)
⑧ 伸縮管(50mm)

凡例

FRPM継手

鋼製継手

FRPM管用鋼製継輪

塩ビ受口(離脱防止)


溶接

()内寸法は平面距離


工 事 名	令和7年度～令和9年度 八郎潟農業水利事業 A 1 - 3 幹線用水路建設工事		
図 面 名	管割図(4/5)		
年 月 日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1-4/5
会 社 名			
事務所名	東北農政局 八郎潟農業水利事業所		

S=1 : 100


A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

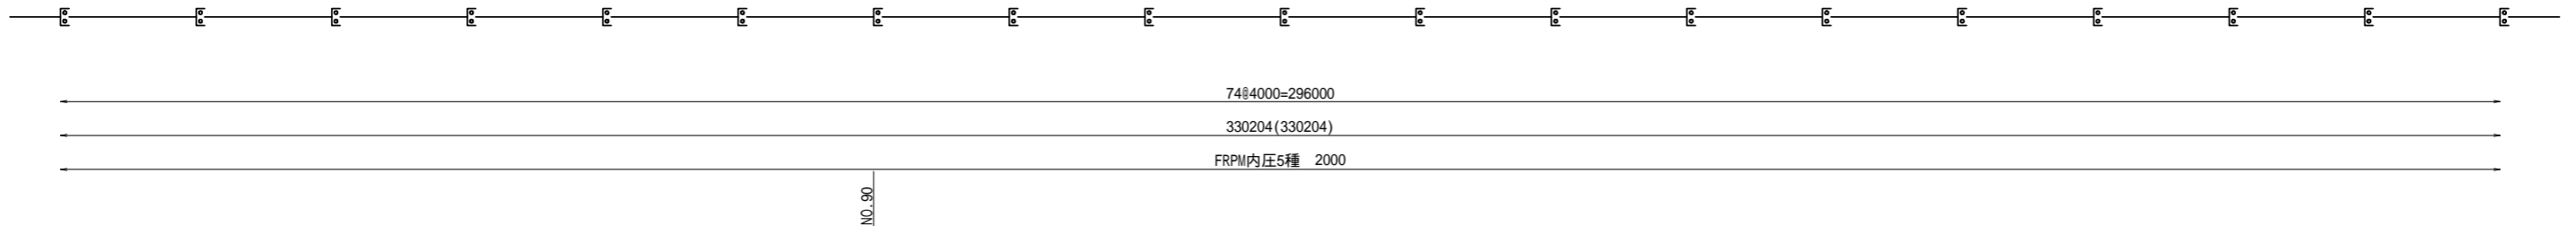


A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

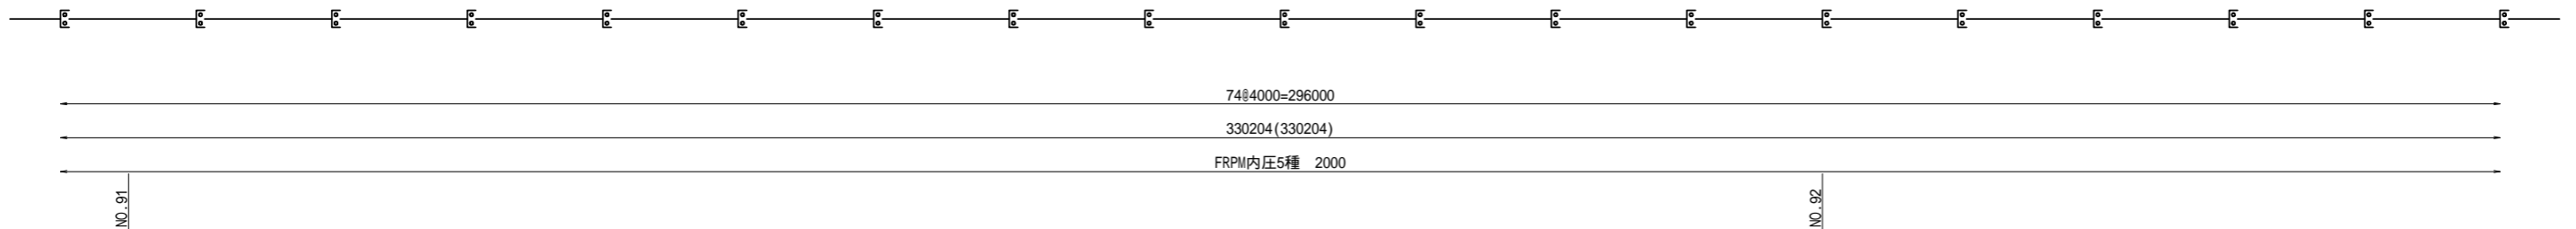

A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m

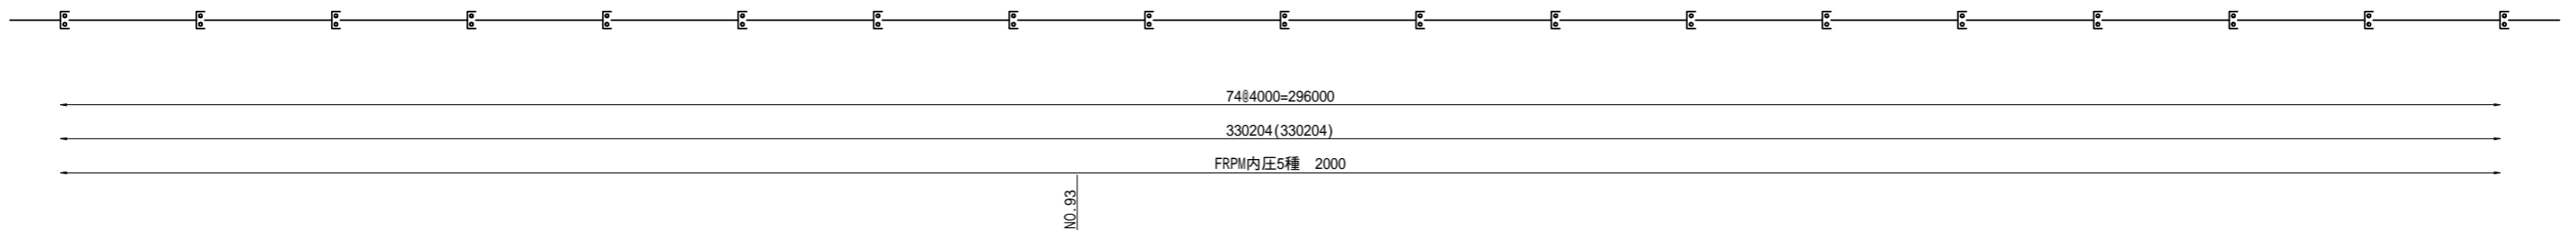



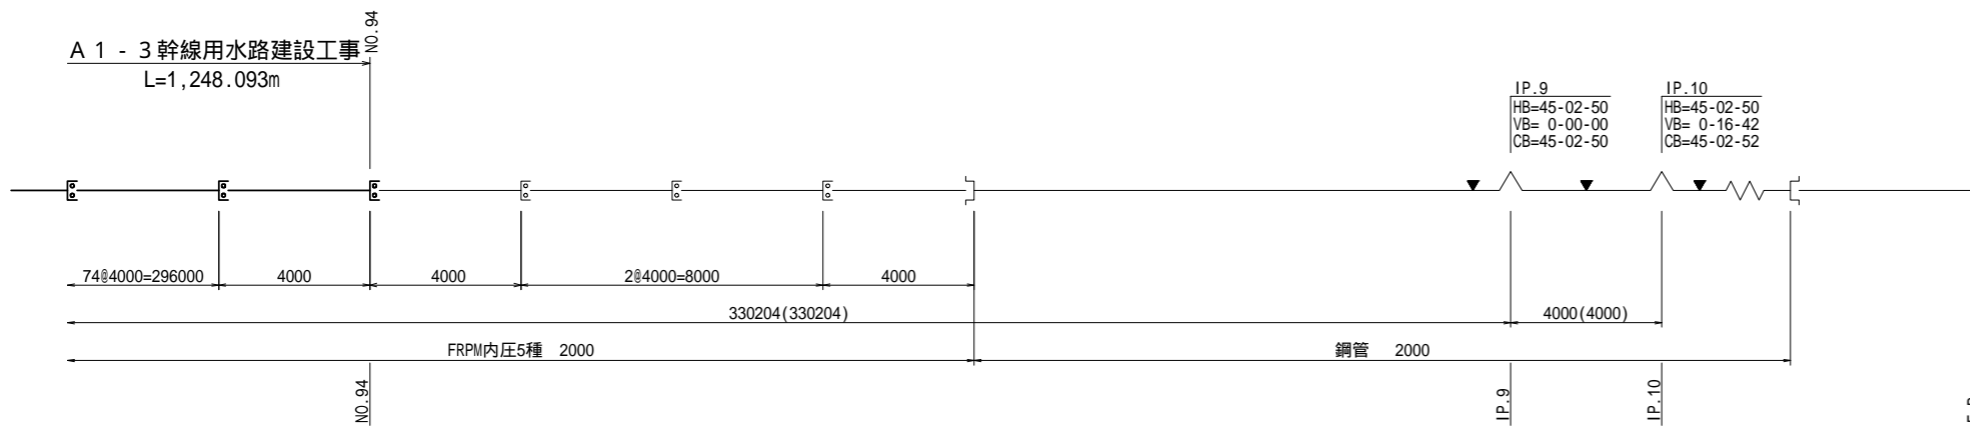


A 1 - 3 幹線用水路建設工事
L=1,248.093m



- ① 1フランジ付T字管
- ② 直管
- ③ 曲管
- ④ 曲管
- ⑤ 曲管
- ⑥ 曲管
- ⑦ 1FRPM受口付伸縮可撓管(400mm)
- ⑧ 伸縮管(50mm)

凡例

	FRPM継手		鋼製継手		FRPM管用鋼製継輪
	塩ビ受口(離脱防止)		溶接		

() 内寸法は平面距離

工 事 名	令和7年度～令和9年度 八郎潟農業水利事業 A1-3 幹線用水路建設工事		
図 面 名	管割図(5/5)		
年 月 日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1-5/5
会 社 名			
事務所名	東北農政局 八郎潟農業水利事業所		

令和 年 月 日

(分任) 支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 殿

所在地
名称
代表者名 (押印不要)

通 知 書

下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。

記

工事名：

- ☐ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)

発生するおそれのある事象※：(例) 国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：(例) 報道等の URL を記載又はファイルを別添

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載

- ☐ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)

発生するおそれのある事象※：(例) 〇〇地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：(例) 報道等の URL を記載又はファイルを別添

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載

以上

その他連絡事項 (空欄可) (自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)

- (注) 1. 本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。
2. 本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあつては、契約の相手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。
3. 「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。）
4. 本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものであることに留意すること。
5. 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。
